

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI  
PLANA POSLOVANJA  
ZA PERIOD  
1.1.-31.12.2017. GODINA**

Sarajevo; februar/veljača 2018.

## SADRŽAJ

	strana
<b>U V O D</b>	<b>3</b>
<b>A.I JAVNI PRIHODI</b>	<b>7</b>
<b>A.II AMORTIZACIJA</b>	<b>11</b>
<b>B.I JAVNI RASHODI</b>	<b>13</b>
1. Troškovi poslovanja	14
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	15
3. Redovno održavanje	17
4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	24
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	25
6. Troškovi konsultantskih usluga	25
7. Kamate	26
<b>B.II TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>28</b>
<b>C. INVESTICIJE</b>	<b>29</b>
1. Nabavka stalnih sredstava	30
2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“	31
3. Projekti JP Ceste F BiH	35
4. Eksproprijacija	54
5. Projekti iz Programa ut.inv.sreds.razvoja –Budžet F BiH	57
6. Donacije i sufinansiranje	57
<b>D. ODJEL JAVNIH NABAVKI</b>	<b>59</b>
<b>E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI</b>	<b>60</b>

## **U V O D**

Na osnovu Zakona o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ br. 6/02.) Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o.Sarajevo (u daljem tekstu: „JP Ceste F BiH“) prvobitno je registrovano 2002. godine, pod nazivom: „Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo“. Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH br. 12/10., 16/12 i 66/13 ) registrovana je navedena promjena kod Općinskog suda Sarajevo Rješenjem o registraciji broj: 065-0-Reg-11-000713 marta 2011. godine. Sjedište Društva je u Sarajevu, na adresi Terezije 54.

Nakon što je na prijedlog Uprave JP Ceste F BiH, koju čine:

- Ljubo Pravdić, direktor,
- Dedo Pjanić, izvršni direktor za tehničke poslove i
- Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove,

Nadzorni odbor dao saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste F BiH za 2017.godinu (u daljem tekstu: „Plan“), a Vlada F BiH u svojstvu osnivača, odobrila, Odlukom V broj 306/2017., isti je predstavljao osnovu za provođenje planiranih aktivnosti. Međutim, tokom godine došlo je do odstupanja, zbog čega se Uprava odlučila na revidiranje plana, tj. na izradu Rebalansa plana poslovanja za 2017.godinu (u daljem tekstu : „Rebalans plana 2017.“). Vlada F BiH je Odlukom V broj: 141/2018. dala saglasnost na Rebalans plana 2017., koji je kao i Plan, uraden na osnovu Zakona o cestama F BiH, Zakona o javnim preduzećima u F BiH i Statuta JP Ceste F BiH.

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste F BiH za period 01.01.- 31.12.2017.godina je sačinjen na osnovu Pravilnika o računovodstvu i Računovodstvenih politika JP Ceste F BiH usaglašenih sa važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima („MRS“), koliko je moguće, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“) i u skladu sa specifičnostima poslovanja i pravnog statusa JP Ceste F BiH.

JP Ceste F BiH u izvještajnom periodu su ostvarile prihod u iznosu od 71,35 mil.KM, što je 3% više od planiranih 69,49 mil.KM, a 1% ili 0,90 mil.KM više u odnosu na prihod prethodne godine. Prihod od naknada nafte i naftnih derivata, kao i svake godine, učestvuje najviše u strukturi prihoda, i po ovom osnovu je ostvaren u iznosu od 38,34 mil.KM. Krajem godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/2017.), na osnovu koga je putarina povećana za 0,05 KM/lit. za izgradnju i rekonstrukciju puteva. Kada su se JP Ceste F BiH kandidovale za Program „Modernizacija cesta u F BiH“, Vlada F BiH je donijela Zaključak V broj: 1382/2013. da se provedu mjere i aktivnosti koje će osigurati održivost duga JP Ceste F BiH.

Rashodi su realizovani u iznosu od 45,49 mil.KM, što je 98% od planiranih 46,25 mil.KM ili 87% od visine rashoda prethodne godine, a investicije 18,52 mil.KM, ili 62% od planiranih 29,70 mil.KM, za 49 % ili 6,05 mil.KM, su veće u odnosu na realizovane 2016. godine.

Ostvarena je slijedeća struktura ulaganja u 2017.godini:

- održavanje (redovno i zimsko)	32,66 mil.KM
- sanacija klizišta,škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza	9,42 mil.KM
- rekonstrukcija cesta, mostova i tunela	4,40 mil.KM
- troškovi poslovanja	4,88 mil.KM
- služba pomoći i informacija	4,57 mil.KM
- rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela i poboljšanje sigurnosti prometa	3,24 mil.KM

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

- nabavka stalnih sredstava	0,13 mil.KM
- rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	1,05 mil.KM
- rezervirana sredstva za sudske presude	0,94 mil.KM
- konsultantske usluge	0,21 mil.KM
- eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	1,33 mil.KM
- kamate i kursne razlike	1,18 mil.KM

Pored redovnih aktivnosti vezanih za redovno održavanje i zaštitu magistralnih cesta, u posmatranom izvještajnom periodu, vođene su aktivnosti na okončanju projekata iz prethodnog perioda, zatim na izboru konsultanata i pripremi projektne dokumentacije, reviziji projekata, provođenju postupaka za javnu nabavku radova i usluga, eksproprijaciji zemljišta i druge aktivnosti neophodne za uspješan završetak planiranih zadataka. Neophodno je istaći da se paralelno radi na aktivnostima koje su uslovi operativnosti kreditnih sredstava za implementaciju Programa „Modernizacija cesta u FBiH“.

Bosna i Hercegovina osigurala je kreditna sredstva Evropske investicijske banke (EIB), Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje Programa “Modernizacija cesta u Federaciji BiH” (Program) u ukupnom iznosu 173,00 mil.EUR, a pojedinačno po bankama EIB 50,00 mil.EUR, IBRD 58,00 mil.EUR i EBRD 65,00 mil.EUR.

Ugovor o finansiranju između BIH i EIB potpisani je u Sarajevu 26 januara, odnosno u Luksemburgu 23 februara 2016. Vlada Federacije BiH je 12 jula 2016. prihvatile zaduženje FBiH po Ugovoru o finansiranju sa EIB.

Svjetska banka- IBRD iskazala je spremnost da učestvuju u sufinansiranju dijela Programa sa EIB. Kreditni sporazum između BiH i IBRD potpisani je 9 novembra 2016. Vlada Federacije BiH je 10 novembra 2016 prihvatile zaduženje FBiH po kreditnom sporazumu sa IBRD.

Ugovor o zajmu između BIH i EBRD potpisani je 13 jula 2016. Vlada FBiH je 10 novembra 2016. prihvatile zaduženje FBiH po ugovoru o zajmu sa EBRD.

Uvjeti kredita su slijedeći:

### **EIB**

Iznos kredita: 50,00 mil.EUR-a

Krajnji datum raspoloživosti kredita: 60 mjeseci od datuma potpisivanja

Period odgode otplate (grace period): 5 godina

Dospjeće kredita: 20 godina, uključujući period odgode otplate

Kamatna stopa: promjenljiva [EURIBOR+ fiksan raspon relevantne međubankarske stope (plus ili minus) koji odredi EIB.

Zatezna kamata: 2% iznad primjenljive kamatne stope

Povlačenje kredita je moguće u 12 tranši, a minimalni iznos tranše je 3,00 mil.EUR.

### **WB- IBRD**

Iznos kredita: 58,00 mil.EUR-a

Period odgode otplate (grace period): 12 godina

Dospjeće kredita: 22 godine , uključujući period odgode otplate;

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

Kamatna stopa: promjenljiva EURIBOR + varijabilni raspon (ovisan o valuti kredita i periodu otplate),

Naknade: jednokratna provizija 0,25 % na iznos kredita koja će biti obustavljena iz kredita nakon efektivnosti kredita

Provizija: 0,25% na nepovučeni iznos kredita, obračunava se 60 dana od potpisivanja kredita, plativa nakon efektivnosti kredita

### **- EBRD**

Iznos kredita: 65,00 mil.EUR-a

Povlačenje kredita u dvije tranše: **Tranša 1** 31,85 mil.EUR i **Tranša 2** 32,50 mil.EUR

Period odgode otplate (grace period): 3 godine

Dospjeće kredita: 15 godina, uključujući period odgode otplate)

Kamatna stopa: promjenljiva (EURIBOR 6 mj+ marža 1%)

Naknade: jednokratna provizija 1% na iznos kredita, koja će biti obustavljena iz kredita

Provizija na nepovučeni iznos kredita:

**Tranša 1** 0,5% godišnje na nepovučena sredstva kredita

**Tranša 2** 120 dana grace period nakon potpisivanja sporazuma o kreditu

0,5% godišnje na nepovučena sredstva kredita

Krediti su dalje stavljeni na raspolaganje Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) na osnovu Subsidijarnih sporazuma između BiH i FBiH, i nadalje JP Cestama FBiH za implementaciju Programa, pod istim pravilima i uslovima definisanim u Ugovorima o zajmu, odnosno Ugovoru o finansiranju.

Raspoloživa kreditna sredstva biće upotrebljena za:

- radove na izgradnji, unapređenju i rehabilitaciji cesta i cestovne infrastrukture (mostovi i tuneli) i poboljšanju uvjeta sigurnosti prometa kroz eliminaciju „crnih tačaka“ i opasnih mesta na magistralnim cestama;
- konsultantske usluge za poboljšanje upravljanja mrežom magistralnih cesta i za upravljanje i implementaciju Programom;
- nabavku roba.

U skladu sa kreditnim sporazumima/sporazumima sa međunarodnim bankama JP Ceste FBiH preuzeo je obavezu da održava Tim za implementaciju i upravljanje programom (eng. PIMT) tokom cijelog perioda realizacije Programa. Tim za implementaciju i upravljanje programom je uspostavljen unutar JP Ceste FBiH odlukom br. 01-3819/17 od 26.04.2017. godine i zadužen je za koordinaciju, planiranje, praćenje i ocjenu svih aspekata realizacije Programa u skladu sa kriterijima korisnika (BiH), Vlade FBiH i međunarodnih banaka. Tim je sačinjen od multidisciplinarnog osoblja, a kapaciteti Tima pojačani su i konsultantom za tehničku pomoć pri implementaciji Programa.

Kredit EBRD nije još efektivan, jer nije ispunjen uvjet koji prethodi efektivnosti da je u Federaciji BiH usvojena legislativa koja osigurava da godišnje alokacije sredstava od naknada za naftu i naftne deriveate za JP Ceste FBiH nisu manje od alokacija utvrđenih Zakonom o cestama FBiH od 15.03.2010.

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

---

Iako je okončan 2013. godine Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“, u izvještajnom periodu, za isti, je pristiglo dio obaveza. Program je finansiran iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija, na osnovu Ugovora o zajmu broj: 37543 između Bosne i Hercegovine i EBRD i Sporazumom o podršci zajmu između BiH i EBRD, zaključenih 17.07.2007. godine na 45 mil.€, sa periodom otplate od 12 godina, uključujući tri godine period odgode. Takoder, Ugovorom o zajmu broj: 23924 između BiH i EIB-a definisan je period otplate transi kredita. U izvještajnom periodu, za otplatu navedenih kredita, JP Ceste F BiH su izdvojile iz finansijskog rezultata 14,78 mil.KM, od planiranih 14,80 mil.KM. Razlika javnih prihoda i javnih rashoda JP Ceste F BiH predstavlja finansijski rezultat, koji je neoporeziv. U izvještajnom periodu finansijski rezultat iznosi 25,86 mil.KM. Iskazani finansijski rezultat ne može biti predmet ponovne raspodjele na dividendu ili povećanje kapitala. Finansijski rezultat se raspoređuje na obaveze prema planiranoj namjeni. Ovako stvorene obaveze predstavljaju izvor sredstava koji će se utrošiti isključivo za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta.

Na osnovu Odluke Vlade F BiH broj:233/05, JP Ceste F BiH su bile angažovane na izvođenju radova LOT - 2C Brijesće - Ulica Safeta Zajke projekta Sarajevska obilaznica, koji je okončan 2.11.2017. te je predmetna dionica puštena u promet. Inače, projekt se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH, vodi vanbilansno.

Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj:1043/17. Od 20.07.2017. o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade F BiH Budžeta F BiH za 2017.godinu, potpisani je Ugovor o prijenosu sredstava kapitalnog transfera broj:01-03.1-10717/17. 01.12.2017. između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Ceste F BiH u iznosu od 0,70 mil.KM, u svrhu eksproprijacije na projektu Neum-Stolac. U toku je realizacija odobrenih sredstava.


U nastavku su prikazani javni prihodi, rashodi, investicije u KM i ostale aktivnosti koje su JP Ceste F BiH provodile tokom izvještajnog perioda.

## A.I. JAVNI PRIHODI

Red. br.	O P I S	Šifra naknade	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Index 6/5	Index 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Naknade</b>		<b>69.438.266</b>	<b>67.700.000</b>	<b>69.109.343</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
	1.1 Nafte i naftnih derivata	717131	40.549.559	37.000.000	38.340.151	104	95
	1.2 Registracije - putarine - fizička lica	722532	15.399.120	16.100.000	16.187.427	101	105
	1.3 Registracije - putarine - pravna lica	722531	7.089.478	7.500.000	7.570.807	101	107
	1.4 "Pomoć informacija na cestama"	722535	4.759.366	5.000.000	4.903.555	98	103
	1.5 Korištenja cestovnog zemljišta	722538	1.266.510	1.500.000	1.499.709	100	118
	1.6 Vanrednih prevoza	722536 722534	265.517	400.000	381.459	95	144
	1.7 Prekomjerne upotrebe cesta (vage)	722537	108.716	200.000	226.235	113	208
<b>2.</b>	<b>Druga sredstva osigurana po posebnim propisima</b>		<b>515.313</b>	<b>590.000</b>	<b>506.800</b>	<b>86</b>	<b>98</b>
	2.1 Reklamni panoi	722539	336.469	400.000	343.801	86	102
	2.2 Kamata	722565	66.906	70.000	49.502	71	74
	2.3 Saglasnosti	722565	107.260	120.000	112.697	94	105
	2.4 Raspisani tenderi	722565	4.678	-	800		17
<b>3.</b>	<b>Naknadno utvrđeni prihodi</b>		<b>501.748</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.731.442</b>	<b>144</b>	<b>345</b>
	<b>U K U P N O</b>		<b>70.455.327</b>	<b>69.490.000</b>	<b>71.347.585</b>	<b>103</b>	<b>101</b>


Rebalansom planirani prihod od 69,49 mil.KM realizovan je u iznosu od 71,35 mil.KM, što je više za 1,86 mil.KM ili 3 %. Prihod od naknade nafte i naftnih derivata je realizovan u odnosu na planirani iznos za 1,34 mil.KM ili 4% više od planirane veličine, a manje za 2,21 mil.KM ili 5%, u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od putarina fizička i pravna lica i naknada službe Pomoć informacije na cestama, korištenje cestovnog zemljišta kao i ostali prihodi ostvareni su na približno planiranom nivou.

Naknadno utvrđen prihod realizovan je u iznosu od 1,73 mil.KM, gdje najveću stavku čini obračun pozitivnih kursnih razlika SDR-ova u iznosu od 1,41 mil.KM, na kredit Svjetske banke za Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“.

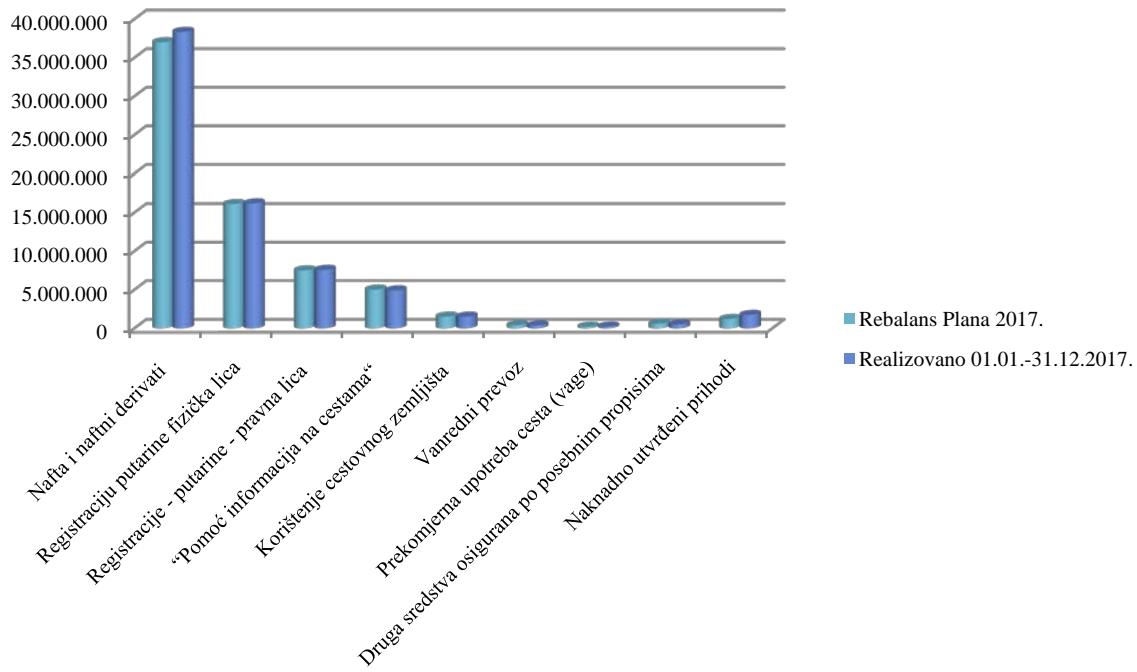


Na grafikonu je prikazana visina planiranih prihoda Rebalansom plana i ostvarenih u 2017 godini.

### 1. Naknade - učešće u strukturi javnih prihoda **96,86 %**

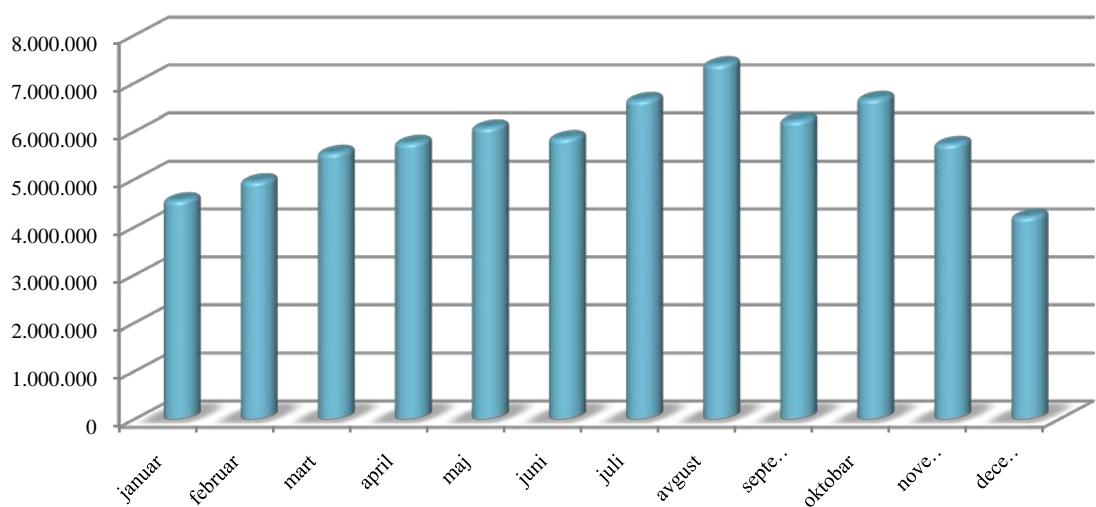


Grafički prikaz visine ostvarenih prihoda po mjesecima

**1.1. od nafte i naftnih derivata** – Na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14 i 60/14) putarina kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne derive u iznosu od 0,15 KM/litri za puteve, na Jedinstven račun Uprave za indirektno oporezivanje. Pravilnikom o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve F BiH pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu sredstava predviđenih, od čega na osnovu Zakona o cestama u F BiH JP Ceste F BiH pripada 40%. Na osnovu Projekcije prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa korisnicima u Federaciji BiH za 2017. godinu, prihod iz naknade od nafte i naftnih derivata je planiran u iznosu od 37,00 mil.KM, a ostvaren sa 38,34 mil.KM, što je 4% više u odnosu na planirana sredstva.

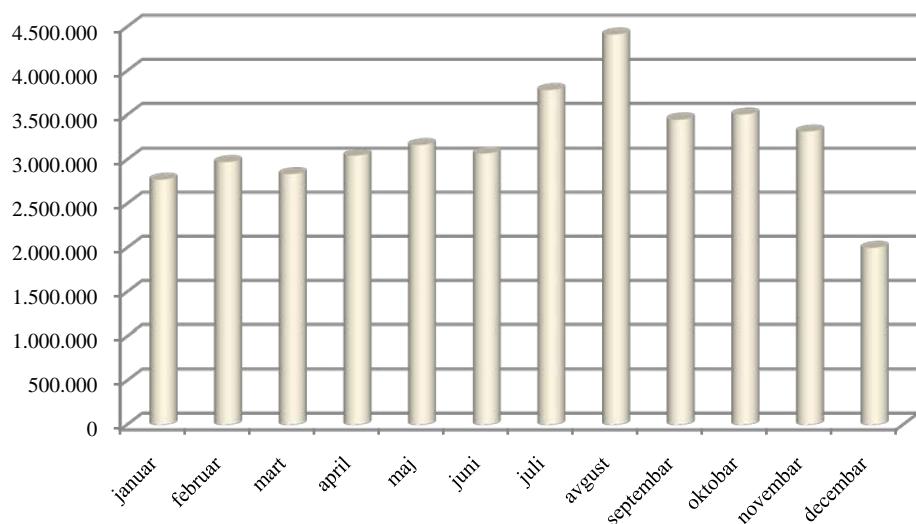

Grafički prikaz ostvarenih prihoda po osnovu naknada iz nafte i naftnih derivata po mjesecima

**1.2. i 1.3 putarine za fizička i pravna lica** – Vlada F BiH je usvojila „Uredbu o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015 od 19.02.2015, kojom je regulisana ova naknada. Prihod od putarine fizičkih lica je ostvaren u iznosu od 16,19 mil.KM, dok je putarina od pravnih lica realizovana sa 7,57 mil.KM, što je 1% više kod svake putarine u odnosu na planirane veličine. Obje su planirane u ukupnom iznosu od 23,60 mil.KM, a realizovane sa 23,76 mil.KM. Dio putarine, koji pripada po Zakonu o cestama F BiH, se uplaćuje direktno na depozitne račune JP Ceste F BiH.

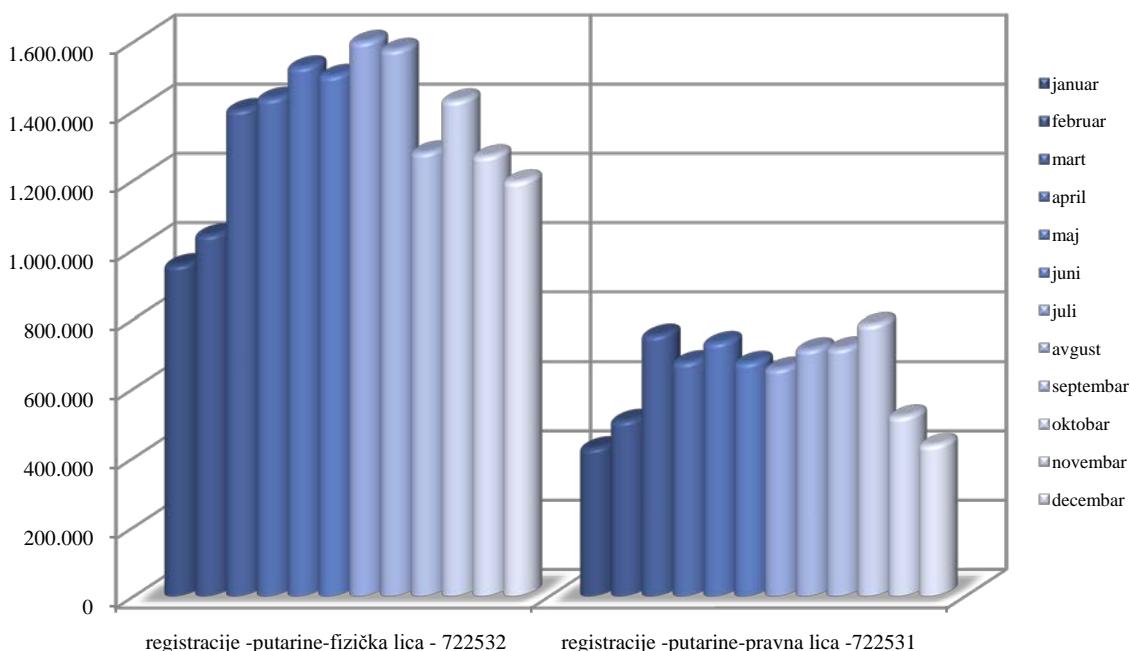

Grafički prikaz ostvarenja prihoda od putarine – registracije fizička i pravna lica

**1.4. službe “Pomoć i informacije na cestama”-** Na osnovu člana 88.i 100. Zakona o cestama Federacije BiH i Odluke Vlade Federacije BiH V broj: 45/11 („Službene novine Federacije BiH“ br: 5/11.) definisana je ova vrsta naknade. Planiran prihod od naknade iznosi 5,00 mil.KM, a realizovan je sa 4,90 mil.KM. JP Ceste F BiH provode zakonsku procedure i na osnovu javnog oglašavanja zaključuju ugovore o vršenju službe sa automoto klubovima koji su adekvatno organizovani, tehnički, kadrovski i materijalno opremljeni i imaju uslove za vršenje ove službe. Finansijska sredstva iz ove naknade mogu se utrošiti samo u vršenju ove službe i njenoj implementaciji.

**1.5. za korištenje cestovnog zemljišta** - u zaštitnom pojasu uz magistralnu cestu, na osnovu Zakona o cestama F BiH, obračunava se naknada. Uredbom o izmjeni i dopunama visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas V broj:956/2015, usvojenom od strane Vlade F BiH, regulisana je visina naknade. Po ovom osnovu JP Cesta F BiH su ostvarile prihod u iznosu od 1,50 mil.KM.

**1.6. i 1.7. od vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage)** – realizovano je 0,61 mil.KM, od planiranih 0,60 mil.KM. U skladu sa Zakonom o cestama u F BiH vozila na magistralnoj cesti moraju udovoljavati propisanim uslovima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja. Naknadu za vanredni prevoz uplaćuje podnositelj zahtjeva u skladu sa izdatim odobrenjem od strane JP Cesta F BiH.

**2. Druga sredstva - učešće u strukturi javnih prihoda** **0,71 %**  
**su slijedeća:**

**2.1 naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu** – Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH“ br:58/2015), a sve na osnovu Zakona o cestama u F BiH, regulisana je ova

vrsta naknade.

Neophodno je napomenuti da JP Ceste F BiH potražuju po osnovu zakupa zemljišta i reklamnih panoa iznos od 1,90 mil.KM, dok je po istom osnovu utuženo 1,30 mil.KM (Media res d.o.o. Mostar 178.560 KM, Petrol d.d. Ljubuški 82.928 KM, Trgo Santovac d.o.o. Srebrenik 47.765 KM, Imzit komerc d.o.o. Sarajevo, 37.247 KM, Kasumović Fuad i Mersija Zenica 33.412 KM; Zovko oil d.o.o. Žepče 31.491 KM, Europlakat d.o.o. Sarajevo 30.946 KM, Ves d.o.o. Žepče 27.041 KM, Buba Commerce d.o.o. Vitez 26.652 KM, TGT Trag Tas d.o.o. Ilijaš 25.914 KM, Mustapić Frigo d.o.o. Široki brijeg 24.047 KM, OS Petrol d.o.o. Srebrenik 23.178 KM, Općina Posušje 19.739 KM, Sisko trade d.o.o. Gračanica 18.050 KM, Oštraković Almir Tuzla 17.892 KM; Talić Tank d.o.o. Sanski most 17.514 KM, Sinbra d.o.o Tuzla 16.941 KM, Kalen d.o.o. Zenica 16.626 KM, Autosobraćaj d.o.o. Travnik 15.256 KM; Euroagent d.o.o. Maglaj 15.840 KM, D&B Transpost d.o.o. Busovača 14.161 KM i dr.).

**2.2;2.3 i 2.4. naknada za kamate, saglasnosti i raspisane tendere – Od planiranih 0,19 mil.KM, realizovan je prihod 0,16 mil.KM.**


### **3. Naknadno utvrđen prihod - učešće u strukturi javnih prihoda 2,43 %**

Realizovan je u iznosu od 1,73 mil.KM, što je više za 44% od planiranih 1,20 mil.KM. U strukturi naknadno utvrđenog prihoda najveće učešće imaju obračunate pozitivne kursne razlike SDR-ova, po kreditu Svjetske banke za Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ u iznosu od 1,41 mil.KM, zatim ukinuta rezerviranja po započetim sudskim sporovima 0,18 mil.KM, prihod od naplate šteta osiguravajućih kuca 0,08 mil.KM, od prodaje otpada (elastično - odbojna ograda) 0,02 mil.KM, prodaje starih putničkih automobila 0,01 mil.KM, naplate regresnih potraživanja i dr.

## **A.II AMORTIZACIJA**

Red. Br.	O P I S	Realizovano 01.01- 31.12.2016.	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01- 31.12.2017.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortizacija stalnih sredstava	813.704	800.000	810.145	101	100
<b>U K U P N O</b>		<b>813.704</b>	<b>800.000</b>	<b>810.145</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

*Napomena:* Objašnjenje amortizacije dato na strani 28.

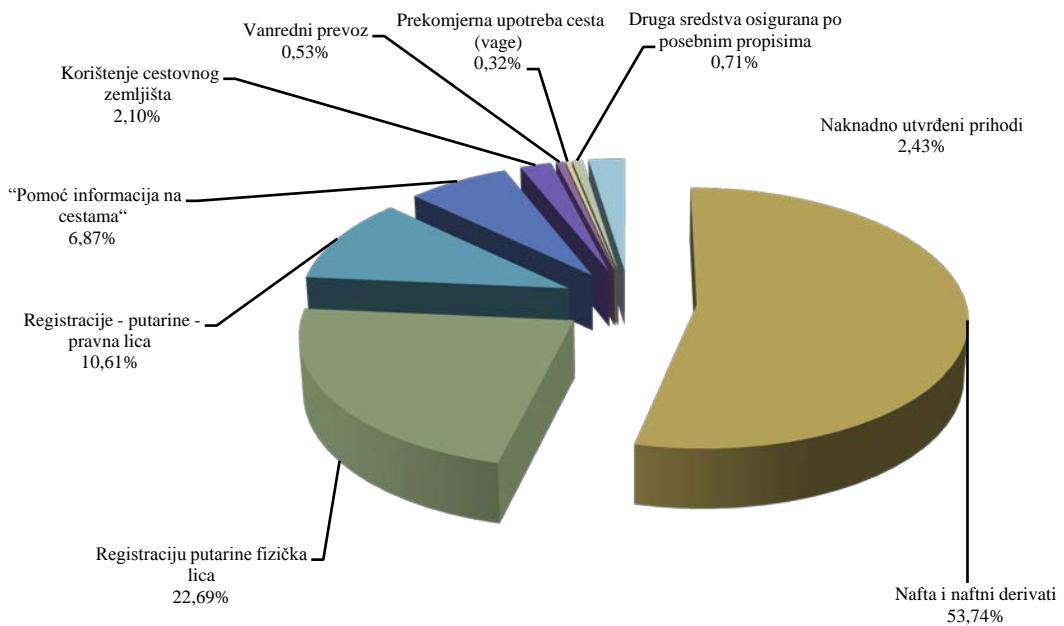


*Na grafikonu je prikazana ostvarena struktura javnih prihoda*

**B.I JAVNI RASHODI**

Red Br.	O P I S	Realizovano 01.01.- 31.12.2016	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Troškovi poslovanja</b>	<b>4.989.842</b>	<b>5.507.900</b>	<b>4.878.291</b>	<b>89</b>	<b>98</b>
<b>2.</b>	<b>Služba pomoći i informacija</b>	<b>4.437.799</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.568.519</b>	<b>98</b>	<b>103</b>
<b>3.</b>	<b>Redovno održavanje</b>	<b>32.142.818</b>	<b>32.745.600</b>	<b>32.664.342</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
<b>4.</b>	<b>Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode</b>	<b>6.802.142</b>	<b>500.000</b>	<b>1.050.536</b>	<b>210</b>	<b>15</b>
<b>5.</b>	<b>Rezervirana sredstva za sudske presude</b>	<b>2.353.775</b>	<b>1.600.000</b>	<b>939.095</b>	<b>59</b>	<b>40</b>
<b>6.</b>	<b>Troškovi konsultantskih usluga</b>	<b>295.105</b>	<b>241.700</b>	<b>206.061</b>	<b>85</b>	<b>70</b>
<b>7.</b>	<b>Kamate, servisni troškovi i kursne razlike</b>	<b>1.525.356</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.185.297</b>	<b>119</b>	<b>78</b>
<b>U K U P N O</b>		<b>52.546.837</b>	<b>46.245.200</b>	<b>45.492.141</b>	<b>98</b>	<b>87</b>

Javni rashodi su realizovani u iznosu od 45,49 mil.KM, što je 98% od planiranih 46,25 mil.KM. Najveću stavku rashoda od 32,66 mil.KM, čini redovno održavanje zajedno sa zimskom službom i ostalim rashodima vezanim za redovno održavanje magistralnih cesta (redovno održavanje mostova, glavni pregledi objekata, troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa, poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekat, održavanje elektroopreme, sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola, redovno održavanje brojača prometa, obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola, tvornička kalibracija mjerača refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije, te utrošak posipne soli). Troškovi poslovanja, troškovi službe pomoći informacija, konsultantskih usluga i rezervirana sredstva za sudske presude su realizovane u manjem obimu od planiranih sredstava, dok su rezervirana sredstva za rizike realizovana sa 1,05 mil.KM, što je više za 110 % od planiranih 0,50 mil.KM, zbog obračunate provizije na nepovučena kreditna sredstva prema potpisanim uslovima kredita EBRD i EIB-a za Program „Modernizacija cesta u F BiH“. Kamate, servisni troškovi i kursne razlike odnose se na Programme “Rehabilitacija cesta u F BiH” i “Modernizacija cesta u F BiH”

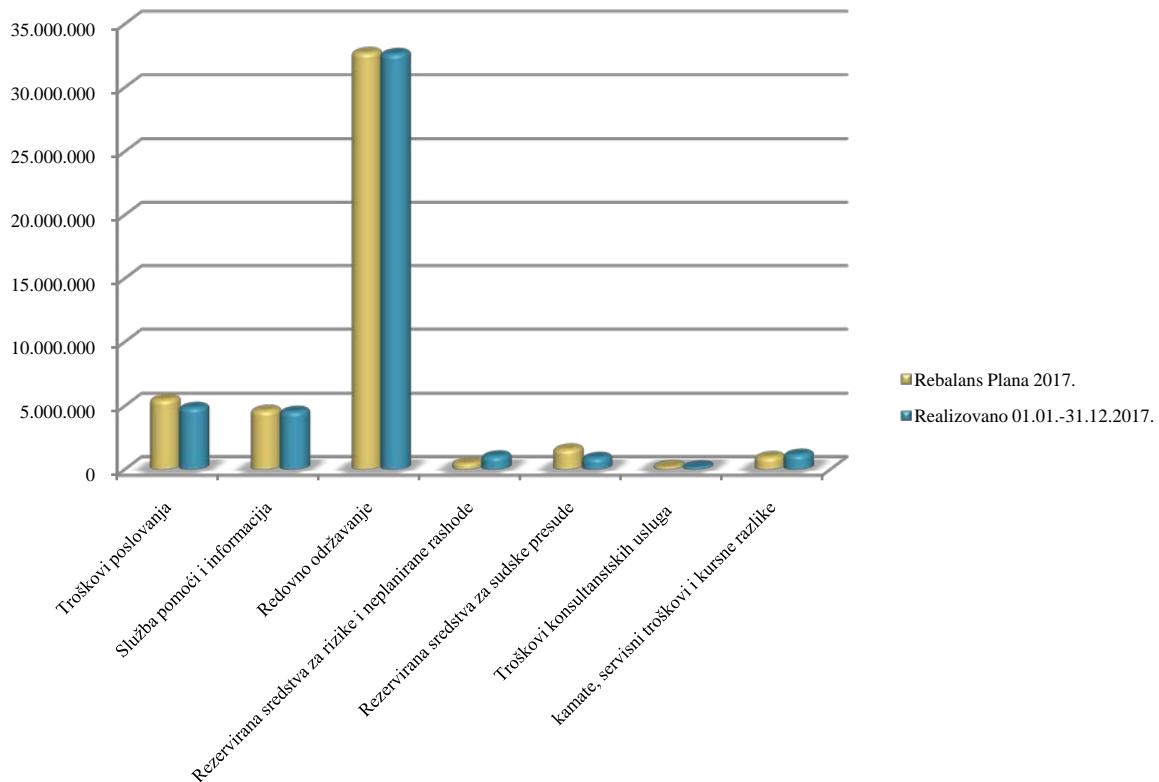

Grafički prikaz visine planiranih i ostvarenih rashoda

## 1.Troškovi poslovanja

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.-31.12.2017.	Index 4/3
1	2	3	4	5
I	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>4.245.900</b>	<b>3.830.246</b>	<b>90</b>
II	<b>Materijalni troškovi i usluge</b>	<b>1.262.000</b>	<b>1.048.045</b>	<b>83</b>
	<b>UKUPNO I+II</b>	<b>5.507.900</b>	<b>4.878.291</b>	<b>89</b>

Od planiranih 5,51 mil.KM za troškove poslovanja, utrošeno je 4,88 mil.KM, od čega za troškove zaposlenih 3,83 mil.KM, a za materijalne troškove i usluge 1,05 mil.KM.

### I Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih u izveštajnom periodu iznosili su 3,83 mil.KM, a obuhvataju: troškove bruto plaća zaposlenih, naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast (naknada troškova prevoza s posla i na posao, naknada za ishranu u toku rada – topli obrok, regres za godišnji odmor...).

## II Materijalni troškovi i usluge

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	kancelarijski i potrošni materijal	45.000	48.235	107
2.	električna energija	45.000	42.204	94
3.	gorivo i mazivo za automobile	90.000	65.792	73
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	15.000	8.499	57
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	196.000	157.613	80
6.	učešće na sajmovima i seminarima	65.000	58.873	91
7.	stručna literatura i časopisi	14.000	12.753	91
8.	grijanje	40.000	26.930	67
9.	zakupnina	52.000	51.056	98
10.	reklama i propaganda	10.000	1.801	18
11.	osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi	65.000	33.594	52
12.	bankarske usluge	10.000	6.401	64
13.	reprezentacija	30.000	31.246	104
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	40.000	42.657	107
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	35.000	28.644	82
16.	privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu	35.000	5.064	14
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	76.000	78.202	103
18.	održavanje čistoće	48.000	47.100	98
19.	obezbjedjenje zgrade	10.000	8.066	81
20.	PTT usluge	100.000	102.845	103
21.	komunalne usluge	16.000	15.778	99
22.	stručno osposobljavanje	5.000	0	0
23.	tenderi, konkursi i oglasi	30.000	22.787	76
24.	takse	25.000	18.501	74
25.	advokatske usluge i trošk.vještačenja	10.000	2.418	24
26.	troškovi eksterne revizije	32.000	17.527	55
27.	troškovi Odbora za reviziju	32.000	32.353	101
28.	ostali troškovi poslovanja	30.000	30.004	100
29.	kamate i kursne razlike	1.000	0	0
30.	naknadno utvrđeni rashodi	30.000	29.502	98
31.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	25.000	21.518	86
32.	troškovi ulaganja u tude građevinske objekte	5.000	82	2
<b>U K U P N O II</b>		<b>1.262.000</b>	<b>1.048.045</b>	<b>83</b>

Materijalni troškovi su realizovani sa 1,05 mil.KM, što čini 83 % od planiranih 1,26 mil.KM. Većina stavki je realizovana u manjem iznosu od planiranih budžeta, dok je do prekoračenja pojedinih stavki došlo, zbog pojačanih aktivnosti vezanih za Program „Modernizacija cesta u F BiH“.

### 2. Služba “Pomoć - informacije na cestama”

Na osnovu člana 88. tačke 5. i člana 100. stav 3 Zakona o cestama F BiH i Odluke o službi „Pomoć-informacije“ (Vlada Federacije BiH, od 20. januara 2011. godine) regulisana je posebna naknada za službu „Pomoć-informacije“ na cestama.

Na osnovu člana 100. stav 2 Zakona o cestama F BiH, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14.), a u skladu sa uvjetima definiranim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe «Pomoć-informacije» na cestama F BiH i na osnovu provedenog otvorenog postupka, za period: od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, te na temelju Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe «Pomoć-informacije» (SPI) na javnim cestama u F BiH su sklopljeni ugovori za 2017. godinu sa:

- Auto moto savez u Bosni i Hercegovini (skraćeni naziv: AMS u BiH) Mostar za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Posavskog kantona (1 vozilo), Kanton Središnja Bosna (3 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kanton (3 vozila), Zapadnohercegovačkog kantona (2 vozila) i Kanton 10 (2 vozila), i
- BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub) Sarajevo za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Unsko-sanskog kantona (4 vozila), Tuzlanskog kantona (5 vozila), Zeničko-Dobojskog kantona (4 vozila), Bosansko-podrinjskog kantona (1 vozilo), Srednjo-bosanskog kantona (2 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kantona (4 vozila) i Kantona Sarajevo (5 vozila + 1 vozilo-spec.vozilo «rescue car»).

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesecnim privremenim obračunskim situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste FBiH. Nadzor nad radom Službe «Pomoć-informacije» obavlja ovlašteno lice JP Ceste FBiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI. Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu mjesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstataje nađeno stanje.

Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti uključeno. Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije, kontroliše se izvještaj koji sadrži navedene elemente i finansijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene usluge i nabavke).

Prema dostavljenim mjesecnim obračunskim situacijama tokom 2017. godine ostvaren je slijedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI:

Red.br.	Izvršitelj usluga SPI	Prispjela sredstva	% umanjenje po osnovu člana 5. Ugovora **	Obaveza Razlika (2-3)	Vrijednost situiranih radova	Razlika (4-5)*
1.	2	3	4	5	6	
1.	BIHAMK Sarajevo	3.906.464	266.909	3.639.555	3.633.012	6.543*
2.	AMS U BIH Mostar	997.091	68.126	928.964	927.294	1.670*
<b>UKUPNO</b>		<b>4.903.555</b>	<b>335.035</b>	<b>4.568.519</b>	<b>4.560.306</b>	<b>8.213</b>

*Pregled obima poslova i prihoda po osnovi naknade za poslove SPI za 2017. godinu*

- \* Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2017. godini za SPI je bio manji za :
- 6.543 KM kod BIHAMK-a i

- 1.670 KM kod AMS u BIH,

pa će taj dio razlike novčanih sredstava biti uvećan AMK-a u situaciji za februar 2018. godine.

\*\* Procentualno umanjenje iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2017. godinu, u iznosu od 6,8325 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po konačnom obračunu JP C FBiH).

Za navedene i izvršene poslove SPI u Federaciji BiH, tokom 2017. godine, utrošena su ukupna sredstva kako slijedi:

- Pomoć na cesti	3.696.901 KM
- Informiranje	663.215 KM
- <u>Prometno-preventivne aktivnosti</u>	<u>200.190 KM</u>
<b>U K U P N O</b>	<b>4.560.306 KM</b>

S obzirom na priliv finansijskih sredstava, BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub, Sarajevo) i AMS u BIH (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini, Mostar) su poslove pomoći na cesti, informisanja i prometno - preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti.

### **3.Redovno održavanje cesta**

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

Procedura postupka javne nabavke za potpisivanje novih sporazuma za naredni četverogodišnji period je pokrenuta u ljeto 2012. godine, i za 11 od 12 LOT-ova, potpisani su okvirni sporazumi sa izvođačima radova za period 01.09.2014. - 31.08.2018, te jednogodišnji ugovori za period 01.09.2016. -31.08.2017.godina, dok je za LOT 7 ugovor potpisana nakon okončanja žalbenog postupka.

Za LOT 11 (magistralne ceste na području Herceg-Bosanskog kantona-regija Livna), zaključen je Okvirni sporazum po principu «Dobro izvršenje radova održavanja» (pilot projekat) u skladu sa preporukama Evropske banke. Sporazum je sklopljen za period 01.09.2014. g. - 31.08.2018. godine.

Na LOT-u 3, LOT-u 9 i LOT-u 12 je došlo do izmjene dužine cesta zbog prekategorizacije 3 dionice iz regionalnih u magistralne ceste. Radi se o dionicama: M-17.4 Mostar – Ljubuški - Crveni grm, M-1.9 Gradačac-Ormanica i M-14.2 Odžak-Šamac-Orašje, za koje je preuzeto održavanje.

Radovi redovnog održavanja cesta se uglavnom obavljaju u periodu od 16.03. do 14.11. tekuće godine, a izvršeni su tako da se prioritetsno izvršavaju radovi na čišćenju i sanaciji kolovoza, ophodnji cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, regulaciji odvodnje, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, održavanju bankina, bermi, kosina usjeka i nasipa, održavanje objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta, Pravilnikom o održavanju cesta i ugovorenim predračunom radova i planiranim i raspoloživim finansijskim sredstvima.

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

U periodu od 01.01.2017. - 15.03.2017. godine odnosno od 15.11 - 31.12.2017 godine kad se prema Pravilniku uspostavlja zimska služba na mreži magistralnih cesta u FBiH, formirano je dežurstvo na punktovima zimske službe, te izvršavani poslovi prema Operativnom planu zimske službe: čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, ulazno-izlaznim trakama, objektima i proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala (sol i abrazivni materijal), uklanjanje osulinskog i drugog materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju promet, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izljevanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i prometne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 „obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima, informiranje o stanju prohodnosti cesta i druge mjere i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa.

Nakon završetka zimske službe i obračuna radova na zimskom održavanju, zbog povoljnih vremenskih prilika, odnosno ispodprosječnih sniježnih padavina na pojedinim područima F BiH, pokazalo se da su planirana ukupna sredstva za zimsku službu ostala neutrošena u visini od cca 2,0 mil.KM (oko 20 % planirane vrijednosti). Uz saglasnost Uprave JP Ceste FBiH dio neutrošenih sredstava zimske službe biće iskorišten za neophodne radeove redovnog održavanja cesta.

Prema potpisanim Sporazumu, učešće JP Ceste FBiH u održavanju pružnih prijelaza na cesti M-14 Bihać-Bosanska Krupa iznosi 50% vrijednosti radova, a učešće JP ŽFBiH 50%. Na osnovu ovog Sporazuma u 2017. godini nije bilo realiziranih radova.

Troškovi redovnog održavanja mostova i održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica i mostova, te semafora i brojača prometa su realizovani prema stvarnom utrošku odnosno prema fakturama Elektrodistribucije.

### **Pregled ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta za period 01.09.2016. - 31.08.2017. i 01.09.2017-31.08.2018.g.**

Red.br	LOT	Izvođač	Broj ugovora	Ugovoreno	Broj ugovora	Ugovoreno	Period
			01.09.2016-31.08.2017 01.02.-31.08.2017 LOT 7*	01.09.2017.-15.03.2018.			
1.	LOT1	Rad-putevi Bihać	01-02.2-7452/16	2.607.367	01-02.2-7861/17.	2.396.927	01.09.2017.- 31.08.2018.
2.	LOT2	Kov-grad Bužim	01-02.2-7453/16	2.049.978	01-02.2-7862/17.	1.990.988	01.09.2017.- 31.08.2018.
3.	LOT3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	01-02.2-7454/16	3.829.588	01-02.2-7836/17.	3.905.911	01.09.2017.- 31.08.2018.
	LOT3**	Anex Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice	01-02.2-11438/16	76.649			
4.	LOT4	Doboj putevi Doboj jug	01-02.2-7455/16	2.159.977	01-02.2-7864/17.	2.059.434	01.09.2017.- 31.08.2018.
5.	LOT5	Rudnici gipsa Donji Vakuf	01-02.2-7456/16	1.899.987	01-02.2-7865 /17.	2.099.727	01.09.2017.- 31.08.2018.
6.	LOT6	Goraždeputevi Goražde	01-02.2-7457/16	1.399.989	01-02.2-7866/17.	1.261.982	01.09.2017.- 31.08.2018.
7.	LOT7*	PZP Mostar	01-02.2-7458/16	1.659.735	01-02.2-9298/17.	922.750	01.09.2017.- 15.03.2018.
			01-02.2-1565/17	783.843			
8.	LOT8	Sarajevoputevi Sarajevo	01-02.2-7459/16	2.209.966	01-02.2-7867/17.	2.289.577	01.09.2017.- 31.08.2018.
9.	LOT 9	Ceste Mostar	01-02.2-7460/16	539.635	01-02.2-7868/17	201.440	01.09.2017.- 31.08.2018.
	LOT 9***	Anex Ceste Mostar	01-02.2-11355/16	367.273			
10.	LOT10	Ceste Mostar	01-02.2-7461/16	2.559.917	01-02.2-7869/17.	1.788.680	01.09.2017.- 31.08.2018.

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:

11.	LOT11	Ceste Mostar	01-02.2-7462/16	5.237.964	01-02.2-7870/17.	5.356.829	01.09.2017.- 31.08.2018.
12.	LOT12****	Ceste Mostar	01-02.2-7463/16	3.779.976	01-02.2-7871/17.	3.468.951	01.09.2017. 31.08.2018
		<b>UKUPNO</b>		<b>31.161.844</b>		<b>28.473.176</b>	

Napomena:

\*Na LOT-u 7 ugovor sa PZP Mostar potpisana je za period 01.09.2016.-31.08.2017, odnosno do završetka postupka nabavke. Po okončanju žalbenog postupka, ovaj Ugovor je prekinut sa 31.01.2017. Pregovarački postupak je proveden za radove redovnog održavanja na LOT-u 7, pa je potpisana novi ugovor za period 01.02.2017. do 31.08.2017. odnosno do okončanja nabavke potpisana na iznos 783.843 KM.

\*\*Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj:1020/2016. Regionalna cesta R-402 Ormanica-Gradačac-Slatina (gr.ent), razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M 1.9. Potpisana je Anex ugovora za radove redovnog održavanja navedenog pravca za period 15.11.2016. do 31.08.2017. vrijednosti 76.649 KM, po osnovu Ugovora redovnog održavanja LOT-a 3. Navedena dionica je duga 19,68 km. Pored navedenog, Anexom ugovora je obuhvaćeno i redovno održavanje novoizgrađenog tunela Karaula i pripadajuće trase na magistralnoj cesti M-18 za period 15.11.2016. do 31.08.2017.

\*\*\*Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj: 1020/2016. Regionalna cesta R-464 Oraše-Šamac-Odžak razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M 14.2. Potpisana je Anex ugovora za radove redovnog održavanja navedenog pravca za period 15.11.2016. do 31.08.2017. vrijednosti 367.273 KM, po osnovu Ugovora redovnog održavanja LOT-a 9. Navedena dionica je duga 31,47 km.

\*\*\*\*Na osnovu Odluke Vlade F BiH Vbroj:1737/15. Regionalna cesta R-424 Mostar-Čitluk-Tromeda - Ljubuški-Teskera-Crveni grm, razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M17.4. Potpisanim Ugovorom za Lot 12 za 2016/17, obuhvaćeno je redovno održavanje i ove ceste.

Novim ugovorima od 01.09.2017. godine za LOT 3, LOT 9 i LOT 12, sve novoproglašene magistralne ceste su obuhvaćene redovnim održavanjem.

Realizacija radova redovnog održavanja magistralnih cesta:

LOT	Mag. Cesta	Dužina u km	Dionice magistralnih cesta	Rebalans Plana 2017.			Realizovano 01.01.-31.12.2017.		
				Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno
1. L=207,73km	M5	111,894	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečovo(gr.ent)	1.420.000	997.000	2.417.000	1.357.436	968.894	2.326.330
	M11	8,526	Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske)						
	M14	11,666	Bihać-Srbljani						
	M14.2	26,337	Bosanski Petrovac-Drvar						
	M15	49,303	(gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ						
2. L=141,52 km	M4.2	51,343	(gr.Hrvatske) Velika Kladuša-Cazin-Srbljani	1.158.000	697.000	1.855.000	1.157.529	821.942	1.979.471
	M14	37,538	Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta)						
	M14.2	52,642	Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac						
3. L=237,59km	M1.8	40,849	(gr.ent)-Arizona(gr.distr) (Gr.distr.)-Srebrenik-Šiški Brod	2.284.000	1.471.000	3.755.000	2.283.237	1.484.993	3.768.230
	M4	67,12	Donja Orahovica-Petlja Šiški-Tuzla-Kalesija-Memići(gr.ent)						
	M14.1	13,021	(gr.ent)-Gradačac-(gr.ent)						
	M18	84,38	(gr.ent.)Banj Brdo_Simin Han Šiški Brod-Kladanj—Tunel Karaula- Olov						
	M19.2	11,867	Vitalj-(gr.ent)						
	M1.9	20,357	Gradačac-Ormanica-Slatina						

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:

4. L=139,44 km	M4	38,462	(gra,ent)Jelah-Karuše (gran.ent.) Stanić Rijeka-Gračanica-Donja Orahovica	1.351.000	626.000	1.977.000	1.350.045	656.398	2.006.443
	M17	100,982	(gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješovo Lašva-Kaonik						
5. L=131,68 km	M5	80,817	(gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje	1.126.000	711.000	1.837.000	1.126.627	692.696	1.819.323
	M16	50,859	(gr.ent.) crne Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica						
6. L=93,335km	M5	13,998	(gran.ent.)Prača-Hrenovica(gr.ent.)	922.000	428.000	1.350.000	921.060	471.694	1.392.754
	M18	6,016	(gr.ent.)Bogatići-Trnovo(gr.ent.)						
7. L=126,54km	M18.1	46,281	Ustikolina-Grebak-Trnovo						
	M20	27,040	(gr.ent.)Ustikolina-Goražde(gr.ent.)						
8. L=127,86km	M6.1	24,087	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent)	890.000	531.000	1.421.000	823.058	516.797	1.339.855
	M14.2	30,075	Prozor-Jablanica						
9. L=64,13km	M17	72,376	Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice						
	M5	26,581	Zelena meraja-Most,raskršće Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica Jošanica-Stup	1.234.000	807.000	2.041.000	1.233.676	970.751	2.204.427
10. L=136,12km	M17	47,002	Stup-Tarčin-Konjic	598.000	332.000	930.000	597.226	303.973	901.199
	M18	54,273	Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup-Dobrinja (gran.ent)						
11. L=346,55km	M1.8	7,992	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent)	1.522.000	864.000	2.386.000	1.534.413	998.835	2.533.248
	M14.1	24,664	(gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent)						
12. L=318,89km	M14.2	31,47	Odzak- gr.entiteta i gr. Ent.Orašje						
	M5	57,991	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena Meraja						
13. L=110,12km	M16.2	39,509	Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor	2.699.000	2.230.000	4.929.000	2.698.936	2.212.902	4.911.838
	M16.4	38,618	Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje						
14. L=110,12km	M6.1	158,025	(gr.Hrvatske) Kaldroma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo- Studena Vrlja						
	M14.2	33,355	Drvare-Resanovci Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske)						
15. L=110,12km	M15	95,643	(gr.ent)-Glamoč-Priluka Livno-Kolo						
	M16	56,587	Tunel K.Vrata-Kupres- Sujica Livno-Kamensko-(gr.Hrvatske)						
16. L=110,12km	M16.3	2,935	Renjići-Prisika (gr.Hrvatske)						
	M2	9,258	Gr.Hrvatske-Neum-gr.Hrvatske						
17. L=110,12km	M6	85,004	Gr.Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac- gr.ent.						
	M6.1	61,347	Studena vrlja-Posušje-Široki brijege-Mostar	2.723.000	807.000	3.530.000	2.722.541	849.630	3.572.171
18. L=110,12km	M15	3,111	Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske						
	M17	38,582	Gnojnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske)						
19. L=110,12km	M17.3	71,721	Buna-Masline Stolac-Hutovo -Neum						
	M20	8,49	Gr.Hrvatske-Duži-gr.entit.						
20. L=110,12km	M17.4	41,377	Mostar-Ljubuški-Crveni Grm						
	<b>U K U P N O</b>	<b>2.071,36</b>		<b>17.927.000</b>	<b>10.501.000</b>	<b>28.428.000</b>	<b>17.805.784</b>	<b>10.949.505</b>	<b>28.755.289</b>

## - Redovno održavanje mostova na magistralnim cestama

Naziv		Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2017.
Redovno održavanje mostova		HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-8443/16, 20.09.2016. 01-02.1-11499/17.28.12.2017.	254.459 (preneseno 51.177) 564.584	50.499
<b>U K U P N O</b>				<b>50.499</b>

Dio ugovora za održavanje mostova, zaključen sa HP Investing d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1-8443/16. 20.09.2016. godine, na iznos 254.459 KM je realizovan tokom 2016 godine, a okončan u izvještajnom periodu. Sa istim izvođačem krajem godine potpisani je ugovor naveden u gornjoj tabeli.

**Glavni pregledi mostova** - na osnovu ugovora broj: 01-02.1-11354/17. od 21.12.2017. godine vrijednosti 12.636 KM, Ipsi Institut d.o.o. Sarajevo treba da uradi pregled mosta preko rijeke Bosne (M17-007-172) Bosna III, Topčić polje.

- **Novelirani prometni projekti**

Red. broj	Mag. Cest.	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Konsultant	Ugovorenog	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.
1.	M-1.9	Izrada noveliranog prometnog projekta na dionicima: - gr. entiteta /Slatina/Ledenice- Gradačac - Ormanica L = 21 km	Projektovanje	2.900	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-8621/17. 25.09.2017.	2.819	1.128
			Revizija	1.500	NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11183/17. 15.12.2017.	1.450	
2.	M-14.2	Izrada noveliranog prometnog projekta na dionicama: Odžak – Bosanski Šamac – Bosanski Šamac – Orašje, L = 31,4 km	Projektovanje	4.300	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-8621/17.	4.216	1.686
			Revizija	2.000	NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11183/17. 15.12.2017.	1.914	
3.	M-17.4	Izrada noveliranog prometnog projekta na dionicama: Mostar - Čitluk - Ljubuški - Crveni Grm (gr. Hrvatske), L = 45 km	Projektovanje	5.900	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-8621/17.	6.042	2.417
			Revizija	2.500	NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11183/17. 15.12.2017.	2.436	
		<b>UKUPNO</b>		<b>19.100</b>			<b>5.231</b>

Projektovanje i revizija u toku.

- **Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)**

Okvirni sporazumi, kojima se regulišu okvirna pitanja vezana za nabavku radova redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u FBiH, a kojima je tokom 2017. godine istekao rok važenja su:

- LOT 1- ELKO - Marić Mostar, broj: 01-02.4-6376/13, 23.07.2013. - 232.345 KM, (period: 01.08.2013.-31.07.2017.)
- LOT 2-A Eling d.o.o. Zenica, broj: 01-02.4-6958/13, 20.08.2013. - 156.422 KM, (period: 22.08.2013.-21.08.2017.)
- LOT 3- Step d.d. Sarajevo, broj: 01-02.2-6378/13, 23.07.2013. - 152.104 KM, (period: 01.08.2013.- 31.07.2017.),

te je potpisana novi dana: 22.09.2017. (01-02.4-8590/17.), za period 2017-2021. godina, sa Step d.d. Sarajevo na iznos od 712.104 KM,

Obzirom da je tokom godine istekao okvirni sporazumu za održavanje semaforskih uređaja i opreme na magistralnim cestama za period 2013 - 2017. godina, potpisana je novi okvirni sporazum za period 2017.-2021. sa firmom STEP d.d. Sarajevo, vrijednosti 981.122 KM.

Troškovi redovnog održavanja elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima,

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa, su realizovani prema stvarnom utrošku odnosno prema fakturama Elektrodistribucije.

Ugovori za usluge (nadzor) na radovima redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u FBiH i nadzora na radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima potpisani su ugovori sa Aber Desing d.o.o. Sarajevo, koji su navedeni u donjoj tabeli.

Naziv i opis projekta	Rebalans Plana 2017.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.
Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrižja, semafori i trafo stanice)	500.000	LOT 1 Elko Marić d.o.o. Mostar, 01-02.2-7832/16, 01.09.2016.	58.086	57.693
		-Step d.d. Sarajevo, (LOT1,2,3) 01-02.2-6187/16, 15.07.2016. (preneseno 99.150)	136.533	98.005
		A Eling d.o.o. Zenica, 01-02.2-8324/16, 16.09.2016 (preneseno 3.277)	18.555	3.276
		Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-7831/16,01.09.2016.	23.277	23.242
		Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-7052/17,03.08.2017.	245.281	67.454
		Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-8592/17,22.09.2017.	178.026	14.067
		Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-8879/17.04.10.2017.	7.020	-
		Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-8880/17.04.10.2017.	7.020	-
<b>UKUPNO</b>	<b>500.000</b>			<b>263.730</b>

- **Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama** kod škola na različitim lokacijama magistralnih pravaca u Unsko-sanskom kantonu (12 lokacija) i Srednjobosanskom (8 lokacija) uradila je firma Sacom d.o.o. Sarajevo na osnovu ugovora broj:01-02.2-4252/17 od 10.08.2017. vrijednosti 42.494 KM.
- **Sanaciju postojećih i izgradnju novih svjetlosnih prometnih znakova** kod škola na magistralnim cestama radi Sacom d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1598/17, 27.02.2017. vrijednosti ugovorenih radova 70.762 KM, od čega je realizovano 56.453 KM.

- **Za monitoring vozila redovnog održavanja GPS/GPRS uređajima**, potpisani je ugovor sa TIM Sistemom d.o.o. Sarajevo broj:01-02.2-948/17 dana 03.02.2017. na iznos 6.965 KM do 31.08.2017. U cilju bolje kontrole i pravičnijeg obračuna rada izvođača sagledane su mogućnosti koje pružaju moderne tehnologije pozicioniranja, praćenja i kontrole rada pojedinih mašina angažovanih na aktivnostima redovnog održavanja. Preuzimanjem kontrole i odvajanjem efektivnog rada iz ukupnog , moguće je ostvariti određene uštede kroz obračun stvarnih stvari sati rada uz isti ili bolji efekat na cesti, uz brži i učinkovitiji rad nadzorne službe. Na ovaj način omogućuje se: pregled nad vozilima u realnom vremenu, mogućnost prikazivanja trenutne lokacije vozila, brzina kretanja, vrijeme stajanja sa upaljenim motorom, iscrtavanje putanje kretanja vozila sa prikazanim mjestima zaustavljanja na mapi i prikazanim vremenima zaustavljanja sa upaljenim i ugašenim motorom, animacija rute za sva vozila, izrada izvještaja o vožnji i zaustavljanjima, što tačnije preciziranje vozila na mjestu rada, praćenje i izrada izvještaja o efektivnom radu motora i sati rada motora bez opterećenja, evidentiranje ukupnih sati rada motora, evidentiranje ukupnog broja pređenih kilometara, registracije pređenog puta i vremena provedenog sa upaljenim ili ugašenim senzorima za registrovanje pluga i statusa posipača,

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

dodjele različitih uloga za različite korisnike sistema, shodno nivou ovlaštenja, omogućuje pristup određenim podacima ili grupama vozila, razvrstavanje vozila zbog lakšeg praćenja, praćenje voznih jedinica na bilo kojem uređaju koji ima pristup internetu, izrade izvještaja (analitički i grafički, gdje je to potrebno) u zadatom vremenskom periodu i u slučaju zastoja ili kvara u sistemu odziv u roku 24 sata.

Telefonija Vidaković d.o.o Doboj je izvođač radova na projektu koordinacije pet semaforiziranih raskrsnica na M5 u Travniku (zeleni val) na osnovu ugovora broj:01-02.2-5873/17, od 22.06.2017. vrijednosti 43.649 KM. Također je potpisana i realizovan ugovor 01-02.2-10064/17. 10.11.2017. o nabavci i zamjeni dotrajalih semaforskih lanterni u iznosu od 8.067 KM.

**Usluge tvorničke kalibracije instrumenata za mjerjenje refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije** na period od dvije godine radi Faring d.o.o.Sarajevo, na osnovu ugovora 01-02.2-5136/17. od 02.06.2017. na iznos 24.997 KM.

**Tokom 2017 godine realizovani su ugovori za nabavku i transport soli** do punktova za zimsko održavanje cesta na teritoriji F BiH za zimu 2016/2017:

LOT 1- Macot Sol d.o.o.Mostar – 01-02.2-8490/16, 22.09.2016. na iznos 859.687 KM, za količinu 4.750 tona soli NaCl granulacije 0/4.

LOT 2 Solana d.d. Tuzla, ugovor broj:01-02.2-8489/16, 22.09.2016. na iznos 1.132.940 KM. Količina 4.825 tona soli NaCl granulacije 0/1.

LOT 3- Macot Sol d.o.o.Mostar – 01-02.2-8490/16, 22.09.2016. na iznos 203.346 KM, 220 tona soli CaCl<sub>2</sub>.

U periodu 01.01-30.06.2017. godine, po navedenim ugovorima realizovana je isporuka soli prema sljedećem:

LOT 1: Isporučeno 3.800 tona u vrijednosti od 688.717 KM

LOT 2: Isporučeno 3.275 tona u vrijednosti od 770.006 KM

LOT 3: U periodu 01.01-30.06.2017. godine nije bilo isporuke.

Početkom zimske sezone 2017/2018. potpisani su ugovori za nabavku soli i to:

LOT1: Odluka o dodjeli za Lot 1 – nabavka 4.750 tona NaCl 0/4 mm, poništena je od strane Ureda za razmatranje žalbi 06.12.2017. godine. i predmet vraćen na ponovni postupak. Nova odluka o dodjeli je donesena 28.12.2017. g, i do kraja 2017 godine nije potpisana ugovor.

LOT 2- Solana d.d. Tuzla,01-02.2-10091/17. od 13.11.2017. na iznos 1.397.302 KM u količini od 5.850 tona NaCl 0/1 mm

LOT 3- Macot Sol d.o.o.Mostar – 01-02.2-10092/17, 13.11.2017. na iznos 202.831KM, 220 tona soli CaCl<sub>2</sub>.

U periodu 01.11-31.12.2017. g realizovana je isporuka 3.500 tona soli NaCl 0/1 mm po ugovoru sa „Solonom“ Tuzla, u vrijednosti 830.729 KM

Po ugovoru za LOT 3 – CaCl<sub>2</sub>, u 2017 godini nije bilo isporuke

Isporučena so se odnosi na ugovore iz 2016.godine, koja je utrošena tokom 2016.godine, a dio u 2017.godini, po istim ugovorima. Dio isporučene soli po novom ugovoru je utrošen u 2017 godini, a neutrošeni dio se koristi u 2018 godinu.

**REKAPITULACIJA  
RASHODA REDOVNOG ODRŽAVANJA**

O P I S	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.		Index 3/2
		1	2	
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA</b>	<b>28.428.000</b>		<b>28.755.289</b>	<b>101</b>
Redovno održavanje mostova	615.000		50.499	8
Glavni pregledi objekata (složenih)	20.000		-	-
Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	500.000		475.376	95
Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	10.000		-	-
Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata	19.100		5.231	27
Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)	500.000		263.730	53
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola	71.000		65.637	92
Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om	15.000		6.962	46
Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola	42.500		42.494	100
Projekat koordinacije 5 semaforiziranih raskrsnica (zeleni val) na M5 (011) u Travniku – (izvođenje)	60.000		51.692	86
Tvornička kalibracija mjerača refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije	25.000		24.997	100
<b>Utrošak soli NaCl i CaCl<sub>2</sub></b>	<b>2.440.000</b>		<b>2.922.435</b>	<b>120</b>
<b>UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>32.745.600</b>		<b>32.664.342</b>	<b>100</b>

**4.Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode**

N A Z I V	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.-31.12.2017.
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode		
Obračunate provizije na nepovučena sredstva kredita EBRD i IBRD-a	500.000	913.628
Obračunate provizije na nepovučena sredstva kredita EBRD (prethodni period)		136.908
<b>U K U P N O</b>	<b>500.000</b>	<b>1.050.536</b>

U skladu sa uvjetima iz potpisanih ugovora o kreditu/zajmu sa IBRD/EBRD za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ obračunava se provizija na nepovučena kreditna sredstva (IBRD 0,25% godišnje, EBRD 0,5% godišnje). Provizija na nepovučena kreditna sredstva počinje se obračunavati 60 (šezdeset) dana od efektivnosti kredita, a plativa je nakon efektivnosti kredita na datume plaćanja kamata na kredit. Obračunata provizija na nepovučena sredstva kredita IBRD za 2017. godinu iznosi 0,28 mil.KM, a provizija na nepovučena sredstva kredita EBRD za 2017. godinu i dio perioda u 2016. godini ukupno iznosi 0,77 mil.KM (2016. godina 136.908 KM; 2017. godina 635.645 KM).

## 5. Rezervirana sredstva za sudske presude

N A Z I V	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.-31.12.2017.
Rezervirana sredstva za sudske presude	1.600.000	939.095
<b>U K U P N O</b>	<b>1.600.000</b>	<b>939.095</b>

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i preporuka Ureda za reviziju institucija u F BiH, JP Ceste F BiH su rezervirala sredstva za započete sudske sporove u 2017. godini 817.770 KM, za upravne i sudske troškove po sudskim presudama utrošeno je 57.213 KM, za troškove po nerezervisanim sporovima dato je 8.967 KM, zatezne kamate 55.145 KM, što ukupno iznosi 0,94 mil.KM. Inače, rezervirana sredstva se odnose na tužbe nastale zbog saobraćajnih i drugih nezgoda na magistralnim cestama.

## 6. Troškovi konsultantskih usluga

Red br.	N A Z I V	Rebalans Plana 2017.	Konsulant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.
1.	Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu	11.000	Građevinski fakultet UNSA Sarajevo, 01-2.1-8521/17. 20.09.2017.	11.027	11.027
2.	Troškovi izrade projekta izvedenog stanja magistralnih cesta	60.000	Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo i Zedis d.o.o. Zenica 01-02.5-11590/16, 30.12.2016.	44.792	44.792
3.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova	46.000	DTQ d.o.o. Sarajevo 01-02-2-853/17, 31.01.2017.	46.063	26.015
4.	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama - SUGOC-a	106.000	TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o.Sarajevo 01-02-2-5407/16, 20.06.2016. 01-02-2-7827/17, 11.08.2017.	105.791 (preneseno 24.043) 105.791	105.791
5.	Izrada i recenzija elaborata provjere sigurnosti (RSI) magistralne ceste M14-002, Srbljani- Bos.Krupa, L=21,50 km	12.200	NTSI Institut d.o.o.Sarajevo, 01-01-1-5778/17. 20.06.2017. Ugovor o djelu	7.020 4.981	12.001
6.	Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)	6.500	FEB d.d.Sarajevo, 01-03-1-11145/17. 14.12.2017.	6.435	6.435
<b>U K U P N O</b>		<b>241.700</b>			<b>206.061</b>

Rb.1 - Obradu podataka i izradu godišnjeg biltena o intenzitetu prometa na magistralnim cestama, od preuzetih podatka od JP Cesta F BiH o brojanju saobraćaja iz prethodne godine, na osnovu stabilnih i pokretnih automatskih brojača prometa uradio je Građevinski fakultet UNSA Sarajevo, na osnovu ugovora broj:01-2.1-8521/17. od 20.09.2017. Ugovorena i realizovana vrijednost iznosi 11.027 KM.

Rb.2 - Za potrebe uknjižbe katastra magistralnih cesta potpisani je ugovor sa Sarajinžinjer d.o.o. Sarajevo i Zedis d.o.o. Zenica da urade projekt izvedenog stanja dionica - M5, most preko rijeke Bosne Rajlovac 3+000 do Petlje Stup 8+628, dionica Sarajevske obilaznice, Lot 2A -

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

M16.4, Bugojno-Novi Travnik, od 16+100 (Rostovo) do 24+100 (Sinokos). Aktivnost je okončana u izvještajnom periodu.

- Rb.3 - Neovisnu vanjsku kontrolu za kvalitet izvedenih radova obavlja DTQ d.o.o.Sarajevo. Potpisani ugovor realizovan je u iznosu od 0,03 mil.KM.
- Rb.4 - TEB Informatika održava, daje stručnu podršku i unapređenje prilikom rada s programskim rješenjima SUGOC (e-mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema neophodnih za održavanje i upravljanje magistralnim cestama u Federaciji BiH.
- Rb.5 - Izrada elaborata provjere sigurnosti (RSI) magistralne ceste M14\_002 Srbljani-Bosanska Krupa, L=21,50 km, obuhvatila je prikupljanje i obradu podataka o PGDS-u, saobraćajnim nezgodama, obilazak ceste, snimanje i prikupljanje svih podataka koji su potrebni za RSI (stanje kolovoza, ravnost, hrapavost, postavljena saobraćajna signalizacija i cestovna oprema, identifikacija opasnih mjesta...). Elaborat je uradila firma NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo, na osnovu ugovora broj:01-01.1-5778/17, od 20.06.2017.godine. Na osnovu ugovora o djelu urađena je i recenzija Elaborata sigurnosti.
- Rb.6 - Za pružanje usluga Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a na osnovu Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u F BiH (uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole) i Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u F BiH, potpisani je ugovor sa FEB d.d. Sarajevo broj:01-03.1-11145/17. 12.12.2017. godine na iznos od 6.435 KM. Potpisnik se obavezao na davanje stručnih i savjetodavnih usluga JP Ceste F BiH u svrhu realizacije uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole u preduzeću.

## **7. Kamate**

Naziv	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.-31.12.2017.	Napomena
Kamate, servisni troškovi i kursne razlike za kredit EBRD-a, EIB-a i WB za program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ (vlastita sredstva)		380.320 320.854 146.795	EIB EBRD WB
Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBIH“ EIB, EBRD, WB-IBRD	1.000.000	53.326 407	EIB IBRD Vlastita sredstva (planirana u investicijama)
Jednokratna bankarska provizija na kredit WB – IBRD		283.595	Kreditna sredstva (planirana u investicijama)
<b>U K U P N O</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.185.297</b>	

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, sve obaveze za kamate, servisne troškove i kursne razlike vezane za okončani Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“, a čiji su projekti finansirani međunarodnim kreditnim sredstvima, terete rashode perioda. Program je finansiran iz slijedećih izvora:

- EBRD - operativni br.37543 45 mil.EUR

Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesечni EURIBOR +1% marža), a plaća se polugodišnje. Otplata kredita je u 24 jednake polugodišnje rate, počev od 5.12.2010 godine.

- EIB - operativni br.23924 50 mil. EUR

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesечni EURIBOR+fiksni raspon). Povlačenje kredita je bilo po tranšama (sedam tranši). Period otplate kredita je do 18 godina, uključujući 6 godina perioda odgode otplate, a otplata se vrši u jednakim polugodišnjim ratama. Otplata prve tranše kredita započeta je 2014 godine.

- WB-IDA operativni br.4371	8,20 mil.SDR
-----------------------------	--------------

Trošak servisiranja kredita iznosi 0,75% na povučena sredstva kredita, a naknada za održavanje kredita 0,5% godišnje na nepovučena sredstva kredita. Period otplate kredita je 20 godina uključujući period odgode otplate 10 godina. Otplata kredita je u jednakim polugodišnjim ratama. Otplata kredita započela je 15.12.2017 i traje do 15.06.2027 godine.


Kamate i servisni troškovi za Program „Rehabilitacija cesta FBiH“ realizovale su u ukupnom iznosu iznos 845.228 KM, od čega za EIB kredit 380.320 KM, EBRD kredit 320.854 KM i WB kredit 146.795 KM.

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, iz finansijskog rezultata JP Ceste FBiH servisirale su pristigle otplate kredita za program „Rehabilitacija cesta u FBiH“ u ukupnom iznosu 14.775.122 KM kako slijedi:

- EBRD	8.036.008 KM i
- WB IDA	949.857 KM.
- EIB	5.789.256 KM

(I tranša - 938.798 KM, II tranša 782.333KM, III tranša 938.798 KM, IV tranša 704.099 KM, V tranša 1.251.731 KM i VI tranša 1.173.498 KM)

U skladu sa uslovima kredita/zajma za projekt „Modernizacija cesta u FBiH“ obračunat je pripadajući dio kamata za 2017. godinu na povučenu I tranšu EIB kredita u iznosu od 53.326 KM, a na kredit WB-IBRD realizovana je jednokratna provizija i kamata u ukupnom iznosu od 284.002 KM.

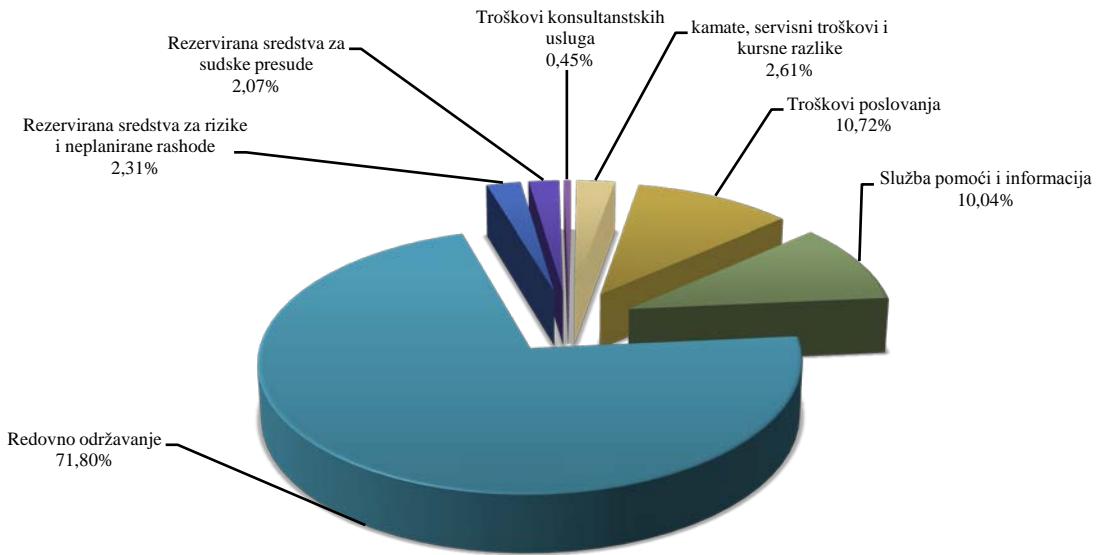

*Grafički prikaz strukture rashoda*

## B.II TROŠKOVI AMORTIZACIJE


Naziv	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.-31.12.2017.
Amortizacija stalnih sredstava	800.000	810.145
<b>UKUPNO</b>	<b>800.000</b>	<b>810.145</b>

Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijjenjenog korisnog vijeka trajanja stalnih sredstava. Amortizacija se odnosi na nematerijalna stalna sredstva, zgradu uprave i administracije, opremu i transportna sredstva.

### C. INVESTICIJE

Red Br.	O P I S	Realizovano 01.01.- 31.12.2016	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Nabavka stalnih sredstava</b>	<b>387.917</b>	<b>616.000</b>	<b>129.953</b>	<b>21</b>	<b>34</b>
<b>2.</b>	<b>Program "Modernizacija cesta u F BiH"</b>	<b>-</b>	<b>4.555.600</b>	<b>3.260.377</b>	<b>72</b>	<b>-</b>
	2.1 Program "Modernizacija cesta u F BiH"- vlastita sredstva	-	50.000	-	-	-
	2.2 Program "Modernizacija cesta u F BiH"- kreditna sredstva	-	4.505.600	3.260.377	72	-
<b>3.</b>	<b>Projekti JP Ceste F BiH</b>	<b>10.920.522</b>	<b>14.694.200</b>	<b>6.347.206</b>	<b>43</b>	<b>58</b>
	<b>3.1. Projekti iz prethodnog perioda</b>	<b>4.100.489</b>	<b>7.801.700</b>	<b>5.151.750</b>	<b>66</b>	<b>126</b>
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	1.602.390	1.204.100	949.550	79	59
	3.1.2. Rasvjeta I semaforizacija raskrsnica i tunela	47.284	14.000	7.603	54	16
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	885.767	5.033.700	3.029.292	60	342
	3.1.4. Vanredno održavanje	<b>1.565.048</b>	<b>1.549.900</b>	<b>1.165.335</b>	<b>75</b>	<b>74</b>
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	1.056.238	625.900	241.548	39	23
	3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	501.849	924.000	923.787	100	184
	3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	6.961	-	-	-	-
	<b>3.2. Planirani projekti u 2017.godini</b>	<b>6.820.033</b>	<b>6.892.500</b>	<b>1.195.456</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije I izgradnje	809.663	1.385.300	191.684	14	24
	3.2.2. Rasvjeta I semaforizacija raskrsnica	3.510	24.600	19.246	78	548
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	2.530.706	2.695.300	129.518	5	5
	3.2.4. Vanredno održavanje	<b>3.476.154</b>	<b>2.785.500</b>	<b>855.008</b>	<b>31</b>	<b>25</b>
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	609.861	1.604.300	297.509	19	49
	3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	2.283.504	316.700	271.881	86	12
	3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina I zasjeka	582.789	864.500	285.618	33	49
<b>4.</b>	<b>Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije</b>		<b>2.257.200</b>	<b>1.268.469</b>	<b>56</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Projekti iz Progr. utroška invest. sred. Budžeta F BiH i GSM</b>	<b>1.158.484</b>	<b>132.000</b>	<b>52.184</b>	<b>40</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>Donacije i sufinsaniranje</b>		<b>-</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.459.959</b>	<b>100</b>
	<b>U K U P N O</b>	<b>12.466.923</b>	<b>29.695.000</b>	<b>18.518.148</b>	<b>62</b>	<b>149</b>

Investicije su realizovane u iznosu od 18,52 mil.KM, što je 62% od planiranih 29,70 mil.KM. Odstupanja od planiranih i ostvarenih vrijednosti su nastala zbog kasno usvojenog Rebalansa , jer Vlada F BiH je donijela Zaključak V broj:1239/2017. kojim zadužuje JP Ceste F BiH da pripremi Rebalans. Tokom godine preuzeti su okončani projekti vrijednosti 7,46 mil.KM, implementirani putem općina i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i sufinsanirani sa JP Ceste F BiH. Za projekte, eksproprijaciju i stalna JP Ceste F BiH su realizovale sredstva vrijednosti 7,75 mil.KM. Krajem godine započeta je implementacija „Programa Modernizacija cesta u F BiH“ od čega je realizovano 3,26 mil.KM, uz saglasnost kreditora, za okončane situacije vezane za projekt Izgradnja tunela Karaula, dionica: Potpaklenik-Kladanj.

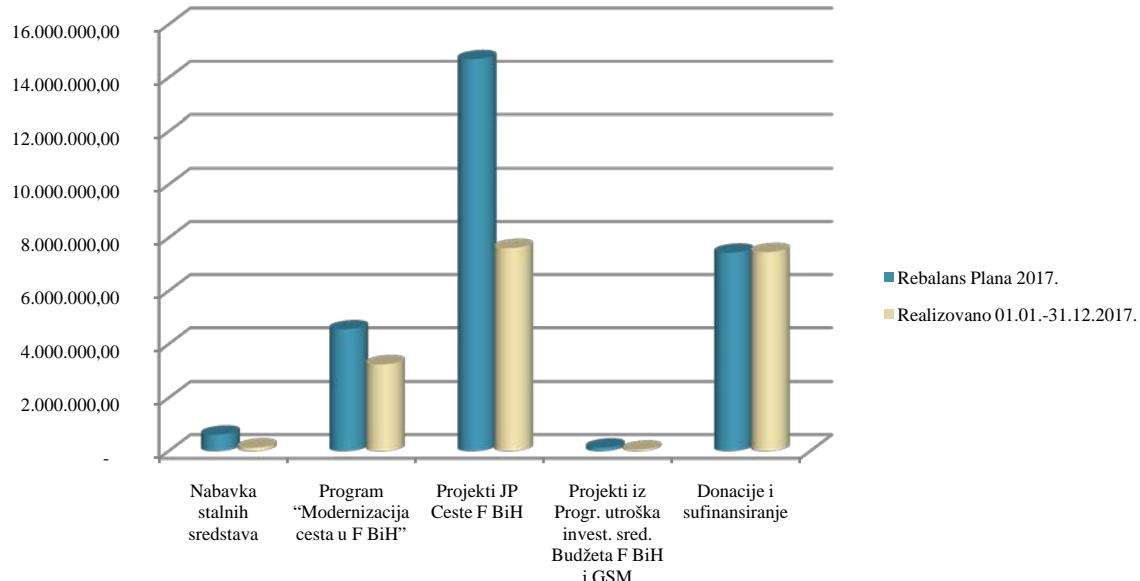

Grafički prikaz visine planiranih i realizovanih investicija

## 1.Nabavka stalnih sredstava

Red. Br.	O P I S	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 1.1.-31.12.2017.
1.	Automatski brojači prometa	80.000	6.260
2.	Automobili	60.000	-
3.	Računarska oprema	42.000	31.074
4.	Nadogradnja sistema gospodarenja cestama Nastavak informatizacije poslovnog procesa – GIS-a i INFO soft	126.000	30.241
5.	Nabavka lifta	95.000	45.630
6.	Digitalni protokol – Sistem za upravljanje dokumentima	200.000	7.020
7.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	13.000	9.728
<b>U K U P N O</b>		<b>616.000</b>	<b>129.953</b>

- Rb.1 Sa Delingom d.o.o Tuzla je potpisana 30.12.2016. ugovor 01-02.1-11587/16. za nabavku 10 kompleta metalnih ormarića sa postoljem vrijednosti 0,006 mil.KM. Ugovor je realizovan u izvještajnom periodu. MHM - Projekt d.o.o.Brčko je dobavljač, na osnovu ugovora broj: 01-02.1-11057/17. od 12.12.2017. 15 automatskih brojača prometa ukupne vrijednosti 0,08 mil.KM, koji će biti realizovan u narednom periodu.
- Rb.2 Planirana je nabavka dva automobila za nadzorne organe, koja nije realizovana u izvještajnom periodu, te se ista prebacuje u narednu godinu.

- Rb.3 Nabavljena je računarska i uredska oprema vrijednosti 0,024 mil.KM. Lampa Studio d.o.o.Sarajevo dobavljač je softvera za upravljanje sadržaja na web stranici, na osnovu ugovora broj: 01-02.5-2722/17 od 30.03.2017. na iznos od 0,007 mil.KM.
- Rb.4 Pristupilo se nastavku informacionog poslovnog procesa GIS-a, gdje Zeljko d.o.o. Jablanica uradio nadogradnju sistema za upravljanje prijavama o stanju na cestama, na osnovu ugovora 01-02.5-432/17. od 18.01.2017. vrijednosti 0,01 mil.KM.  
Infosoft d.o.o. Sarajevo je dobavljač, na osnovu ugovora 01-03.1-1832/17 od 07.03.2017. 0,002 mil.KM, softverskog proizvoda IMIS-modula upravljanja zalihamu robno-materijalno (posipna so).  
Studio ARS d.o.o. Matulji isporučio je softversko rješenje Plateia Ultimate 4D vrijednosti 0,015 mil.KM.
- Rb.5 Europolst d.o.o. Gračanica je izvršio demontažu starog i ugradnju novog lifta u poslovnoj zgradi. Vrijednost ugovora broj: 01-03.1-7931/17, 31.08.2017. od 0,05 mil.KM.
- Rb.6 Započete su aktivnosti na uvođenju digitalnog protokola, te je King Ict d.o.o. Sarajevo uradio usluge snimanja postojećeg stanja organizacije, analize radnih procesa kao i izradu dokumenta plana implementacije sistema za upravljanje dokumentima, a sve na osnovu ugovora 01-02.5-9748/17 od 03.11.2017, vrijednosti 0,007 mil.KM.
- Rb.7 Od drugih nabavki, značajno je spomenuti nabavku kamera u svrhu vanjske i unutrašnje zaštite poslovne zgrade, te sigurnosnih ormara.

## 2. Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama Program „Modernizacija cesta u FBiH“

Program „Modernizacija cesta u FBiH“, čija realizacija je planirana u četverogodišnjem periodu počev od 2018 godine, obuhvata radove na poboljšanju cestovne infrastrukture (cesta, mostova i tunela) i poboljšanja sigurnosti prometa, mjere za poboljšanje upravljanja cestovnom mrežom i konsultantske usluge za upravljanje Projektom i implementaciju.

Program „Modernizacija cesta u FBiH“ finansira se najvećim dijelom iz dugoročnih međunarodnih kredita, a dijelom i učešćem JP Ceste FBiH (troškovi eksproprijacije i PDV). Finansijski plan, zasnovan na odobrenim iznosima kredita, za podršku programu „Modernizacija cesta u FBiH“ prikazan je u niže navedenoj tabeli:

Izvor finansiranja	mil.€
Kredit Evropske investicijske banke (EIB)	50,00
Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	65,00
Kredit Svjetske banke (WB) –Medunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	58,00
<b>U K U P N O</b>	<b>173,00</b>

U fokusu dijela projekta koji zajednički finansiraju EIB i Svjetska banka-IBRD su radovi na izgradnji-poboljšanju elemenata u postojećem koridoru Stolac – Neum, kao i srednja-manja

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

investiciona ulaganja (izgradnja traka za spora vozila, rekonstrukcija/sanacija cestovnih objekata – mostovi, tuneli, rekonstrukciju crnih tačaka i opasnih mjesta na magistralnim cestama). Pored radova zajedničko finansiranje obuhvata i konsultantske usluge nadzora nad izvođenjem radova i monitoring okolišnih i socijalnih uticaja, usluge vanjske kontrole, monitoring tunela Crnaja. Poboljšanje upravljanja cestovnom mrežom u FBiH, kao komponenta Programa, sa posebnim fokusom na poboljšanje finansijske održivosti investicija, povećanje otpornosti cestovne mreže na klimatske promjene i povećanje sigurnosti prometa finansiraće se u cijelosti iz kredita IBRD.

Pored učešća EIB u zajedničkom finansiranju sa IBRD u iznosu 33,00 mil.EUR, EIB će samostalno finansirati radove na izgradnji–poboljšanju elemenata u postojećem koridoru na dionici Kladanj-Podpaklenik preko prevoja Karaula, te konsultantske usluge tehničke pomoći u implementaciji Programa.

Kredit EBRD namjenjen je za finansiranje radova na izgradnji-poboljšanju elemenata u postojećem koridoru (južna obilaznica Mostara-dovršetak dionice Medine-Miljkovići i izgradnju Miljkovići - Rodoč-veza M17 I faza, Bihać-Bosanska Krupa I faza izgradnja dionice Jablanska ulica-čvor Mali Lug, izgradnju ceste koja se vezuje na planiranu obilaznicu Bihaća I faza dionica Izačić-Kamenica), rekonstrukcije cestovnih objekata (16 mostova i 1 tunel), rekonstrukcije ceste M-5 Kaonik - Gromiljak, otklanjanje šteta od poplava sa istovremenom modernizacijom odabranih dionica, izgradnju određenog broja obilaznica (obilaznica Bugojno, dovršetak izgradnje obilaznice Novi Travnik, obilaznica Bugojno, sjeverna obilaznica Grude, obilaznica Donji Vakuf) i za konsultantske usluge (nadzor nad izvođenjem radova, vanjsku kontrolu).

### **2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora**

U niže navedenoj tabeli dat je pregled realizacije u 2017, po projektima:

Red br.	Mag. Cesta	DIONICA	Dužina radova km	Rebalans plana 2017.	Aktivnosti na projektu	Izvođač/konsultant	Ugovoren	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.		
<b>1. Izgradnja cesta- Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru</b>										
1.2	M-18	Šički Brod –Sarajevo, dionica Kladanj- Podpaklenik preko prevoja Karaula, izgradnja trase i objekata (2 mosta)	4,45	200.000						
		Šički Brod –Sarajevo, dionica Kladanj- Podpaklenik Izgradnja tunela Karaula		62.000	Izvođenje	Strabag AG Austrija, 01-02.3-4109/14, 14.04.2014.	24.257.083 (Okončan ugovor u 2017.)	3.169.155		
EIB										
				Izvođenje	-	-	-	<b>3.169.155</b>		
				Nadzor	JV: Roughon internacional Ltd& Ipsa institut Sarajevo i Geotehnički studio, 01-02.3-4110/14, 14.04.2014.anex 01-02.3-9392/16.	914.718 453.090 Okončan ugovor u 2017.)	914.718 453.090 Okončan ugovor u 2017.)	60.248		
				Kon.usl.-vanj.kon	-	-	-	-		

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:

1.1	M - 17.3	Stolac- Neum, dionica Stari Neum-Kišev-Broćanac	11,74	1.000.000	Izvođenje	-	-	-
				108.000	Nadzor	-	-	-
				30.000	Konsult.-vanjska kontrola	-	-	-
	M17	Sanacija tunela Crnaja (T17-012-2) dionica Konjic-Jablanica 1, km 15+082		Izvođenje-ugradnja inklinometara i monitoring	Geosonda d.o.o. Zenica, BA/FBIH/FRSMP /NCB/47/W/17. 27.12.2017.	164.731		-
<b>EIB +WB</b>				<b>Izvođenje</b>	-	-	-	-
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>Nadzor</b>	-	-	-	-
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>Kon.usluge monitoring (WB)</b>	-	-	-	-
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>Kon.usl.-vanj.kon</b>	-	-	-	-
				<b>Izvođenje</b>	-	-	-	<b>3.169.155</b>
				<b>Nadzor</b>	-	-	-	<b>60.248</b>
				<b>Kons. Uslug.mon</b>	-	-	-	-
				<b>Kon.usl.-vanj.kon</b>	-	-	-	-

Napomena: Iskazani iznosi su bez PDV-a.

U skladu sa procedurom nabavke EIB provedena je nabavka radova i konsultantskih usluga Inžinjera na izgradnji tunela Karaula na M-18 i u aprilu 2014 zaključeni su Ugovori za radove sa STRABAG AG (ugovorena cijena 24,26 mil.KM) i za usluge Inžinjera (ugovorena cijena do 0,91mil.KM). Finansiranje projekta izgradnja tunela Karaula na M-18 planirano je iz vlastitih sredstava FBiH (GSM licenca) i kredita EIB u okviru Programa "Modernizacija cesta u FBIH". Implementacija projekta započeta je vlastitim sredstvima Federacije BIH, međutim zbog dugotrajne procedure vezano za potpisivanje ugovora o finansiranju za EIB, te parlamentarne procedure odobrenja Ugovora dio situacija za radove i nadzor, finansiran je iz vlastitih sredstava JP Ceste FBIH da ne bi došlo do zastoja na projektu. Ukupna realizacija za 2017 godinu iznosi 3,23 mil.KM (radovi 3,17 mil.KM, usluge Inžinjera 0,60 mil.KM). Nakon povlačenja prve tranše kredita EIB krajem oktobra 2017 godine izvršena je refundacija plaćenih situacija za radove i nadzor iz sredstava JP Ceste FBIH u ukupnom iznosu 2,99 mil.KM (radovi 2,64 mil.KM i nadzor 0,35 mil.KM).

### 2.2 Konsultantske usluge

Red. Br.	Opis	Rebalans Plana 2017.	Izvodač/konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	34.000	Roughton International Ltd.UK (BA/FBH/RMP/QCBS/05/CS/17. 01-02-3-8736/17. 28.09.2017.)	463.767	30.974	Finansiranje 100% EIB
<b>U K U P N O</b>		<b>34.000</b>			<b>30.974</b>	

Primarni cilj konsultantskih usluga tehničke pomoći pri implementaciji Projekta je pružanje stručnih savjeta i pomoći Timu za implementaciju i upravljanje Projektom u upravljanju, administraciji i praćenju ugovora (uključujući tehničke, pravne, okolinske i socijalne aspekte) u cilju osiguranja implementacije projekata u skladu sa ugovornim uslovima i tehničkim opisima, te u predviđenom vremenskom okviru i budžetu.

### Kamate i provizija na međunarodne kredite

Red. Br.	Naziv i opis projekta	Rebalans Plana 2017.	Napomena
1.	Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBIH“ EIB, EBRD, WB	50.000	Vlastita sredstva (u rashodima)
2.	Jednokratna provizija	283.600	U skladu sa Ugovorom o zajmu plativo iz kredita WB (u rashodima)
	<b>UKUPNO</b>	<b>333.600</b>	

### Revolving sredstva za PDV

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, PDV obračunat i isplaćen za izvršene radove i usluge koji se finansiraju iz međunarodnih ugovora je povratni PDV. Plaćanje PDV ne može se vršiti iz međunarodnih kredita, nego se ista trebaju osigurati kao vlastito učešće Federacije BiH. Zbog vremenske neusklađenosti isplata za PDV i priliva sredstava po osnovu povrata PDV neophodno je određeni iznos sredstava JP Ceste F BiH osigurati kao revolving sredstva za izmirenje obaveza po osnovu PDV.

### REKAPITULACIJA PLANIRANIH ULAGANJA ZA PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBIH“

Red. br.	OPIS	Rebalans Plana 2017.					Realizovano 01.01.-31.12.2017.			
		EIB	EIB+WB	EBRD	WB	UKUPNO	EIB	EIB+WB	EBRD	UKUPNO
I	<b>Radovi</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	-	-	<b>1.200.000</b>	<b>3.169.155</b>	-	-	<b>3.169.155</b>
1.	Troškovi nadzora	62.000	108.000	-	-	170.000	60.248	-	-	60.248
2.	Vanjska kontrola	-	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-
3.	Monitoring tunela Crnaja	-	-	-	98.000	98.000	-	-	-	-
4.	Tehnička pomoć	34.000	-	-	-	34.000	30.974	-	-	30.974
II	<b>Konsult. usl. – ukupno</b>	<b>96.000</b>	<b>138.000</b>	-	<b>98.000</b>	<b>332.000</b>	<b>60.248</b>	-	-	<b>91.222</b>
III	<b>Robe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	<b>SVEUKUPNO (I+II+III)</b>	<b>296.000</b>	<b>1.138.000</b>	-	<b>98.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>3.229.403</b>	-	-	<b>3.260.377</b>

### 3. Projekti JP Ceste F BiH

#### 3.1. Projekti iz prethodnog perioda

##### 3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvodač/Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2017.	Napomena
1.	M14.1	Obilaznica Odžak Izrada glavnog projekta tzv. "sjeverne veze"	Projektovanje	18.500	INK Constructor d.o.o.Banja Luka, 01-02.1-9886/15, 24.11.2015.	18.559	18.559	Okončano
			Revizija	4.200	Trafficcon d.o.o. Odžak, 01-02.1-10937/15-GK, 30.12.2015.	6.318 (preneseno 4.118)	4.118	
			<b>Ukupno</b>				<b>22.677</b>	
2.	M5	Ažuriranje glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf	Projektovanje	92.200	JV Geoput d.o.o. Banja luka i INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-5797/16, 01.07.2016. Anex 01-02.1-8333/17. 13.09.2017.	79.525 12.636	7.020	U toku*
			Revizija	2.100	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-8903/16, 05.10.2016.	2.106	-	
			Ostalo		taksa	330	330	
			<b>Ukupno</b>				<b>7.350</b>	
3.	M6.1	Obilaznica Mostara: Gl.projekat tunela na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M17 (tunel „Novi“ cca 900 m i tunel „Privorac“ cca 170 m)	Projektovanje	44.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-2091/16, 26.02.2016.	296.831 (preneseno 43.547)	31.882	Okončano**
			Revizija	12.500	Grupa ponuđača: IGH d.o.o. Mostar, Divel d.o.o.Sarajevo, GF Sveučilišta u Mostaru, Grad.istraživački centar d.o.o.Mostar, 01-02.1-5514/16, 23.06.2016.	24.804 (preneseno 12.402)	12.403	
			Ostalo		Takse, saglasnosti	297	297	
			<b>Ukupno</b>				<b>44.582</b>	
4.	M5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste na potezu Skela (tunel i cesta), L=cca 1km	Projektovanje	57.000	Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-1406/17, 17.02.2017.	56.780	45.133	Popravke po reviziji u toku
			Revizija	5.600	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-4018/17, 05.05.2017.	5.616	2.808	
			<b>Ukupno</b>				<b>47.941</b>	
5.	M14	Obilaznica Bihaća: Glavni projekat za dionicu: Jablanska ulica-čvor Mali Lug-veza na M14	Projektovanje	74.500	Institut za građevinsrštvo IG Banja luka, 01-02.1-4677/16. 01.06.2016.	61.686 (preneseno 56.033)	55.846	U toku je tenderska procedura za dodatne usluge**
			Revizija	4.500	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7451/16, 24.08.2016.	4.446		
			Ostalo		Vizualizacija taksa	2.846 330	3.176	
			<b>Ukupno</b>				<b>59.022</b>	
6.	M5	Rekonstrukcija ceste M5 Dionica: Kaonik -Gromiljak, potez Jelovac-Brestovsko	Projektovanje	5.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7246/17. 10.08.2017.	4.914	<b>4.914</b>	Okončano
7.	M6.1	Obilaznica Mostara: -Gl.projekat mostova na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M17 - potputnjak „Varda“, prolaz 5x8m i vijadukt „Marjanovića Draga“	Projektiranje	26.000	GP: Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i INK Constructor d.o.o Banja luka, 01-02.1-5963/16, 11.07.2016.	139.955 (preneseno 27.990)	25.934	Okončano

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele 3.1.1.:

			Revizija	1.200	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.16766/16, 02.08.2016.	5.616 (preneseno 1.124)	1.124	
			<b>Ukupno</b>				<b>27.058</b>	
8.	M 5	Izgradnja traka za spora vozila, Dionica Ripač – Vrtoče 2, poddionica Ripač – Dubovsko	Deminiranje	92.000	N&Nivša d.o.o Oraše 01-02.2-2663/17, 28.03.2017.	91.413	91.413	Okončano deminiranje
			Ostalo		saglasnost	1.247	1.247	
			<b>Ukupno</b>				<b>92.660</b>	
9.	M5	Dionica Gromiljak-Blažuj, Poddionica Han Ploča-Šamini Gaj (Kobiljača)	Projektiranje	29.200	Divel d.o.o.Sarajevo 01-02.1-8753/16, 30.09.2016.	49.082 (preneseno 29.145)	29.145	Okončano, revizija nije fakturisana
			Revizija	5.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11588/16 30.12.2016	4.914	2.457	
			<b>Ukupno</b>				<b>31.602</b>	
10.	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1	Projektiranje	165.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-387/17, 17.01.2017.	165.124	90.590	U toku
			Revizija	4.600	Gradevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6428/17, 11.07.2017.	4.558	2.279	
			<b>Ukupno</b>				<b>92.869</b>	
11.	M-15	Obilaznica Livna (veza M-15 i M-6.1) Glavni projekat, L=cca 3km	Projektiranje	84.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-387/17, 17.01.2017.	83.994	83.994	Okončano, revizija nije fakturisana
			Revizija	4.600	Gradevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6428/17, 11.07.2017.	4.558	2.279	
			<b>Ukupno</b>				<b>86.273</b>	
12.	M-6	Sjeverna obilaznica Gruda (veza M-6 i R- 420) Glavni projekat trase, L=cca 2,7 km	Projektiranje	45.200	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8753/16, 30.09.2016. Anex 01-02.1-10501/17. 22.11.2017.	44.870 (preneseno 29.836) 15.210	45.045	Okončano
			Revizija	5.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-10201/16, 15.11.2016.	4.973	4.972	
			<b>Ukupno</b>				<b>50.017</b>	
13.	M4.2	Obilaznica Cazina Ažuriranje – Izmjena glavnog projekta trase	Projektiranje	250.000	Divel d.o.o Sarajevo, 01-02.1-4773/17. 25.05.2017.	249.217	249.217	Okončano, revizija nije fakturisana
			Revizija	4.600	Gradevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6428/17, 11.07.2017.	4.558	4.103	
			Ostalo		Saglasnosti, takse vizualizacija	970 2.846	3.816	
14.	M5	Obilaznica Kiseljaka L=cca 2km Idejni projekt, studija izvodljivosti i studija uticaja na okoliš	Projektiranje	24.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8753/16, 30.09.2016. Anex 01-02.1-10501/17. 22.11.2017.	31.239 (preneseno 16.947) 6.874	-	U toku
			Projektovanje	21.000	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 1-02.1-1656/17, 28.02.2017.	20.826	20.826	
			Revizija	4.600	Gradevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6428/17, 11.07.2017.	4.559	4.558	
15.	N	Glavni projekt Zapadne obilaznice Ljubuškog, L=1,7km	<b>Ukupno</b>				<b>25.384</b>	Okončano

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele 3.1.1.:

16.	M-20	Obilaznica Goražda (Glavni projekti sanacije klizišta na trasi obilaznice) -glavni projekti -Studija utjecaja na okoliš	Projektovanje	46.000	JV Desing&QC d.o.o.Sarajevo i Sendo d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1951/17. 09.03.2017.	45.630	36.270	U toku
			Revizija	4.600	Gradevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6428/17, 11.07.2017.	4.559	4.558	
			<b>Ukupno</b>				<b>40.828</b>	
17.	M-5	Obilaznica Bihaća-Studija utjecaja na okoliš	Ostalo		Taksa	330	<b>20.351</b>	U toku
			Konsult.usluge	25.000	JV ENOVA d.o.o. Sarajevo i ECOPLAN d.o.o. Mostar, 01-02.1-1831/17, 07.03.2017.	25.026		
18.	M-5 M-16	Obilaznica Donji Vakuf-Studija utjecaja na okoliš	Konsult.usluge	17.000		16.684	<b>13.347</b>	U toku
19.		Izrada Studija izvodljivosti i Studija uticaja na okoliš za nove projekte iz Programa „Modernizacija cesta u FBiH“ po Zaključku Vlade F BiH	Konsult.usluge	-			-	
20.	M-18	Izgradnja trake za spora vozila, dionica Priboj 2 – Simin Han1, L=cca 2 km	Projektovanje	2.700	Institut za gradjevinarstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-3906/16, 12.05.2016.	13.239 (preneseno 2.648)	2.648	Izrada elaborata zaštite od požara u toku, ostalo Okončano
			Revizija	2.900	Gradevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6003/16, 11.07.2016.	2.900	2.900	
			Prevodenje	900	Institut za grad.IG d.o.o.Banja luka, 01-01.1-5780/17, 20.06.2017.	848	848	
			Konsult usluge	Elaborat zaštite	ZT Tehnozaštita d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11497/17. 28.12.2017.	936	-	
			Ostalo		Saglasnost	300	300	
			<b>Ukupno</b>				<b>6.696</b>	
21.		Glavni projekat nastavka izgradnje Obilaznice Velika Kladuša, L= 2,0 km	Projektovanje	5.400	Institut za gradjevinarstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-869/15, 02.02.2015.	18.357 (preneseno 7.325)	<b>5.371</b>	Okončano
22.		Izrada Studije kategorizacije cesta u F BiH	Konsult.usluge	10.000	Ugovor o djelu 01-11583-1, 30.12.2016 01-11582-2, 30.12.2016	4.981 4.981	<b>9.962</b>	Okončano
23.	M-18	Projekt izgradnje traka za spora vozila dionica: Olovno-Semizovac, poddionica: Ćevljanići-Nišići	Revizija	3.500	Desing&GC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9594/15. 13.11.2015.	3.510	<b>3.510</b>	Okončano
				<b>1.204.100</b>			<b>949.550</b>	

\* Red. br. 2.- Anex-om je ugovorena izrada Elaborata hidrauličko-hidroloških analiza za potrebe izrade ovog projekta, zbog različitih podataka za kotu 100-godišnjih voda, dobijenih od Agencije za vodno područje rijeke Save. Na temelju Urađenog Elaborata pribavljenja je prethodna vodna saglasnost (17.01.2018. godine) nakon čega se moglo pristupiti daljim aktivnostima na projektu.

\*\* Red. br. 3.- Ugovoreno 296.831 KM, a varijacijom smanjeno na 285.166 KM, izveden manji obim istražnih radova u odnosu na zadani projektnim zadatkom.

\*\*\*Red.br. 5.- Racionalizacijom rješenja izbjegći će se rušenje objekata koji se nalaze na trasi (po ranije urađenom idejnom projektu), dovesti do značajnih ušteda u troškovima građenja i eksproprijacije, te skratiti i pojednostaviti realizaciju projekta.

**3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica**

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvođač/Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2017.	Napomena
1.	M-16 006	Sanacija semafora u Jajcu	Izvođenje	7.000	Step d.d. Sarajevo, 01-02-2-11355/17. 21.12.2017.	7.013	-	U toku
2.	M-4.2	Sanacija semafora u Cazinu	Izvođenje	7.000	Step d.d. Sarajevo, 01-02-2-8372/17. 14.09.2017.	6.998	6.998	Okončano
			Ostalo		Saglasnosti	605	605	
			<b>Ukupno</b>				<b>7.603</b>	
		<b>UKUPNO</b>		<b>14.000</b>			<b>7.603</b>	

**3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka**

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvođač/Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2017.	Napomena		
1.		Saglasnosti i takse na projekte	Ostalo	50.000				Okončano		
		Izgradnja ceste Neum Stolac,			Vještačenja, taksa	3.285, 570	3.855			
		Tunel Žaba			Vještačenje	771	771			
		Tunel Oštrovac			Vještačenje, taksa	75.421, 135	75.556			
	M14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002			Notarske usluge	458	458			
		Izgradnja Petlje Šiki brod, Tuzla			Taksa	50	50			
	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice Srebrenik-Šiki brod 1+450			Saglasnost	58	58			
		Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, općina Cazin			Naknada		180			
	M15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok			Vještačenje i taksa	386	386			
	M-6.1	Rekonstrukcija ceste Široki briješ-Mostar, Dobrič, 9+100-10+00			Taksa	350	350			
	M-15	Rekonstrukcija ceste Crnjeni-Zgon			Taksa	120	120			
	M-5	Rekonstrukcija mosta Bila, dionica: Nević Polje-Kaonik			Saglasnost	80	80			
	M18	Rekonst. ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Deljašu, dion. Ustikolina – Trnovo, km 37+257			Taksa	60	60			
					<b>Ukupno</b>		<b>81.924</b>			
2.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok	Izvođenje	287.000	Livnoputovi d.o.o. Livno 01-02-1-10585/15. 16.12.2015	286.407	-	Eksproprijacija u toku		
			Nadzor	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02-1-11589/16, 30.12.2016	6.903				
3.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica: Bihać-Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovica sa rekonstrukcijom/dogradnjom mosta preko rijeke Une, km7+830	Izvođenje	784.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02-2-5967/16, 11.07.2016.	30.946	-			
			Nadzor	31.000						

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele 3.1.3.:

4.	M-17 006	Ozimica – Nemila 0, izgradnja podhodnika Zenički put	Izvođenje	113.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-10178/16, 15.11.2016.	235.968 (preneseno 112.917)	112.915	Okončano
			Nadzor	7.400	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.625 (preneseno 7.313)	7.313	
			<b>Ukupno</b>				<b>120.228</b>	
5.	M-15 003	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i R405	Izvođenje	266.500	Divel d.o.o. Sanski most, 01-02.2-962/17, 03.02.2017. Anex 01-02.2-9434/2017, 23.10.2017.	262.056 4.259	266.294	Okončano
			Nadzor	14.300	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.274	14.274	
			<b>Ukupno</b>				<b>280.568</b>	
6.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice M6 i R425a u naselju Trebižat (spoj na AC) općina Čapljina	Izvođenje	327.500	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-9966/16, 08.11.2016.	401.429 (preneseno 330.218)	327.509	Okončano
			Nadzor	4.100	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-9989/16, 08.11.2016.	5.031 (preneseno 4.139)	4.139	
			Ostalo	4.100	Vještacanje saglasnosti	3.913 1.052	4.965	
7.	M-18 010	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18 u kružne tokove, ( prolaz kroz Vogošću)	<b>Ukupno</b>				<b>336.613</b>	
			Revizija	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-01.1-361-1/17, 21.04.2017.	7.000	7.000	Okončano
			Ostalo		taksa		25	
8.	M-18 010	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M17, 008, km 7+350	<b>Ukupno</b>				<b>7.025</b>	
			Projektovanje	5.100	Ipsa institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16. 22.06.2016.	12.724 (preneseno 5.090)	5.089	Okončano
			Revizija	3.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-3609/17, 21.04.2017.	2.925	2.925	
9.	M-6 004	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, M6, 004, km 3+950 – km 4+600 I faza	<b>Ukupno</b>				<b>8.014</b>	
			Izvođenje	149.000	GPI d.o.o. Konjic, 01-02.2-11364/16, 21.12.2016.	148.913	148.913	Okončano
			Nadzor	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar 01-02.2-10482/16, 24.11.2016	6.921	6.920	
10.	M-18 007	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M18_007, km 0+000	<b>Ukupno</b>				<b>155.833</b>	
			Izvođenje	209.500	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-8894/16, 04.10.2016.	212.889	209.446	Okončano
			Nadzor	15.400	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	15.327	15.327	
			<b>Ukupno</b>				<b>224.773</b>	

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele 3.1.3.:

			Izvođenje	306.000	Konzorcij: Babić d.o.o. Jablanica i Bosman d.o.o. Sarajevo 01-02.2-890/17, 01.02.2017.	306.123	266.231	
11.	M-17	Izgradnja pješačke staze ulaz u Mostar (Vrapčići – Zalik)	Nadzor	15.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.625	14.625	Okončano
			<b>Ukupno</b>				<b>280.856</b>	
			Izvođenje	266.600				
12.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Viteza	Nadzor	15.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.625	-	
			<b>Ukupno</b>					
13.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak	Izvođenje	240.000	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-10404/16, 22.11.2016.	239.547		U toku
			Nadzor	17.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.731		
			<b>Ukupno</b>					
14.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok u Jelahu	Projektovanje	4.500	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	12.724 (preneseno 4.454)	4.453	Okončano
			Revizija	2.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-3499/17, 19.04.2017.	1.930	1.930	
			<b>Ukupno</b>				<b>6.383</b>	
15.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Ružići, općina Grude	Izvođenje	241.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-8441/16, 20.09.2016. Anex 01-02.2-4149/17.09.05.2017.	258.569 (preneseno 194.034)	240.971	Okončano
			Nadzor	4.400	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.2-8967/16, 06.10.2016.	5.792 (preneseno 4.346)	4.346	
			<b>Ukupno</b>				<b>245.317</b>	
			Projektovanje	7.300	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16. 22.06.2016.	18.318 (preneseno 7.327)	7.327	
16.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica	Revizija	1.200			-	U toku rješavanje imovinskih odnosa i sufinansiranje izmještanja spomenika sa općinom Dobojski Istok
			Izvođenje	291.000*			-	
			Nadzor	16.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.029	-	
			Ostalo		saglasnost	505	505	
			<b>Ukupno</b>				<b>7.832</b>	
			Izvođenje	200.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.1-11437/16, 23.12.2016.	198.777	198.694	
17.	M-4 012	Izgradnja pješačke staze, dionica 012 Simin Han 1 – Donje Caparde od km 9+495 do km 10+635 u mjestu Rainci u dužini 1.1km	Nadzor	6.500	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.-11319/16, 20.12.2016.	6.500	6.500	Okončano
			<b>Ukupno</b>				<b>205.194</b>	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele 3.1.3.:

18.	M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica: Kolo-Posušje,	Izvođenje	152.000	KTM-Brina d.o.o. Posušje, 01-02.1-8189/16, 13.09.2016.	372.073 (preneseno 152.163)	151.884	Okončano
			Nadzor	3.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-8020/16, 07.09.2016.	6.786 (preneseno 2.776)	2.776	
			Ostalo		Naknada	1.017	1.017	
			<b>Ukupno</b>				<b>155.677</b>	
19.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M14.1 i saobraćajnice za Industrijsku zonu u općini Gradačac	Izvođenje	100.000	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-8906/16, 05.10.2016	283.560 (preneseno 99.959)	99.957	Okončano
			Nadzor	2.500	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka,01- 02.2-5967/16, 11.07.2016	16.029 (preneseno 2.486)	2.486	
			<b>Ukupno</b>				<b>102.443</b>	
			<b>Izvođenje</b>	<b>418.000</b>	Dobojputevi d.d. Doboj jug 01-02.2-846/17, 31.01.2017.	<b>417.399</b>	<b>417.399</b>	
20.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice na M17 i saobraćajnice za Industrijsku zonu u općini Maglaj	Nadzor	8.000	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o.Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.029 (preneseno 8.015)	8.015	Okončano
			<b>Ukupno</b>				<b>425.414</b>	
			<b>Izvođenje</b>	<b>208.000</b>	JV Braća Mujić export-import d.o.o. Sarajevo i HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.2-1701/17, 16.02.2017.	<b>207.929</b>	<b>198.488</b>	
			<b>Nadzor</b>	<b>6.500</b>	Aber Desing d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-3985/17, 04.05.2017.	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
21.	M-18	Izgradnja pješačke staze uz M18 dionica010:Vogošća Kobilja Glava-Sarajevo, Donji Hotonj_Gornji Hotonj, L=1km	<b>Ukupno</b>				<b>204.988</b>	Okončano
			<b>Izvođenje</b>	<b>120.500</b>	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-1179/17. 09.02.2017.	<b>122.564</b>	<b>120.427</b>	
			<b>Nadzor</b>	<b>7.000</b>	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.4-11189/16, 6.12.2016.	<b>6.903</b>	<b>6.903</b>	
			<b>Ukupno</b>				<b>127.330</b>	
22.	M-6.1	Izgradnja pješačke staze u naselju Knežpolje, općina Široki Brijeg	<b>Izvođenje</b>	<b>50.000</b>	Ceste-Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-10330/16, 18.11.2016.	<b>91.679</b> (preneseno 49.859)	<b>49.850</b>	Okončano
			<b>Nadzor</b>	<b>3.000</b>	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9756/16, 02.11.2016.	<b>5.909</b> (preneseno 3.001)	<b>3.000</b>	
			<b>Ukupno</b>				<b>52.850</b>	
			<b>Projektovanje</b>	<b>22.800**</b>	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1655/17. 28.02.2017.	<b>22.815</b>	-	
24.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmjешtanjem dijela Ulice Alipašina, općina Centar, Sarajevo	<b>Revizija</b>	<b>7.000</b>		-	-	U toku Projektovanje sufinansira Općina Centar.
			<b>U K U P N O</b>	<b>5.033.700</b>			<b>3.029.262</b>	

### 3.1.4. Vanredno održavanje

#### 3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	M-4	Sanacija tunela Čaklovići (T4-012-1), dionica Simin Han1 – Donje Caparde, km 2+775	Projektiranje	19.500	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2648/16, 18.03.2016.	92.494 (preneseno 19.305)	<b>19.305</b>	Okončano
2.	M-17	Sanacija tunela Crnaja (T17-012-2) dionica Konjic-Jablanica 1, km 15+082	Projektiranje	79.000	Divel d.o.o i Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4122/16, 19.05.2016.	122.611 (preneseno 78.670)	78.671	Okončano
			Revizija	11.500	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo 01-02.1-611/17, 25.01.2017.	11.349	11.349	
			Prevodenje		Barbados d.o.o. Sarajevo	1.209	1.209	
			Ostalo		Saglasnosti takse	648	648	
			<b>Ukupno</b>				<b>91.877</b>	
3.	M-16.2	Sanacija mosta (M16.2-001-280) preko rijeke Bunte, lokacija Gračanica, Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152	Projektiranje	11.400	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	20.241 (preneseno 11.398)	11.398	Okončano
			Revizija	2.300	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11317/16, 20.12.2016.	2.300	2.300	
			<b>Ukupno</b>				<b>13.698</b>	
4.	M-18	Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dionica Ustikolina – Trnovo, km 37+257	Izvođenje	361.000	HP Investing, d.o.o. Mostar, 01-02.1-11541/16, 29.12.2016.	361.373	-	Zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa nije se pristupilo realizaciji
			Nadzor	5.100	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-1588/17. 27.02.2017.	5.090		
5.	M-5	Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko potoka Bravnicu u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 3+746	Projektovanje	10.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	17.433 (preneseno 9.877)	9.877	Okončano
			Revizija	2.900	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-240/17, 11.01.2017.	2.900	2.900	
			<b>Ukupno</b>				<b>12.777</b>	
6.	M-19.2	Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko potok Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj – Vlasenica, km 9+809	Projektovanje	13.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	22.815 (preneseno 13.036)	13.036	Okončano
			Revizija	3.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11320/16, 20.12.2016.	2.937	2.937	
			<b>Ukupno</b>				<b>15.973</b>	
7.	M-18	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko suhe prepreke u Stanovima (M18-007-86), dionica Živinice 1 – Vitalj, km 25+886	Projektovanje	12.200	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	23.634 (preneseno 11.514)	12.210	Okončano
			Revizija	3.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11320/16, 20.12.2016.	2.936	2.937	
			<b>Ukupno</b>				<b>15.147</b>	
8.	M-18.1	Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko Crne rijeke u Bašćima (M18.1-001-446), dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 42+720	Projektovanje	13.300	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	23.049 (preneseno 13.270)	13.270	Okončano
			Revizija	2.900	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11317/16, 20.12.2016.	2.900	2.900	

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele 3.1.4.1.:

			Ostalo		Taksa	73	73	
			<b>Ukupno</b>				<b>16.243</b>	
9.	M-18	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo-Malta, km 0+048	Projektovanje	12.500	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	23.751 (preneseno 12.470)	-	U toku
			Revizija	3.000	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-11318/16, 20.12.2016.	2.925	-	
10.	M-18	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165), dionica Vitalj – Olovo, km 20+443	Projektovanje	16.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	27.729 (preneseno 15.910)	15.728	Okončano (revizija - nije fakturisano)
			Revizija	3.400	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-11318/16, 20.12.2016.	3.393	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>15.728</b>	
11.	M-5	Sanacija mosta preko potoka Rika (M5_009_214), i rekonstrukcija raskrsnice na lokaciji Skela, dionica: Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 0+894	Projektovanje	19.800	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3459/16, 21.04.2016.	19.773	19.773	Okončano
			Revizija	3.500	GFU Sarajevo, 01-8150/16, 09.09.2016.	3.500	3.500	
			<b>Ukupno</b>				<b>23.273</b>	
12.	M-18	Sanacija mosta preko r. Ljubine (M18-009_386), lokacija Stupe, dionica Olovo-Semizovac, km 27+523	Projektovanje	15.200	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4121/16, 19.05.2016.	15.210	15.210	Okončano
			Revizija	2.400	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5537/16, 24.06.2016.	2.317	2.317	
			<b>Ukupno</b>				<b>17.527</b>	
		<b>U K U P N O</b>		<b>625.900</b>			<b>241.548</b>	

## 3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasječka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvođač/Konsultant	Ugovorenog	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	M-16 009	Sanacija trupa ceste(nasipa) i škarpe zasječka, cesta M-16-009, dionica: Poriče-Kupres, km 11+950 do km 12+350 km, l=400m	Izvođenje	467.000	Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić Grad, 01-02.2-1185/17. 09.02.2017.	466.806	466.770	Okončano
			Nadzor	11.000	Konzorcij:Trasa d.o.o. IGH d.o.o.Mostar Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5535/16, 24.06.2016.	10.989	10.989	
			<b>Ukupno</b>				<b>477.759</b>	
2.	M-17 013	Sanacija slijeganja trupa ceste i škarpe ispod nivelete cesta M-17, dionica: Jablanica – Potoci, km 2+100 do km 2+400	Izvođenje	433.000	Geosonda d.o.o. Zenica, 01-02.2-11549/16, 29.12.2016.	433.024	433.023	Okončano
			Nadzor	13.000	Konzorcij:Trasa d.o.o. IGH d.o.o.Mostar Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5535/16, 24.06.2016.	13.005	13.005	
			<b>Ukupno</b>				<b>446.028</b>	
		<b>U K U P N O</b>		<b>924.000</b>			<b>923.787</b>	

### 3.2.Planirani projekti

#### 3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	NN	Pribavljanje suglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz Programa Modernizacije; Usklađivanje sa Smjernicama i provođenje dokumentacije na engleski jezik	Ostalo Konsult.usluge (Prevodenje, Projektovanje Revizija)	500.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-5492/17. 09.06.2017.	585	585	Okončano
	M-1.8	Sanacija mosta preko V.Tinje, lokacija Špionica Gornja, dionica Pelagićovo-Srebernik, km 18+242			Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-5512/17, 12.06.2017.	2.223	741	
	M-5	Projekt izgradnje traka za spora vozila na M5 dionica Ripač-Dubovsko			Ostalo	803	741	
	M-5	Projekt izgradnje traka za spora vozila na M5 dionica Bos.Petrovac-Kluč-prevoj Lanište			Ostalo	803	741	
	M-18	Projekt izgradnje traka za spora vozila na M18 dionica Živinice 1-Vitalj potok Stupari-Vitalj			Ostalo	803	741	
	M-5	Projekt izgradnje traka za spora vozila na M5 dionica Bos.Petrovac-Kluč-prevoj Lanište			Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-5491/17, 09.06.2017.	2.340	780	
	M-5	Rekonstrukcija crne tačke na M5 granica BiH/RH (Izačić)- Bihać, raskrsnica „Kamenica“			Ostalo	803	780	
	M-17	Rekonstrukcija crne tačke na M17 južni ulaz u Mostar „Gnojnica“			Integra d.o.o. Mostar, 01-01.1-5777/17, 20.06.2017.	1.580	780	
	M-18	Rekonstrukcija crne tačke na M18 Šiški brod- Živinice 1 „Husino“			Saglasnosti	471	780	
	M-14.2	Izgradnja trake za spora vozila dionica: Bosanski Petrovac-Drvar-Resanovići			Integra d.o.o. Mostar, 01-01.1-5777/17, 20.06.2017.	1.580	780	
	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice na M17 i M6 Tasovčići			Saglasnosti	471	780	
	M-18	Projekt izgradnje traka za spora vozila dionica: Olov-Semizovac, poddionica: Čevljanci-Nišići			Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6037/17, 29.06.2017.	796	780	
	M-20	Izrada glavnog projekta rasvjete kružnog toka i podhodnika dionica: Ustikolina-Goražde 8 u Vitkovčima, km 17+800			Saglasnosti	270	780	
	M-20	Izgradnja pješачke staze sa rješavanjem odvodnje Dionica: Ustikolina-Goražde 8, Bacči-Vinarići,km 19+995 - km 21+030			Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5912/17. 23.06.2017.	14.040	14.040	
	M-20	Rekonstrukcija ceste M20 dionica:Goražde 8-Ustiprača km 0+500 do km 2+880 granica FBiH/RS			Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5872/17. 22.06.2017.	730	14.040	
	M-20	Rekonstrukcija ceste M20 dionica:Ustikolina-Goražde 8, km14+200 do 19+000			Arting BH d.o.o.Sarajevo 01-02.2-8997/17. 09.10.2017.	1.755	730	
	M-5	Izgradnja treće trake Tomislavgrad-Široki			Saglasnost	1.974	1.755	
	M-15	Dionica:Kamičak-Ključ, sanacija mosta preko rijeke Banjica			735	1.974	735	
	M-5	Izgradnja treće trake Livno-Šuica			Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5872/17. 22.06.2017.	730	735	
	M-5	Izgradnja traka za spora vozila dionica:010_Donji Vakuf-Turbe (Komar)			730	730	730	
					Institut za grad. IG d.o.o. Banja luka, 01-01.1-5780/17, 20.06.2017.	848	730	
					Naknada	763	848	
					Institut za grad. IG d.o.o. Banja luka, 01-01.1-5780/17, 20.06.2017.	848	763	
					Takse, saglasnosti	848	849	
					Institut za grad. IG d.o.o. Banja luka, 01-01.1-5780/17, 20.06.2017.	849	849	
					Taksa	22	848	
					Trafficcon d.o.o. Odžak, 01-02.2-6211/17, 06.07.2017.	819	22	
					Taksa	100	819	
							100	

**JP CESTE FEDERACIJE BIH**

### Nastavak tabele 3.2.1.:

			Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02-2-6765/17, 25.07.2017.	1.329	1.329			
M-5	Devijacija puta AVNOI-a u Bihaću		Higracor d.o.o.Sarajevo, 01-02-2-11506/17. 28.12.2017.	1.755	-			
M-14	Rekonstrukcija ceste Izačić-Vrkašić-Orljani		Geo Feld d.o.o.Bihać, 01-02-1-6422/13. 25.07.2013.	1.743	1.743			
M-17	Glavni projekt M-17 001 dionica: Tarcin-Konjic,rekonstrukcija crne tačke km 16+800 km 17+600		BH Telecom Elektodist.Bihać	1.130	1.130			
M-20	Sanacija kolovozne konstrukcije i pješačke staze i odvodnje dionica Goražde –Goražde 8-Ustiprača L= 500m		Saglasnost, Vizualizacija	3.296	3.296			
M-19.2	Glavni projekt rekonstrukcije i sanacije M-19.2 dionica 001, Vitalj-Vlasenica, km 6+850 – km 11+670		Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02-2-6764/17, 25.07.2017.	620	620			
M-5	Glavni projekt rekonstrukcije ceste Busovaca-Draga, km 5+200- km 6+050		Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02-2-8670/17. 27.09.2017.	585	585			
M-18	Glavni projekt rekonstrukcije raskrsnice ceste M-18 i R- 468 u mjestu Olovске luke km 20+600		Divel d.o.o. Sarajevo, 01-01-1-8685/17. 27.09.2017.	936	936			
M-4.2	Rekonstrukcije raskrsnice M-4.2, Ul Žrtava domovinakog rata i Ul. 25. Novembar, dionica: Skokovi-Srbljani (Mala Lisa)		Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02-2-9692/17, 01.11.2017.	7.605	-			
M-17	Rekonstrukcija ceste Bulajića krivine km35+800-km36+000		Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02-2-9449/17, 23.10.2017.	500	500			
M-20	Rekonstrukcija mosta na Drini obilaz Goražde		Vještačenje	2.667	2.667			
	Izgradnja novoprojektovane dionice: Potpklenik – Kladanj (tunel Karaula)		Ostalo	830	830			
			ZT Tehnizaštita, 01-01-1-3565/17. 24.04.2017	750	750			
			Saglasnost	300	300			
			Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02-1-10432/16. 23.11.2016.	1.053	1.053			
			Nakande, Takse Vještačenje	4.303	4.303			
		<b>Ukupno</b>			<b>56.588</b>			
2.		Izgradnja Obilaznice Bugojna	Projektiranje	30.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02-1-7262/17. 10.08.2017.	29.998	18.106	U toku
			Revizija	3.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02-1-9740/17. 03.11.2017.	3.042	-	
		<b>Ukupno</b>					<b>18.106</b>	
3.	M-6.1	Obilaznica Mostara, dionica: Miljkovići Rodoč, veza na M-17: Ažuriranje glavnog projekta trase	Projektiranje	50.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02-1-6218/17, 06.07.2017.	49.608	49.608	Okončano
			Revizija	4.500	Ecoplan d.o.o. Mostar, 01-02-1-6623/17, 18.07.2017.	4.446	4.446	
			ostalo		Vještačenje i Vizualizacija	3.380	3.380	
		<b>Ukupno</b>					<b>57.434</b>	
4.	M-4.2	Obilaznica Cazin Glavni projekti objekata	Projektiranje	160.000			-	Tender u toku
			Revizija	16.000				
5.	M-5	Obilaznica Kiseljaka Glavni projekt trase i mosta preko rijeke Lepenice	Projektiranje	50.000			-	Čeka okončanje idejnog projekta
			Revizija	5.000				
6.	M-6	Sjeverna obilaznica Gruda Glavni projekt objekata ( 2 vijadukta – cca 65 m i cca 50 m i 1 potputnjak l=cca 8 m )	Projektiranje	80.000			-	Tender u toku
			Revizija	8.000				
7.	M-5	Obilaznica Donji Vakuf Gl. Projekt rekonstrukcije mosta preko Oborackog potoka (u raskrsnicu)	Projektiranje	20.000			-	Čeka se prethodna vodna saglasnost
			Revizija	2.500				
8.	M-5	Devijacija puta Avnoja-ažuriranje (izmjene glavnog projekta) rekonstrukcije ceste M-5, dionica:Bihać-Ripač	Revizija	-			-	

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele 3.2.1.:

9.	M-17.3	Izrada idejnog rješenja Obilaznice Stoca,	Projektovanje	15.000			-	Tender u toku
10.	M-5	Izrada Idejnog rješenja, i prethodne procjene uticaja na okoliš izgradnje ceste M-5, dionica Čvor Mali Lug – Gorjevac (nastavak Obilaznice Bihaća) L=cca 15km	Projektiranje	-			-	
11.	M-4.2	Izrada glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca14km	Konsult.usl.	4.000			-	
			Projektiranje	130.000				
12.	M-5	Ažuriranje glavnog projekta Obilaznice Bihaća, dionica Petlja Kamenica – Raskrsnica Jablanska L=5km	Projektiranje	-			-	
			Revizija	-			-	
13.	M-14.1	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša-Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21	Projektiranje	54.000				
			Revizija	8.000				
			Ostalo		Vizualizacija, ugovor o djelu, 01-6867/17, 01.08.2017.	2.846	2.846	Žalba
14.	M-16	Racionalizacija glavnog projekta sanacije crne tačke Trivunove krvine	Konsult.usl.	7.000	IPSA Institut d.o.o.sarajevo, 01-02.1-6223/17, 06.07.2017.	7.020	5.616	U toku
			Revizija	1.200			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>5.616</b>	
15.	M-1.9	Glavni projekat rekonstrukcije ceste M-1.9 dionica:Slatina(gr.entiteta)-Gradačac, L=cca 5 km	Projektovanje	77.000	Institut za grad. IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11494/17. 27.12.2017.	51.585	-	U toku
			Revizija	8.000				
16.	M-17.4	Glavni projekat rekonstrukcije ceste M17.4 dionica:Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni grm	Projektovanje	65.000	Institut za grad. IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11494/17. 27.12.2017.	51.106	-	U toku
			Revizija	7.000				
17.	M-1.8	Idejno rješenje veze magistralnih cesta M-1.8 i M-14.2 (Orašje jug-Donja Mahala) L=cca 5km	Projektovanje	5.000	Saraj Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10518/17, 23.11.2017.	4.984	-	U toku
18.	M- 17.3	Izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica: Broćanac-Drenovac -Izrada elaborata zaštite od požara i zaštite na radu na projektu dok.	Konsul.usl.	7.000	ZT Tehnizaštita d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6685/17, 20.07.2017.	6.845	6.845	Okončano
		Dionica Kiševo-Broćanac: Nostrifikacija glavnog projekta tunela „Žaba“	Konsult.usl.	4.100	Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, grad.fakult. 01-02.1-9642/17. 31.10.2017.	3.920	3.920	
		Studija zaštite okolisa za Neum-Stolac	Konsult.usl.		JV Enova d.o.o.Sarajevo &Zagrebinspekt Ltd. Mostar,01-02.3- 1835/17. 07.03.2017.	33.316	33.316	
		<b>Ukupno</b>					<b>44.081</b>	
19.	M-18.1	Rekonstrukcija-modernizacija dijela makadamskog kolovoza na M-18.1 Trnovo-Ustikolina, dionica-Ustikolina – Garež	Projektovanje	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9466/17, 31.10.2017.	7.014	<b>7.014</b>	Okončano
20.	M-5 M-6.1	Izrada Skraćenih Akcijskih Planova Preseljanja za projekte Izgradnja trake za spora vozila na dionici: - Ripač-Dubovsko - Posušje-Grude-Široki Brijeg	Konsult.usl.	7.000	ENOVA d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-10204/17, 15.11.2017.	7.020	-	U toku
21.	M-14	Idejno rješenje obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M-14 i R-401)	Projektovanje	10.000			-	
22.	M-15	Idejno rješenje izgradnje ceste M15, dionica Vrhpolje-Donje Sokolovo- Crljeni I =cca 18km	Projektovanje	40.000			-	
		<b>U K U P N O</b>		<b>1.385.300</b>			<b>191.684</b>	

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

Rb.11, 21 i 22 – Projekti su planirani Rebalansom, te su do kraja godine vršene pripreme dokumentacije za nabavku usluga.

### **3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela**

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	M17	Rekonstrukcija rasvjete na petlji Zenica, dionica:Doboj-Zenica-Lašva, km 76+570	Izvođenje	14.200	Step d.d.Sarajevo, 01-02.1-6373/17, 10.07.2017.	14.141	14.130	Okončano
			Konult usluge	4.000	EMG Viting d.o.o. Vitez, 01-02.1-3861/17, 26.04.2017.	3.887	3.888	
			Revizija	1.200	JP za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica d.o.o. Zenica 01-02.1-8999/17. 09.10.2017.	1.158	1.158	
			Ostalo		Taksa	70	70	
			<b>Ukupno</b>	<b>26.400</b>			<b>19.246</b>	
2.	M4.2	Rasvjeta raskrsnice cesta M4.2 i M14 u Srblijanima	Projektovanje	7.000			-	Priprema dokumentacije za tender

### **3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka**

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	M-5 012	Rekonstrukcija raskrsnice sa M5 i R-441 (Vjetrenica), općina Vitez	Projektovanje	9.300	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	9.272	2.782	U toku
			Revizija	1.000			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>2.782</b>	
2.	M17.3 003	Hutovo – Neum, potez prolaz kroz Neum, rješavanje obrubinske kanalizacije na postojećoj cesti, L=1,2km (Ifaza)	Projektovanje	10.000	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	10.050	10.050	
			Izvođenje	200.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>10.050</b>	
3.	M4.2	Rekonstrukcije raskrsnice M4.2, Ul Žrtava domovinakog rata i Ul. 25. Novembar, dionica: Skokovi-Srbljani (Mala Lisa)	Projektovanje	15.100	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	15.122	7.561	U toku

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele 3.2.3.:

			Revizija	2.000			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>7.561</b>	
4.	M-16.2	Izgradnja pješačke staze M16.2 (001), km 11+500 do km 12+000, općina Gornji Vakuf,	Projektovanje	7.000	Geo-Data d.o.o. Mostar, 01-02.2-6053/17, 29.6.2017.	6.856	6.856	U toku
			Izvođenje	98.000	Rudnici gipsa z.d.d. Sarajevo, 01-02.2-10661/17. 29.11.2017.	98.197	-	
			Nadzor	7.000	Arting d.o.o.Sarajevo. 01-02.4-9338/17. 19.10.2017.	5.616	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>6.856</b>	
5.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000	Projektovanje	14.800	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o.Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.800	<b>4.440</b>	U toku
6.	M-5 M-15	Rekonstrukcija raskrsnica cesta M5 i M15 izlaz iz Ključa	Projektovanje	14.700	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o.Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.684	<b>5.873</b>	U toku
7.	M-17	Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, općina Žepče	Projektovanje	5.900	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6622/17, 18.07.2017.	5.850	-	U toku
8.	M-6	Izgradnja pješačke staze u Ružićima, L=1km, općina Grude	Projektovanje	7.000	Geo-data d.o.o. Mostar, 01-01.1-5511/17. 12.06.2017.	6.845	<b>6.845</b>	Okončano
9.	M-14.2	Izgradnja pješačke staze na cesti M14.2, km 1+00 do km 2+00, općina Odžak	Projektovanje	7.000	AIK-Inžinjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-8699/17. 28.09.2017.	6.500	<b>6.500</b>	Okončano
10.	M-4.2	Izgradnja pješačke staze na cesti M4.2, Barake-Mala Kladuša-Marjanovac, općina Velika Kladuša	Projektovanje	6.600	Geo Feld d.o.o. Bihać, 01-02.2-6683/17. 19.07.2017.	6.611	<b>6.610</b>	Okončano
11.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4, ulaz u Lukavac	Projektovanje	19.400	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o.Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	19.335	<b>7.734</b>	U toku
12.	M-5	Izgradnja pješačke staze uz M5, 001 granica BIH/RH-izačić-Bihać u naseljenom mjestu Izačić, L=1,2km	Konsult.usl.	11.000				
			Projektovanje	7.000			-	
			Revizija	2.000				
13.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14.2 i M5 u Bosanskom Petrovcu	Projektovanje	19.400	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o.Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka,01-02.2- 6795/17, 26.07.2017.	19.334	<b>9.667</b>	U toku

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:3.2.3.:

14.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M5 i lokalne ceste u Travniku (Plava voda)	Projektovanje	14.800	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka,01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.724	<b>7.362</b>	U toku
15.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice M14 i Ulice Prvomajska u Bosanskoj Krupi	Projektovanje	7.000	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7298/17, 11.08.2017.	6.962	3.481	U toku
			Revizija	2.000			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>3.481</b>	
16.	M-14	Izgradnja pješačke staze na M14 u naselju Kostela	Projektovanje	5.900	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7299/17, 11.08.2017.	5.850	<b>5.850</b>	Okončano
17.	M-17	Izgradnja pješačke staze i rasvjete u Kosovi, općina Maglaj	Projektovanje	7.000	AIK-Inženjering d.o.o.Banovići, 01-02.2-11181/17, 15.12.2017.	1.989	-	U toku
18.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo-Malta km 8+340	Projektovanje	14.200	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.169	5.667	U toku
			Revizija	3.000			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>5.667</b>	
19.	M-20	Izgradnja pješačke staze od Trga Branilaca do naselja Bačci, općina Goražde	Revizija	1.200			-	
20.	M-15	Izgradnja pješačke staze na M15 u naselju Šujica, L= 1,5km, općina Tomislavgrad	Projektovanje	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-5493/17. 09.06.2017.	6.763	<b>6.763</b>	Okončano
21.	M-15	Izgradnja pješačke staze na M15 u naselju Bukovica, općina Tomislavgrad	Projektovanje	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-01.1-5513/17, 12.06.2017.	6.809	<b>6.809</b>	Okončano
22.	M-5	Izgradnja pješačke staze na M5, (naselje Putiš) općina Busovača	Projektovanje	7.000	Desing&QC d.o.o.Šarajevo, 01-02.2-11015/17. 11.12.2017.	2.500	-	U toku
23.	M-16	Izgradnja pothodnika na M16 (skretanje za naselje Podgrade), dionica: Prozor/Rama-G. Vakuf/Uskoplje	Projektovanje	13.500	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	13.473	5.389	U toku
			Revizija	1.500			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>5.389</b>	
24.	M-17	Izrada glavnog projekta raskrsnice sa pješačkim stazama na M17 dionica: Jablanica-Mostar, mjesto: Vrapčići	Projektovanje	15.000			-	
25.	M-6	Rješavanje odvodnje u Stocu II faza	Izvodenje	170.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
26.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica: Kolo-Posušje, II faza	Izvodenje	100.000			-	
			Nadzor	5.000			-	
27.	M-14 003	Bosanska Krupa 1 – Otoka, izgradnja pješačke staze L=1,0 km	Izvodenje	320.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
28.	M-15 007	Igradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M15 u naselju Priluka, općina Livno	Projektovanje	7.000			-	
			Izvodenje	170.000			-	
			Nadzor	3.000			-	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:3.2.3.:

29.	M-17	Izgradnja pješačke staze Karuše – Mravići	Izvodjenje	190.000				-	
			Nadzor	7.000					
30.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice M5 i M18 Jošanica u kružni tok	Izvodjenje	1.000.000				-	**
			Nadzor	30.000					
31.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klopotnica II faza	Projektovanje	7.000				-	
32.	M-5	Rekonstrukcija ceste M5, potez Kamenica – Bedem sa rekonstrukcijom raskrsnice i izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza	Projektovanje	50.000				-	
33.	M-6	Izgradnja nogostupa na M6 _001 km 15+500 - km 16+500 na dionici Gorica_Vitina, mjesto Ruzići (lijeva strana kolnika)	Projektovanje	6.000				-	
34.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje	Projektovanje	10.000				-	
35.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice magistralnih cesta M14 i M14.2 u Bosanskoj Krupi	Projektovanje	15.000				-	
36.	M-14	Izgradnja pješačkih staza, izlaz iz Bosanske Krupe, L=1000 m	Projektovanje	7.000				-	
37.	M-14.1	Izmjena projetne dokumentacije – glavni projekt rekonstrukcije raskrsnice na M14.1 u kružni tok – Odžak	Projektovanje	7.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10567/17. 24.11.2017.		6.786	<b>6.786</b>	Okončano
38.	M-5	Izrada glavnog projekta trake za lijevo skretanje sa M-5 na stari put za Bosanski Petrovac	Projektovanje	-	Geo Feld d.o.o.Bihać, 01-02.2-10163/17. 14.11.2017.		6.493	<b>6.493</b>	Okončano
		<b>U K U P N O</b>		<b>2.695.300</b>				<b>129.518</b>	

R.br. 19 - Projekat uradila Općina Goražde,

R.br. 24 - 36 - Projekti su planirani Rebalansom, do kraja godine vrsene su aktivnosti na pripremi nabavki usluga.

R.br. 30 - Potpisani je Sporazum (01-02.2-10985/17, od 08.12.2017.)o zajedničkoj implementaciji projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok na M-18, likalitet Jošanica, općina Vogošća, između Ministarstva saobraćaja Kanton Sarajevo, Općine Vogošća i JP Ceste F BiH, kojim će Kanton Sarajevo za izvođenje radova obezbjediti nepovratna sredstva u iznosu od 1,00 mil.KM, koji je proizašao iz projektantske procjene radova. Općina Vogošća će izdati potrebna odobrenja za izvođenje radova, te obezbjediti sredstva i provesti postupak eksproprijacije zemljišta za potrebe navedenog projekta.

### 3.2.4. Vanredno održavanje

#### 3.2.4.1.Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvodač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	M-17	Glavni projekt sanacije tunela Vranduk II, (T17-007-44)dionica Topčić polje-Lašva, km 7+416 – Izmjene i dopune	Projektovanje	130.000	Divel d.o.o Sarajevo, 01-02.1-5977/17. 27.06.2017.	129.772	129.772	Okončano
			Revizija	4.000	IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-10164/17. 14.11.2017.	3.920	3.920	
			Ostalo		saglasnost	21	21	
			<b>Ukupno</b>				<b>133.713</b>	
2.	M-16.2	Glavni projekt sanacije tunela Jasen (T16.2-003-22)u naselju Ustirama, dionica Prozor-Jablanica 1, km 17+686 – Izmjene i dopune	Projektovanje	40.000	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.2-7023/17. 02.08.2017.	39.780	13.338	Izrada projekta i revizija u toku

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:3.2.4.1.:

			Revizija	4.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9293/17. 18.10.2017.	3.999	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>13.338</b>	
3.	M-17	Glavni projekat rekonstrukcije tunela Karaula, G. Goliješnica, Tupanovac (T17-006-42), dionica Ozimica-Topčić polje, km 2+699	Projektovanje	100.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10677/17, 29.11.2017.	98.184	38.945	Izrada projekta u toku,tender za reviziju u toku
			Revizija	9.000			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>38.945</b>	
4.	M-17	Glavni projekt sanacije/rekonstrukcije mosta (M17.0-5-04) preko r. Bregave na cesti M17.0, dionica Mostar – Čapljina – gr.R.H, km 32+100 – Izmjene i dopune	Projektiranje	7.000	Divel d.o.o.Sarajevo 01-02.1-3871/17, 27.04.2017.	6.903	<b>6.903</b>	Okončano
5.	M-5	Glavni projekt sanacije/rekonstrukcije mosta (M05.0-2-08) preko r. Plive u Jajcu na cesti M05.0, dionica Bosanski Petrovac – Jajce, km 93+772 – Izmjene i dopune	Projektiranje	7.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3869/17, 27.04.2017.	7.020	<b>7.020</b>	Okončano
6.	M-5	Glavni projekt sanacije/rekonstrukcije mosta (M05.0-2-01) preko r. Sane (ulaz u Ključ) na cesti M05.0, dionica Bosanski Petrovac – Jajce, km 40+099 – Izmjene i dopune	Projektiranje	6.800	Ink Constructor d.o.o. Banja luka 01-02.1-3870/17, 27.04.2017.	6.786	6.786	Okončano
			Ostalo		takse	610	610	
			<b>Ukupno</b>				<b>7.396</b>	
7.	M-16.4	Glavni projekt sanacije/rekonstrukcije mosta preko rijeke Vrbas (M16.4-001-249) u Bugojnu, dionica Nević Polje – Bugojno, km 35+180 – Izmjene i dopune	Projektovanje	7.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-6054/17, 29.6.2017.	7.020	7.020	Okončano
			Revizija	3.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6821/17. 27.07.2017.	2.925	2.925	
			Ostalo		Naknada	520	520	
			<b>Ukupno</b>				<b>10.465</b>	
8.	M-18.1	Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko Crne rijeke (M18.1-1-06), lokacija skretanje za Govediće, dionica Ustikolina-Trnovo, km 40+088	Projektovanje	17.000	GP:IPSA Institut d.o.o. Sarajevo INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7349/17. 14.08.2017.	16.965	15.070	U toku
			Revizija	1.200	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9802/17. 06.11.2017.	1.404	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>15.070</b>	
9.	M-15	Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko potoka Krbava, dionica Kamičak-Ključ, km 9+622	Projektovanje	16.000	GP:IPSA Institut d.o.o. Sarajevo INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7349/17. 14.08.2017.	15.795	-	U toku
			Revizija	800	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9802/17. 06.11.2017.	936		
10.	M-17	Glavni projekat zaštite temelja mosta preko nepoznatog potoka, Zukića kosa (M17-011-342), dionica Tarčin – Konjic, km 13+736	Projektovanje	15.200	GP:IPSA Institut d.o.o. Sarajevo INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7349/17. 14.08.2017.	15.210	15.210	Okončano
			Revizija	700	Trasa d.o.o.Sarajevo 01-02.1-9802/17. 06.11.2017.	819	819	
			<b>Ukupno</b>				<b>16.029</b>	
11.	M-17	Glavni projekat zaštite temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	Projektovanje	8.200	GP:IPSA Institut d.o.o. Sarajevo INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7349/17. 14.08.2017.	8.190	-	U toku
			Revizija	700	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9802/17. 06.11.2017.	819		

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:3.2.4.1.:

12.	M-17	Sanacija mosta preko rijeke Save u Bosanskom Šamcu (M17-001-574), dionica, km 0+000	Projektovanje	43.300	GP:IPSA Institut d.o.o. Sarajevo INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7349/17. 14.08.2017.	43.290	43.290	Okončano
			Revizija	1.500	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9802/17. 06.11.2017.	1.755	1.755	
			<b>Ukupno</b>				<b>45.045</b>	
13.	M-18.1	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko Crne rijeke u Baćima (M18.1-001-446), dionica Ustikolina-Grebak-Delijski-Trnovo, km 42+720	Izvodjenje	607.000			-	Poništen tender
			Nadzor	8.500				
14.	M-18	Zamjena dilatacione naprave mosta preko rijeke Drinjče u Kladnju (M18-008-68), dionica Vitalj – Olov, km 1+186	Izvodjenje	35.000			-	Dva puta tender ponušten (jedna ponuda, drugi put nijedna)
			Nadzor	3.000				
15.	M-17	Zamjena dilatacione naprave mosta preko bujičastog potoka lokacija Bagrem (M17-012-305), dionica Konjic- Jablanica 1, km 16+311	Izvodjenje	66.000			-	Dva puta tender ponušten (jedna ponuda, drugi put nijedna)
			Nadzor	3.000				
16.	Konsultantske usluge	Usluge prevodenja i uskladivanja sa Smjernicama:						Okončano
		M-1.8	Sanacija mosta preko Špioničkog potoka, (M01.8_003_95) lokacija Špinica Donja, dionica Pelagićev-Srebrenik, km 22+062	600	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-5492/17, 09.06.2017.	585	585	
		M-18	Sanacija mosta preko rijeke Drinjče Kladnju (M18-008-69) dionica: Vitalj-Olov, km 2+107;	1.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9643/17, 31.10.2017.	936	-	
		M-6.1	Sanacija mosta preko potoka Korana,(M6.1_002_462) lokacija Brkića vrelo, dionica Resanovci Bos. Grahovo 1, km 12+921	1.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9643/17, 31.10.2017	936	-	
		M-5	Sanacija mosta preko Sandžačke rijeke (M5-009_218), dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 26+245	1.300	INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11097/17. 13.12.2017.	1.300	-	
		M-5	Sanacija mosta preko potoka Mrižnica, (M5_001_8) lokacija Kamenica, dionica Granica RH (Izačić)-Biljač 4, km 7+765	1.700	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10748/17. 04.12.2017.	1.755	-	
		M-4	Sanacija mosta preko potoka Radušica (M4_008_200) dionica Teslić (Barići)-Karuše, km 13+917	1.300	INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11097/17. 13.12.2017	1.300	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>585</b>	
								U toku
17.	M-17	Sanacija mosta preko rijeke Bosne u Reljevu, dionica Jošanica-Stup 1 km 2+962	Revizija	3.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4530/17, 16.05.2017.	3.000	3.000	U toku
			Uskladivanje i prevodenje		TZI Inženiring d.o.o. Sarajevo 01-02.1-3854/17 GK 19.05.2017.	500	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>3.000</b>	
18.	M-18	Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Bioštice u Olovu (M18-009-187), dionica Olov – Semizovac, km 0+404	Projektovanje	20.000			-	
			Revizija	3.000				
19.	M-15	Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čapljje (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 - Kamičak, km 4+283	Projektovanje	35.000			-	
			Revizija	3.500				
20.	M-18	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo-Malta, km 0+048	Izvodjenje	350.000			-	
			Nadzor	10.000				
21.	M-1.8	Rekonstrukcija tunela Drenik (T1.8-004-48) l=80m, dionica Srebrenik-Ščki Brod 3, km 2+655	Projektovanje	25.000			-	
			Revizija	3.000				
		<b>U K U P N O</b>		<b>1.604.300</b>			<b>297.509</b>	

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

R.br.18. - 21. - Projekti su planirani Rebalansom, a planirane aktivnosti se prenose u 2018.godinu.

### **3.2.4.2.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza**

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	M-14 002	Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002: Srbljani - Bosanska Krupa sa urednjem i zaštitom škarpi zasjeka cca = 8,0 km	Projektovanje	25.000	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo,IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	24.921	12.460	U toku
			Revizija	2.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	2.340	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>12.460</b>	
2.	M-16 006	Sanacija asfaltnog kolovoza Crna Rijeka-Jajce Jug, L=2,5 km	Izvođenje	142.000	Rudnici gipsa z.d.d. Donji Vakuf, 01-02.2-8378/17. 14.09.2017.	141.614	141.614	Okončano
			Nadzor	7.900	Divel d.o.o.Sarajevo. 01-02.2-5967/16. 11.07.2016.	7.868	3.147	
			<b>Ukupno</b>				<b>144.761</b>	
3.	M-17 005	Sanacija asfaltnog kolovoza na poddionici: Poljice-Misurići,L=2,5 km i km16+500 do km 19+050općina Maglaj	Projektovanje	17.200	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka,01-02.2-6427/17, 11.07.2017.	17.199	<b>17.199</b>	Okončano
4.	M-1.8	Rekonstrukcija magistralne ceste M1.8 dionica: granica FBIH/RH(Orašje) – granica FBIH/RS Lončari, km 1+750, Općina Orašje	Projektovanje	27.700	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka,01-02.2-6427/17, 11.07.2017.	27.612	<b>27.612</b>	Okončano
5.	M-15	Sanacija asfaltnog kolovoza magistralne cesta M-15 Kamičak-Ključ L= 6km	Projektovanje	17.200	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6427/17, 11.07.2017.	17.199	<b>17.199</b>	Okončano
6.	M-4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici M-4.2 Skokovi-Srbljani, L= 6km	Projektovanje	17.200	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6427/17, 11.07.2017.	17.199	<b>17.199</b>	Okončano
7.	M-4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza granica BIH/RH do kružnog toka u Velikoj Kladuši	Projektovanje	17.200	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6427/17, 11.07.2017.	17.199	<b>17.199</b>	Okončano
8.	M-5	Sanacija asfaltnog kolovoza M-5 005, km7+700 do km12+500, općina Bosanski Petrovac	Projektovanje	18.300	Institut za gradevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6427/17, 11.07.2017.	18.252	<b>18.252</b>	Okončano
9.	M-5	Sanacija asfaltnog kolovoza M-5, Gromljak-Blažuj, km 3+970 – km 5+100	Projektovanje	10.000			-	
10.	M-17	Sanacija asfaltnog kolovoza M-17 dionica:Konjic-Jablanica, dužine cca 3km	Projektovanje	15.000			-	
<b>U K U P N O</b>				<b>316.700</b>			<b>271.881</b>	

**3.2.4.3 Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka**

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Izvodač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	M-14	Sanacija slijeganja trupa ceste M-14:Bihac - Grmuša(Prnjosor) - Mali Radić,dionica: Čavkići – Spahići, od P45 do P50, od km 0+870,74 do km 0+959,51	Projektovanje	19.500	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	19.422	-	U toku
			Revizija	2.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	1.872		
2.	M-16 006	Dionica Crna Rijeka-Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija)sanacija škarpi i nestabilnih kosina	Projektovanje	23.200	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	23.166	-	U toku
			Revizija	2.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	3.276		
3.	M-14	Sanacija škarpi i kosina, dionica: Srbljani-Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	Projektovanje	25.000	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	24.921	12.460	U toku projektovanje, revizija i tender za izvođenje i nadzor
			Revizija	6.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	1.872	-	
			Izvođenje	455.000			-	
			Nadzor	14.000			-	
			<b>Ukupno</b>				<b>12.460</b>	
4.	M-18	Sanacija klizišta ispod nivelete, cesta dionica:Živinice 1 –Vitalj, (Stanovi) km 26+000	Izvođenje	280.000	Roading d.o.o.Gračanica, 01-02.2-6581/17, 17.07.2017.	279.371	270.440	Okončano
			Nadzor	2.800	Artting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7318/17. 11.08.2017.	2.718	2.718	
			<b>Ukupno</b>				<b>273.158</b>	
5.	M-16.2	Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M-16.2_003, dionica:Prozor-Jablanica 1, km 3+850	Projektovanje	20.000			-	
6.	M-5	Rješavanje odvodnje, cesta M-5_018, Prača-Hrenovica, dionica:Podgrab-Sastavci, km 11+800	Projektovanje	15.000			-	
		<b>U K U P N O</b>		<b>864.500</b>			<b>285.618</b>	

R.br.5. i 6. - Projekti planirani Rebalansom, a planirane aktivnosti se prenose u 2018.godinu.

**4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije**

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Rebalans Plana 2017.	Izvodač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
		<b>Elaborati eksproprijacije</b>					
		3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje					
		II IZGRADNJA TRAKA ZA SPORA VOZILA					

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:

1.	M-5	Dionica Ripač - Vrtoče 2, poddionica Ripač - Dubovsko	21.200		21.180	4.236	U toku
2.	M-5	Dionica Gornje Bravsko – Ključ, poddionica Bos. Petrovac - Ključ - Prevoj Lanište	19.700		19.714	3.943	U toku
3.	M-5	Dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, prevoj Komar	16.400	GP: Sarajinžinering d.o.o. Sarajevo, Zedis d.o.o. Zenica, GeoFeld d.o.o. Bihać i AMG d.o.o. Visoko, 01-02.2-7162/17, 07.08.2017.	16.334	-	U toku
4.	M-6.1	Dionica Posušje-Široki Brijeg, Posušje - Grude - Široki Brijeg	24.000		23.661	-	U toku
5.	M-14.2	Dionica Bosanski Petrovac-Pasjak, Poddionica Bosanski Petrovac - Drvar	24.300		24.286	-	U toku
6.	M-14.2	Dionica Pasjak- Resanovci, Poddionica Drvar - Resanovci	17.000		17.018	-	U toku
7.	M-18	Izradnja traka za spora vozila: dionica: Olovno -Semizovac, podionica: Čevljjanovići-Nišići	17.200		17.213	-	U toku
8.	M-15	Dionica: Livno-Šujica-Kupres: - Borova Glava traka	25.300		25.302	-	U toku
		Dionica: Livno-Šujica-Kupres: - Trivunove krivine	1.000			-	U pripremi
		III REKONSTRUKCIJA CESTE					
9.	M-4.2	Obilaznica Cazina Glavni projekat objekata (mostovi 2) Misija G21 Ažuriranje –Izmjena glavnog projekta trase Studija uticaja na okoliš	25.000	GP: Sarajinžinering d.o.o. Sarajevo, Zedis d.o.o. Zenica, GeoFeld d.o.o. Bihać i AMG d.o.o. Visoko, 01-02.2-7162/17. 07.08.2017.	24.912	-	U toku
		VII SANACIJA ŠTETA NAKON POPLAVA					
10.	M-18	Dionica Priboj 2-Simin Han 1, Poddionica Banj Brdo - Simin Han	14.400		14.341	-	
		Planirani elaborati za prenesene projekte					
		3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje					
11.	M-14.1	Obilaznica Odžak Izrada glavnog projekta tzv. "sjeverne veze" L=2.0 km	2.500			-	U postupku
12.	M-5	Ažuriranje glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf L=3,5 km	3.500			-	U postupku
13.	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste na potezu Skela (tunel i cesta), L=cca 1km	1.000			-	U postupku
14.	M-5	Rekonstrukcija ceste M5 Dionica: Kaonik – Gromiljak Potez „Delfine krivine“, L=cca 1km	2.000			-	U postupku
		III REKONSTRUKCIJA CESTE					
15.	M-5	Glavni projekat rekonst.cest, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1,5km	4.000			-	U postupku
16.	M-15	Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1)	2.000			-	U postupku
17.	M-6	Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R 420)	3.000			-	U postupku
18.	M-5	Obilaznica Kiseljaka L=cca 2km	2.000			-	U postupku
19.	N	Glavni projekt Zapadne obilaznice Ljubuškog, L=1,7km	2.000			-	U postupku
20.	N	Obilaznica Goražda L= cc1+1,5 km 2,5 km	3.000			-	U postupku
		3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka					
21.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok	500			-	U postupku.
22.	M-6	Rekonstr.raskrsn. M6 i R425a u naselju Trebižat (spoj na AC) općina Čapljina	1.500			-	Okončan
23.	M-18 010	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18 u kružne tokove, ( prolaz kroz Vogošću)	2.000			-	U postupku
24.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružne tokove na obilaznici Viteza – Krčevine	4.100			-	U postupku
25.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak	1.000			-	U postupku
26.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok u Jelahu	4.100			-	U postupku
27.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica	4.100			-	U postupku
28.	M-14.1	Rekonst. Raskr.ceste M14.1 i saobraćajn. za Industrijsku zonu u općini Gradačac	4.100			-	U postupku
		<b>U K U P N O</b>	<b>251.900</b>			<b>8.179</b>	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

U slijedećoj tabeli navedeni su projekti gdje je završena ili je u toku eksproprijacije:

Red. br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Rebalans Plana 2017.	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Napomena
1.	M-17.3	Neum – Stolac, dionica: Broćanac –Drenovac (277.981KM) (tunel Žaba 675.988KM, tunel Oštrovac 32.412KM)		986.381	
2.	M-6.1	Južna Obilaznica Mostara, servisna saobraćajnica na dion. Medine-Miljkovići i dion.Miljkovići-Rodoč-veza na M-17		51.354	
3.	M-14	Obilaznica Bihaća, dionica:Izačić-Kamenica			
4.	M-16.4	Obilaznica Bugojna			
5.	M-4.2	Obilaznica Cazina			
6.	M-6	Južna obilaznica Gruda (Ifaza)			
7.	M-14.1	Izgradnja magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa, Srbljansko – Grmuški plato, L= 25 km		41.390	
8.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i R-403 u Kamenici			
9.	M-5	Bihać: Devijacija pored Robota i Doma Zdravlja Bihać			
10.	M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200			
11.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Husino" dionica (006), km 2+500			
12.	M-4	Rekonstr. raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica-Šiški Brod, km 23+500			
13.	M-6.1	Rekonstrukcija ceste M-6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič			
14.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950			
15.	M-17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700			
16.	M-5	Izgradnja pješačke staze u neslu Izračić, M-5_001, km 2+450 – km 3+000			
17.	M-4.2	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4.2 i R400 na M4.2, dionice Skokovi – Srbljani (Todorovo)			
18.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Olovske Luke" dionica (008), km 20+600			
19.	M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Čehaje			
20.	M-20	Rekonstrukcija raskrsnice Vitkovići u krožni tok			
21.	M-17	Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600 i km 3+880			
22.	M-18	Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200			
23.	M-18	Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050 do km 21+300			
24.	M-5	Rekonstrukcija ceste dionica: Kaonik-Gromljak, potez „Delfine krivine“			
25.	M-15	Kamičak – Ključ, km 17+000			
26.	M-4	Petlja Šiški		137.125	
27.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice za Kravice, dionica: 002; km 12+400			
28.	M- 6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar-Široki brije, kroz naseljeno mjesto Medine			
29.	M-4.2	Rekonst. rask. ceste M-4.2, Ul. Žrtava domov. rata i 25. Novembra, u Cazinu (002), km 11+230		100	
30.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok			
31.	M-6	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, M-6, 004, km 3+950 – km 4+600			
32.	M- 4.2	Sanacija klizišta, cesta M-4.2_002, dionica002: Skokovi-Srbljani, km 13+350			
33.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo			
34.	M-14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002		5.000	
35.	M-15	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M-15 i R-405 dionica 003			
36.	M-5	Rekonstr. raskrsn. cesta M-5 i M-16.4 u kružni tok, M5, (012), km 0+000 (Nević Polje)			
37.	M-18	Rekonstruk. raskrsnice cesta M-17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M-17, (008), km 7+350			
38.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M-18_007, km 0+000			
39.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnica u kružne tokove na obilaznici Viteza – Krčevine			
40.	M-18	Rekonst. ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dion. Ustikolina – Trnovo, km 37+257		28.578	
41.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnica na cesti M-18 u kružne tokove, ( prolaz kroz Vogošču)			
42.	M-17	Izgradnja potpunjakaza naselje Nemila, na M-17			

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:

43.	M-4	Okončanje eksproprijacije projekta Rekonstrukcija raskrsnice u Klokočnici *		sufinansiranje          6.876
44.	M-17	Rekonstrukcija crne tačke M-6 i M-17 Tasovčići-Čapljina, km 0 + 000		
45.	M-17	Rekonstrukcija crne tačke Bulajčića krivina na M-17 013, km 35+80 do 36+800		
46.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-6 i R- 425 u naselju Trebižat (spoj na AC) dionica_ 002 Vitina-Tasovčići km 20+400		
47.	M-5	Izgradnja traka za spora vozila, dionica:Bos.Petrovac-Ključ, prevoj Lanište		
48.	M-5	Izgradnja traka za spora vozila, Bihać-Bos.Petrovac, dionica: Ripač-Dubovsko,		
49.	M-6.1	Izgradnja traka za spora vozila, Posušje - Široki brijeg,		
50.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak		
51.	M-18	Izgradnja ceste Potaklenik-Kladanj, Karaula		
		<b>U K U P N O</b>		3.486
			<b>2.005.300</b>	<b>1.260.290</b>

### 5. Projekti iz Programa utroška investicijskih sredstava razvoja – Budžet Federacije BiH 2007.godina

Odlukom o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom F BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija V broj:1528/15 od 12.novembra 2015. i V broj:1738/2015 od 16.12.2015.godine („Službene novine F BiH“, br.97/15.) odobrena su sredstva za projekt „Rekonstrukcija ceste R 419 Posušje-Jablanica u iznosu od 1,85 mil KM. Sredstva u iznosu od 1,72 mil.KM implementirana su tokom proteklog perioda.

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2017.	Reaizovano 01.01.- 31.12.2017.
1.	R-419	Rekonstrukcija ceste R 419 Posušje – Jablanica	Izvođenje	132.000	-
2.	M-17.3	Neum-Stolac	Eksproprijacija	-	52.184
		<b>U K U P N O</b>		<b>132.000</b>	<b>52.184</b>

Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj:1043/17. od 20.07.2017. o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade F BiH Budžeta F BiH za 2017.godinu, potpisana je Ugovor o prijenosu sredstava kapitalnog transfera broj:01-03.1-10717/17. 01.12.2017. između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Ceste F BiH u iznosu od 0,70 mil.KM, u svrhu eksproprijacije na projektu Neum-Stolac. Od potpisivanja Ugovora do kraja godine realizovano je 0,05 mil.KM, za eksproprijaciju tunela Oštrovac.

### 6. Donacije i sufinansiranje

I. Na osnovu zapisnika o okončanju projekata, općine su ustupile projektnu dokumentaciju JP Ceste F BiH za slijedeće projekte:

Red. Br.	Mag. Cesta	O P I S	Vrijednost projekta
1.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M-14.1 i saobraćajnice za industrijsku zonu u općini Gradačac	4.095

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

Nastavak tabele:

2.	M-6.1	Izgradnja pješačke staze na M-6.1, dionica 010 km 4+200-5+030, općina Široki brijeg	6.962
3.	M-5	Izvršena je primopredaja svjetlosne saobraćajne signalizacije i opreme na raskrsnici M5 i Hasanagina/Poturmahala i M5 Donja mahala/Poturmahala, općina Travnik.U cilju kontinuiranog održavanja i uspostavljanja koordinacije, odnosno zelenog vala, te zadržavanja nivoa sigurnosti učesnika u saobraćaju, na osnovu Odluke Općinskog vijeća Travnik, uradena je primopredaja svjetlosne signalizacije između predstavnika Općine Travnik i predstavnika JP Ceste F BiH.	12.500
4.	M-17	Općina Maglaj je finansirala idejni i glavni projekt kao i reviziju rekonstrukcije raskrsnice u poslovnoj zoni općine Maglaj. Uradena dokumentacija je predata JP Ceste F BiH.	15.085
5.	M-4	Općinsko vijeće Dobojski Istoč je donijelo Odluku broj:02-05-389/13 i 02-05-617/17 od 27.03.2017. kojima je utvrđeno da je od javnog interesa rekonstrukcija raskrsnice na cesti M-4 dionica:Dobojski-Tuzla u naselju Klokočnica,km 8+800, i donijelo odluke o zajedničkom sufinansiranju eksproprijacije u cilju okončanja projekta	10.100
6.	M-18	Općina Vogošća je naručila i ustupila projektu dokumentaciju „Izgradnje pješačke staze uz M-18_010; dionica: Vogošća-Kobilja Glava – Sarajevo, Donji Hotonj _Gornji Hotonj, L=1,0 km“.	11.985
		<b>UKUPNO</b>	<b>60.727</b>


## II.

Red. Br.	Mag. Cesta	O P I S	Vrijednost projekta
1.	M-18	Sanacija ceste M18, dionica 005, Prnjavor 2- Simin Han1 /Sanacija klizišta i ceste Banj Brdo II: na lokacijama: Lokacija L-1, km 15+900; Lokacija L-2, km 17+900; Lokacija L-3, km 18+050; Lokacija L-4, km 18+800; Lokacija L-5, km 20+800 <b>Ukupno</b>	89.937 353.583 328.043 385.862 541.528 <b>620.356</b> <b>2.319.309</b>
2.	M-18	Sanacija ceste M18, dionica 005, Prnjavor 2- Simin Han1 /Sanacija klizišta i ceste Banj Brdo I: na lokacijama: Lokacija L-1, km 9+100; Lokacija L-2, km 11+100; Lokacija L-3, km 12+000; Lokacija L-4, km 13+550; Lokacija L-5, km 13+800 Lokacija L-6, km 13+900 Lokacija L-7, km 14+400 <b>Ukupno</b>	262.170 314.694 329.179 158.417 447.258 182.308 <b>731.568</b> <b>2.425.594</b>
3.	M-18	Sanacija mosta preko rijeke Drinjače i Ujića rijeke u Kladnju, na cesti M-18.0 dionica:008: Vitalj-Olovo km 2+277(45+128)	<b>492.402</b>
4.	M-19.2	Sanacija temelja, potpornih zidova, naglavnih greda i ograda na M19.2_001, dionica:Kladanj-Vlasenica, km 6+500 do km 11+500	<b>518.199</b>
5.	M-17	Sanacija klizišta na škarpi iznad nivelete i škarpe iznad nivelete na M17 dionica:007:Topčić Polje-Lašva, km 1+600 km 3+880	252.138 409.818 <b>661.956</b>
6.	M-15	Dionica 004, Komičak-Ključ: 1. Lokacija 1-Sanacija škarpe iznad nivelete ceste, stacionaža km 14+500 2. Lokacija 2-Sanacija škarpe iznad nivelete ceste, stacionaža km 17+500 3. Lokacija 3.1 -Sanacija klizišta na škarpi iznad nivelete i škarpe ispod nivelete, km 18+300 4. Lokacija 3.2 -Sanacija klizišta na škarpi ispod nivelete, km 18+600 5. Lokacija 4 -Sanacija škarpe ispod nivelete, km 19+800 6. Lokacija 5 -Sanacija škarpe ispod nivelete, km 15+700	90.635 230.910 234.056 114.540 229.880 <b>81.751</b> <b>981.772</b>
		<b>UKUPNO</b>	<b>7.399.232</b>
		<b>SVEUKUPNO I+II</b>	<b>7.459.959</b>

Nakon poplava u BiH 2014. godine, od strane BiH, u saradnji sa Svjetskom bankom, EU i UN-om izvršena je procijena nastalih šteta, između ostalog, i na putnoj infrastrukturi. Svjetska banka je odobrila kreditna sredstva BiH (F BiH) u iznosu od 100 mil.US\$, za transportni sektor 40%, za područje koje je bilo najpogodjenje poplavama, u cilju obnavljanja funkcionalnosti infrastrukture bitne

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

za javne usluge i ekonomski oporavak zahvaćenih područja. Projekti su izabrani na osnovu broja potencijalnih korisnika projekata. Sredstva je implementiralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (PIU Šumarstva i poljoprivrede), a Komisija imenovana od strane JP Ceste F BiH, pregledala i preuzela projekte, čiji je krajnji korisnik JP Ceste F BiH. U tabeli su navedeni projekti i vrijednost istih, koja je povećala vrijednost cestovne infrastrukture u bilansnim evidencijama JP Ceste F BiH.

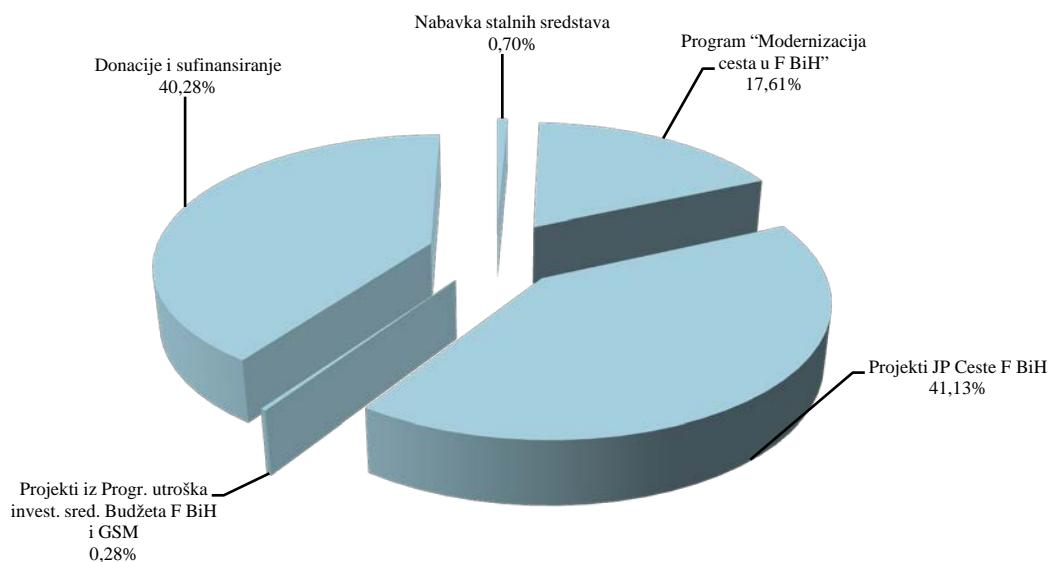

*Grafički prikaz strukture ostvarenih investicija*

### **D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE**

Za navedeni period provedena su 182 postupka nabavki, na osnovu kojih su sklopljeni ugovori u iznosu od 40.804.239 KM.

Izvještaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka i obuhvata:

Pregled provedenih postupaka javnih nabavki JP Ceste F BiH u promatranom periodu

#### ***Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti***

Vrsta postupka nabavke	Iznosi sa PDV-om	Broj postupaka
Otvoreni	37.191.426	38
Konkurentski	226.278	17
Pregovarački	2.524.169	20
Direktni sporazumi	434.566	104
Neprioritetne usluge	427.800	3
<b>Ukupno</b>	<b>40.804.239</b>	<b>182</b>

Za šest (6) postupaka nabavki procjena ponuda je u toku.

Za slesnaest (16) postupka nabavki, donesene odluke o dodjeli ugovora i čeka se ugovaranje.

Šest (6) postupaka nabavki je pokrent postupak nabavke i čekaju se ponude.

**b. Žalbe**

U navedenom periodu podnesene su 22 žalbe, od čega 21 žalbe rješene i postupci nabavke su nastavljeni. Jedna žalba, koja se odnosi na odluku o poništenju postupka nabavke radova rušenja postojećeg mosta i izgradnju novog mosta preko Crne rijeke u Baćcima, na cesti M-18.1, dionica Ustikolina-Trnovo, je na rješavanju u Uredu za žalbe BiH, Mostar i postupak nabavke je obustavljen do donošenja rješenja po žalbi. Žalbe

**E.PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI**

Aktivnosti pravnog sektora u periodu 01.01.- 31.12.2017. godina mogu se podijeliti na sljedeće oblasti:

- pravne, normativni i
- kadrovske poslove

**Pravni i normativno-pravni poslovi**

Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u Federaciji BiH, odnosno u državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.

U periodu 01.01.-31.12.2017.godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Cesta F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Vršene su pripreme sjednica organa JP Cesta F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednicama Skupštine JP Cesta F BiH, Nadzornog odbora i Uprave ovog preduzeća.

U izvještajnom periodu održane su 2 sjednice Skupštine, 9 sjednice Nadzornog odbora, 12 sjednice Odbora za reviziju i 23 sjednice Uprave JP Cesta F BiH.

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd., kao i oblast parničnih, vanparničnih, prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka, a dijelom i imovinsko-pravnih poslova.

Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Cesta F BiH pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu. Zbog velikog broja tužbi protiv ovog pravnog lica izražene su velike aktivnosti na pripremi pojedinih predmeta i njihova obrana u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast, odnosno zastupanje pred nadležnim sudovima.

U izvještajnom periodu obavljane su aktivnosti na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Cesta F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl.

Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi.

U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2017.god. iznosi 25 predmeta (naplata za cestovno zemljište, regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme).

U izvještajnom periodu podneseno je 5 novih tužbi gdje se kao tužitelj pojavljuje JP Ceste F BiH a završeno je tri predmeta.

U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana stanje aktivnih predmeta na dan 31.12.2017.god. iznosi 301 predmet.

U izvještajnom periodu podneseno je 45 novih tužbi.

Što se tiče završenih predmeta koji su postali pravosnažni i u kojima se JP Ceste F BiH pojavljuje kao tužena strana, a u kojim predmetima je usvojen tužbeni zahtjev, vidljiva su nastojanja da se takav tužbeni zahtjev smanji pa se ne može generalno reći da su ti predmeti u potpunosti izgubljeni.


U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa, kao i aktivnosti na izradi nacrta i prijedloga opštih akata preduzeća za usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH.

Takođe, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski poslovi u skladu sa zakonom i opštim aktima.

### **Kadrovska poslova**

Na dan 31.12.2017. struktura radnika JP Ceste F BiH je slijedeća:

Red.br.	Vrsta školske spreme	Stanje 31.12.2017.
1.	Magistri nauka (grad. saob, ecc, komunikologije.)	4
2.	Magistri struke (saob. grad.ecc. arh; geografije)	7
3.	VSS gradevinske struke	25
4.	VSS saobraćajne struke	3
5.	VSS ekonomske struke	6
6.	VSS pravne struke	11
7.	VSS geodetske struke	1
8.	VSS infor.struke	2
9.	VS (ing.grad..)	5
10.	VS (becheler ecc.)	3
11.	SSS gradevinski tehničari	6
12.	SSS mašinske struke	1
13.	SSS saobraćajne struke	2
14.	SSS ekonomske struke	5
15.	SSS ostale struke (druš.i prir.)	5
<b>U K U P N O</b>		<b>86</b>

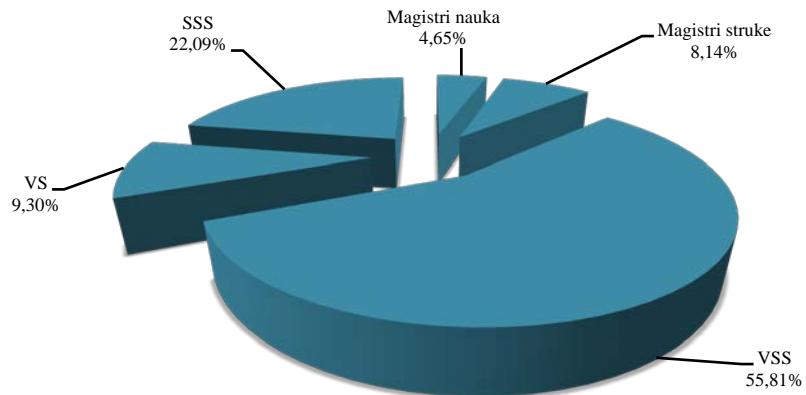

Grafički prikaz sastavke školske spreme zaposlenih na dan 31.12.2017.

Direktor

Ljubo Pravdić, dipl.ing. gradj.
