IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. GODINA

Sarajevo; februar/veljača 2017.

SADRŽAJ

	strana
U V O D	3
A.I JAVNI PRIHODI	7
A.II AMORTIZACIJA	10
B.I JAVNI RASHODI	11
1. Troškovi poslovanja	12
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	14
3. Redovno održavaje.	16
4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	21
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	22
6. Troškovi konsultantskih usluga	23
7. Kamate	24
B.II TROŠKOVI AMORTIZACIJE	26
C.INVESTICIJE	27
1. Nabavka stalnih sredstava	28
2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“	29
3. Projekti JP Ceste F BiH	30
4. Projekti iz Programa utroška inv.sred.Budžeta F BiH	53
5. Sredstva po Odluci Vlade F BIH-GSM licenca	53
D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE	55
E.PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	55

U V O D

Na osnovu Zakona o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ br. 6/02.) u Kantonalnom sudu Sarajevo, registrovano je 2002.godine Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kojoj je data na korištenje i upravljanje magistralna cestovna infrastruktura u F BiH. Promjenom Zakona o cestama F BiH („Službene novine F BiH br. 12/10.16/10. i 66/13.) izmjenjen je naziv u Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: „JP Ceste F BiH“). Navedena promjena registrovana je kod Općinskog suda Sarajevo Rješenjem o registraciji broj: 065-0-Reg-11-000713 marta 2011. godine. Sjedište Društva je u Sarajevu, na adresi Terezije 54.

Vlada F BiH je Odlukom V broj:336/2016 dala saglasnost na Plan poslovanja JP Cesta F BiH. Tokom implementacije istog, došlo je do promjena zbog čega se Uprava JP Cesta F BiH odlučila za revidiranje tj. za izradu Rebalansa Plana poslovanja JP Ceste F BiH za 2016.godinu, na koji je takodjer, Vlada F BiH Odlukom V broj:1851/16. dala saglasnost. Više činjenica je uticalo za izradu Rebalansa, a najznačajnije su:

- Odluka V broj:1777/16 od 22.septembra 2016.godine o razvrstavanju regionalnih cesta R-462 Ormanica – Gradačac – Slatina (granica Federacije BiH) u magistralnu cestu M-1.9 i regionalne ceste R-464 (Orašje-Odžak) u magistralnu cestu M14.2. Ovom Odlukom stavljena je van snage Odluka V broj:1020/16 od 06.maja 2016.godine;
- Odluka o razvrstavanju regionalne ceste R-424 Mostar-Čitluk-Tromeđa-Ljubuški-Teskera-Crveni Grm u magistralnu cestu M-17.4, donesenu od strane Vlade F BiH V broj:1737/15 16.decembra 2015.godine;
- Odluka Vlade F BiH o usvajanju Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom F BiH za 2007.godinu V broj: 1738/15. od 16.12.2015.(„Službene novine F BiH“, br:97/15.) kojom su sredstva za Projekt: “Doboj-Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica „Kreka“) - petlja Šićki Brod“ smanjena za 1,85 mil.KM i prebačena na projekt: „Rekonstrukcija regionalne ceste Posušje-Jablanica“ i
- Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila V broj: 202/2015, kojom je prihod od putarine povećan.

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Cesta F BiH za period 01.01.-31.12.2016. godina sačinjen je na osnovu Zakona o cestama F BiH, Pravilnika o računovodstvu i Računovodstvenih politika JP Ceste F BiH usaglašenih sa važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima, koliko je to moguće, (u daljem tekstu:“MRS“), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“) i u skladu sa specifičnostima poslovanja i pravnog statusa JP Cesta F BiH. Realizacija navedenih aktivnosti omogućava evidentiranje finansijskih transakcija u skladu sa specifičnostima poslovanja, načina finansiranja i zahtjevima za prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa MRS i MSFI.

JP Ceste F BiH u izvještajnom periodu ostvarile su prihod u iznosu od 70,46 mil.KM, što je 4 % više od planiranih 67,69 mil.KM. Iako je prihod od naknada iz nafte i naftnih derivata ostvaren u iznosu od 40,55 mil.KM, nije dostigao nivo 2008.godine kada je prihod po istom osnovu iznosio 45,05 mil.KM, a 2007. godine 47,11 mil.KM.

Rashodi se realizovani u iznosu od 52,55 mil.KM ili 11 % više od planiranih 47,14 mil.KM. Redovno održavanje čini najveću stavku rashoda sa iznosom od 32,14 mil.KM. Na visinu rashoda redovnog održavanja uticale su Odluke Vlade F BiH o razvrstavanju regionalnih cesta u magistralne. Neophodno je napomenuti da iz sredstava rizika i neplaniranih rashoda su finansirane pristigle obaveze za projekt: Potpaklenik-Kladanj, tunel Karula u iznosu od 6,65 mil.KM.
JP Ceste F BiH su, pored svojih redovnih aktivnosti koje se odnose na redovno održavanje i zaštitu magistralnih cesta, ulagale u rekonstrukciju i sanaciju cestovnih objekata, poboljšanje sigurnosti prometa, sanaciju klizišta, odrona, sanaciju slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka, sanaciju oštećenih asfaltnih kolovoza, rasvjetu i semaforizaciju raskrsnica.

Ostvarena je slijedeća struktura ulaganja u 2016.godini:

- održavanje (redovno i zimsko)	32,14 mil.KM
- sanacija klizišta,škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza	5,04 mil.KM
- rekonstrukcija cesta, mostova i tunela	3,57 mil.KM
- troškovi poslovanja	4,99 mil.KM
- služba pomoći i informacija	4,44 mil.KM
- rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	0,05 mil.KM
- poboljšanje sigurnosti prometa	3,42 mil.KM
- nabavka stalnih sredstava	0,39 mil.KM
- rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	6,80 mil.KM
- rezervirana sredstva za sudske presude	2,35 mil.KM
- konsultantske usluge	0,30 mil.KM
- kamate i kursne razlike	1,53 mil.KM

Prema Zakonu o cestama F BiH razlika javnih prihoda i javnih rashoda predstavlja finansijski rezultat koji je neoporeziv. Isti se raspoređuje na obaveze prema planiranoj namjeni tj. isključivo za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta, kao i na dospjele kreditne obaveze. Finansijski rezultat u izvještajnom periodu iznosi 24,55 mil.KM, koji služi za izmirenje dospjelih kreditnih obaveza i kao izvor sredstava za investiranje u cestovnu infrastrukturu.

Od ukupno planiranih 21,11 mil.KM sredstava za investicije, realizovano je 12,47 mil.KM, od čega 11,31 mil.KM iz vlastitih sredstava. Dio projekata je okončan tokom godine, dok će se započete planirane aktivnosti na projektima nastaviti u 2017 godini. Na visinu realizacije uticalo je i obnavljanje postupaka javne nabavke, spori i složeni postupci eksproprijacije, kao i druge nepredviđene okolnosti. JP Ceste F BiH u 2016.godini nisu planirale realizaciju projekata iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH" zbog provođenja procedura u vezi odobravanja, svih nivoa vlasti, kreditnog zaduženja. *Realizacija projekata iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH" direktno zavisi od povećanja javnih prihoda JP Ceste F BiH, što je uslov međunarodnih kreditnih institucija, te s toga napominjemo važnost i hitnost donošenja odluka od strane relevantnih institucija BiH o povećanju prihoda od naknada za putarine iz nafte i naftnih derivata.*

Modernizacija magistralne infrastrukture ima visok prioritet sa aspekta podizanja nivoa usluga, te usklađivanja sa potrebama društveno – ekonomskog razvoja i poboljšanja sigurnosti prometa. Program obuhvata veći broj projekata koji se mogu svrstati u dvije grupe i to:

- **I grupa** projekti izgradnje najznačajnijih dionica magistralnih cesta-poboljšanje elemenata u

postojećem koridoru i obilaznice oko gradova; i

- **II grupa** projekti sanacije/rekonstrukcije objekata (mostova i tunela), rekonstrukcije postojećih cesta i kolovozne konstrukcije - korekcija osovine, izgradnja trećih traka za spora vozila, sanacije/rekonstrukcije crnih tačaka i opasnih mjesta i dr.

Program su podržale međunarodne razvojne banke i to:	
Evropska investicijska banka (EIB)	50,00 mil.€
Evropska banka za obmnovu i razvoj(EBRD)	65,00 mil.€
Svjetska banka- Međunarodna banka za obnovu i razvoj(IBRD)	58,00 mil.€
UKUPNO	173,00 mil.€

Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske inveticijske banke (EIB) je potpisan u Sarajevu 26 januara, odnosno u Luksemburgu 23 februara 2016. Vlada Federacije BiH je 12 jula 2016 prihvatila zaduženje Federacije BIH po Ugovoru o finansiranju sa EIB.

Svjetska banka - Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) iskazala je spremnost da učestvuju u sufinansiranju troškova Projekta modernizacije u FBIH sa EIB. Kreditni sporazum između Bosne i Hercegovine i IBRD potpisan je 9 novembra 2016. Vlada Federacije BiH je 10.11.2016 prihvatila zaduženje Federacije BiH po IBRD kreditu.

U dijelu Programa koji će finansirati EIB i Svjetska banka-IBRD planirano je finansiranje dva značajna investiciona projekta (izgradnja-poboljšanje elemenata u postojećem koridoru Stolac-Neum i Kladanj - Podpaklenik preko prevoja Karaula), kao i srednja-manja investiciona ulaganja (izgradnja traka za spora vozila, rekonstrukcija/sanacija cestovnih objekata-mostovi i tuneli, rekonstrukcija cesta i kolovoza, eliminiranje crnih tačaka).

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je iskazala interes za pomoć BiH/FBiH u sanaciji šteta od poplava na magistralnim cestama i objektima i poboljšanju magistralnih cesta u FBiH u cilju unapređenja nivoa usluge i sigurnosti prometa, kao dio šireg investicionog Programa modernizacije u FBIH. Kreditni sporazum između Bosne i Hercegovine i EBRD za kredit u iznosu 65,00 mil. € potpisan je 13 juli 2016. Dio programa koji će finansirati EBRD obuhvata izgradnju - poboljšanje elemenata u postojećem koridoru (južna obilaznica Mostara- dovršetak dionice Međine - Miljkovići i izgradnju Miljkovići - Rodoč-veza M-17 I faza, Bihać-Bos.Krupa I faza izgradnja dionice Jablanska ulica - čvor Mali Lug, izgradnja ceste koja se vezuje na planiranu obilaznicu Bihaća I faza dionica Izačić -Kamenica), rekonstrukciju određenog broja objekata (16 mostova i 1 tunel), rekonstrukciju ceste M-5 Kaonik – Gromiljak otklanjanje šteta od poplava sa istovremenom modernizacijom odabranih dionica, izgradnju određenog broja obilaznica (obilaznica Bugojno, dovršetak izgradnje obilaznice Novi Travnik, obilaznica Bugojno, sjeverna obilaznica Grude, obilaznica Donji Vakuf). Vlada Federacije BiH je 10.11.2016 prihvatila zaduženje Federacije BiH po EBRD kreditu.

U cilju održivosti duga JP Ceste FBIH neophodno je osigurati održivi model finansiranja magistralne cestovne mreže, što podrazumjeva povećanje javnih prihoda JP Ceste FBIH, prije svega povećanje naknade za javne ceste iz nafte i naftnih derivata i prihoda od putarina prilikom registracije motornih vozila, koje čine najznačajniji dio ukupnih prihoda JP Cesta FBIH.

Očekuje se da će ulaganja koja čine Program modernizacije u FBIH biti izvršena tokom

četverogodišnjeg razdoblja. Dinamika realizacije projekata obuhvaćenih Programom modernizacije u FBIH uslovljena je provođenjem aktivnosti za prihvat i odobrenje kredita na nivou FBIH/BIH i ispunjenjem uvjeta za efektivnost s jedne strane i povećanjem javnih prihoda JP Ceste FBiH, prije svega povećanja naknade cesta iz nafte i naftnih derivata, što su uvjetovale i međunarodne razvojne banke, sa druge strane. Svako kašnjenje u provođenju postupka prihvata i odobrenja kredita, kao i u donošenju odluka, vezano za povećanje prihoda, imaće direktni utjecaj na kašnjenje implementacije projekata.

Potrebno je napomenuti da je JP Ceste FBiH krajnji korisnik kredita za prethodni program „Rehabilitacija cesta u Federaciji BIH" (EIB - 50,00 mil.€; EBRD - 45,00 mil.€ i WB - 8,20 mil.SDR), te je obveznik otplate istih. Otplate EIB i EBRD kredita su počele, te je JP Ceste F BiH, prema dostavljenim anuitetnim planovima, za otplatu ovih kredita u 2016 godini planirala sredstva u iznosu 12,65 mil.KM, od čega je realizovano 12,03 mil.KM.

Nabavke roba, usluga i radova finansiranih iz sredstava JP Ceste F BiH, obavljaju se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, dok se nabavke iz međunarodnih kreditnih sredstava obavljaju po međunarodnim procedurama kreditora.

U obavljanju poslova i zadataka na magistralnim cestama zakonom predviđenih aktivnosti, JP Ceste F BiH posebnu pažnju usmjeravaju na ispunjavanju potreba korisnika, zaštitu dobara, zaštitu dobra od opšteg javnog interesa i na zaštitu okoline.

Poslovne knjige i druge evidencije JP Ceste F BiH utvrđuje u skladu sa zakonima i Međunarodnim računvodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kojima se uređuje materijalno-finansijsko poslovanje i računovodstvene politike.

Za projekte finansirane iz Budžeta F BiH, a u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta F BiH, JP Ceste F BiH, redovno izvještava Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Po Odluci Vlade F BiH broj: 233/05, JP Ceste F BiH su angažovane na završetku LOT-a 2A, te implementaciji LOT-2C projekta Sarajevska obilaznica, koji se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH,vodi vanbilansno.

U nastavku detaljno su prikazani javni prihodi, rashodi, investicije u KM, kao i ostale aktivnosti koje su JP Ceste F BiH provodile tokom izvještajnog perioda.

A.I. JAVNI PRIHODI

Red. br.	OPIS	Šifra naknade	Realizovano 01.01.-31.12.2015.	Rebalans plana 2016.	Realizovano 01.01.-31.12.2016.	Index 6/5	Index 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Naknade od:**		**62.682.273**	**66.850.000**	**69.438.266**	**104**	**111**
	1.1 Nafte i naftnih derivata	717131	38.028.788	38.000.000	40.549.559	107	107
	1.2 Registracije - putarine - fizička lica	722532	11.974.221	15.400.000	15.399.120	100	129
	1.3 Registracije - putarine - pravna lica	722531	6.023.304	7.000.000	7.089.478	101	118
	1.4 "Pomoć informacija na cestama"	722535	4.590.817	4.800.000	4.759.366	99	104
	1.5 Korištenja cestovnog zemljišta	722538	1.673.823	1.300.000	1.266.510	97	76
	1.6 Vanrednih prevoza	722536 722534	257.575	250.000	265.517	106	103
	1.7 Prekomjerne upotrebe cesta (vage)	722537	133.745	100.000	108.716	109	81
2.	**Druga sredstva osigurana po posebnim propisima**		**655.349**	**535.000**	**515.313**	**96**	**79**
	2.1 Reklamni panoi	722539	395.668	350.000	336.469	96	85
	2.2 Kamata	722565	116.416	80.000	66.906	84	57
	2.3 Saglasnosti	722565	134.204	100.000	107.260	107	80
	2.4 Raspisani tenderi	722565	9.061	5.000	4.678	94	52
3.	**Naknadno utvrđeni prihodi**		**324.694**	**300.000**	**501.748**	**167**	**155**
	UKUPNO		**63.662.316**	**67.685.000**	**70.455.327**	**104**	**111**

JP Ceste F BiH su javni prihod planirale u iznosu od 67,69 mil.KM, koji je realizovan u iznosu od 70,46 mil.KM. Poredeći isti period prethodne godine sa sadašnjim, ostvaren je veći prihod za 6,79 mil.KM ili 11 %. Finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju magistralnih cesta osiguravaju se iz javnih prihoda, kredita i donacija /grantova, na osnovu člana 88. Zakona o cestama F BiH. Najveći prihod ostvaren je od naknada za putarinu od nafte i naftnih derivata u iznosu od 40,55 mil.KM. Ova vrsta javnog prihoda realizuje se na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14 i 60/14) i Zakona o uplatama na Jedinstven račun, a dalje se raspodjeljuje sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje prema raspodjeli prihoda. Naknade od putarina za fizička i pravna lica su realizovane u iznosu od 22,49 mil.KM, što je neznatno odstupanje od planiranih 22,40 mil.KM. Poredeći prihod za isti period predhodne godine i ove godine, isti je veći za 4,49 mil.KM. Uredbom o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila V broj: 202/2015 od 19.02.2015. izmjenjen je način obračuna putarine. Prihod od službe pomoći informacije na cestama ostvaren je u iznosu od 4,76 mil.KM, što je 99% od planiranih 4,8 mil.KM. Prihod od korištenja cestovnog zemljišta ostvaren je sa 1,27 mil.KM ili 97 % od planiranog 1,30 mil.KM, a 76 % od visine prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Vlada F BiH je 16.07.2015. usvojila Uredbu o izmjeni i dopunama visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas V broj:956/2015, sa znatno manjom visinom naknada u odnosu na prethodnu Uredbu, što se JP Ceste F BiH odrazila na smanjenje prihoda, po navedenom osnovu. Prihodi od naknada za postavljanje panoa u

cestovnom pojasu, prekomjerne upotrebe cesta (vage), vanredni prevozi, saglasnosti i ostalo je ostvaren u iznosu od 0,89 mil.KM, koliko je i planiran. Naknadno utvrđeni prihod relizovan je sa 0,50 mil.KM, a najveću stavku čine obračunate pozitivne kursne razlike na osnovu obaveza po kreditu Svjetske banke IDA broj:43710 za Program „Rehabilitacija cesta u F BiH", u iznosu od 0,36 mil.KM.

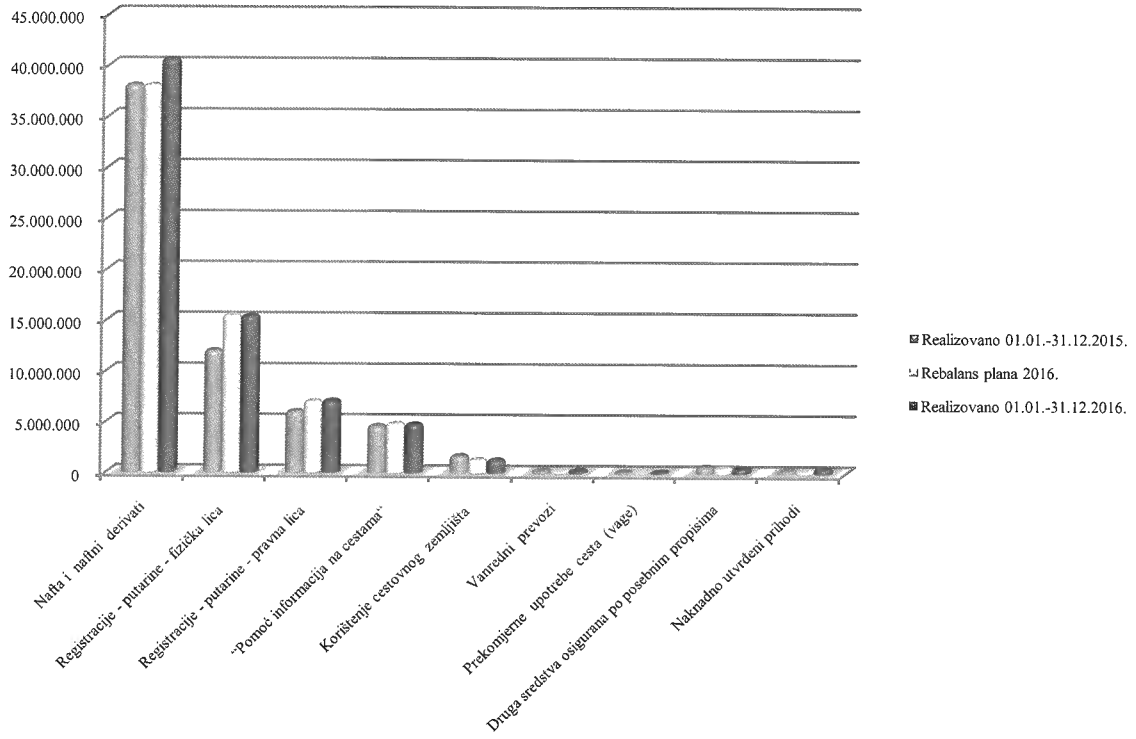

Grafički prikaz visine realizovanih prihoda u 2015.godini, planiranih prihoda Rebalansom 2016. i realizovanih 2016. godine

1. Naknade - učešće u strukturi javnih prihoda su slijedeće: **98,56 %**

1.1. od nafte i naftnih derivata – Na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH",br. 49/09, 49/14 i 60/14), putarina kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/litri za puteve, na jedinstven račun Uprave za indirektno oporezivanje. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve F BiH pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu sredstava predviđenih Projekcijom prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa korisnicima u Federaciji BiH za 2016. godinu. Na osnovu Projekcije prihoda Rebalansom su planirana sredstva u iznosu od 38,00 mil.KM, dok je ostvareni prihod po ovom osnovu 40,55 mil.KM, što je više za 2,55 mil.KM. Sredstva se uplaćuju, putem Federalnog ministarstva finansija, na transakcijski račun JP Ceste F BiH.

1.2. i 1.3 putarine za fizička i pravna lica – Naknada se uplaćuje na osnovu „Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila" V broj: 202/2015 od 19.02.2015. Navedenom Uredbom je pripisana visina godišnje naknade za javne ceste, koja se plaća pri registraciji motornih vozila. Rebalansom planirani prihod u iznosu od 22,40 mil.KM, realizovan je u cijelosti sa 22,49 mil.KM. Prihod po osnovu putarina je značajan i drugi je po redu veličina, sa učešćem u ukupnom prihodu od 31,92%.

1.4 službe "Pomoć i informacije na cestama"- Služba Pomoć-informacije predstavlja pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim cestama, uklanjanje sa javnih cesta oštećenih vozila i vozila u kvaru, davanje informacija o stanju prohodnosti cesta i pružanje druge pomoći. Zakonom o cestama F BiH i Odlukom Vlade Federacije BiH V broj: 45/11 („Službene novine Federacije BiH" br: 5/11.) definisana je ova vrsta naknade. Ostvareni prihod po osnovu naknade "Služba pomoć informacije" iznosi 4,76 mil.KM ili 99% od planiranih 4,80 mil.KM.

1.5. za korištenje cestovnog zemljišta - Zakonom o cestama F BiH, zaštitni pojas uz magistralnu cestu je pojas na kojem važi poseban režim gradnje i uspostavlja se s ciljem zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnih uticaja i različitih aktivnosti u prostoru pored ceste. Bez izdatog rješenja od strane JP Cesta F BIH ne može se koristiti zemljište. Vlada F BiH je 16.07.2015. usvojila Uredbu o izmjeni i dopunama visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas V broj:956/2015, sa znatno manjom visinom naknada u odnosu na prethodnu Uredbu. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta („Službene novine F BiH" broj:51/15.) propisuje da se na dionicama magistralnih i regionalnih cesta koje prolaze kroz gradove, naknada za korištenje cestovnog zemljišta ne naplaćuje. Takodjer, jedna od bitnih izmjena je naknada komunalnih, vodoprivrednih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih i drugih objekata koja se za prvu godinu plaća u punom obračunatom iznosu, a za svaku narednu godinu naknada se plaća u vrijednosti od 30% obračunatog iznosa prve godine korištenja. Prethodnim Pravilnikom visina naknade je iznosila 50%, što znači da je u obračunskoj godini došlo do pada prihoda po ovom osnovu u odnosu na prethodni period. Parlament F BiH je donio, na prijedlog Vlade F BiH, odluke kojima je nekoliko općina dobilo status gradova, gdje se odredbama spomenute Uredbe ne plaća naknada za korištenje cestovnog pojasa. Zbog svega navedenog JP Ceste F BiH su planirale prihod od 1,30 mil.KM, koji je realizovan u iznosu od 1,26 mil.KM. JP Ceste F BiH, potražuju po osnovu naknada korištenja cestovnog zemljišta i postavljanje reklamnih znakova u cestovnom pojasu 1,82 mil.KM.

1.6. i 7. od vanrednih prevoza i prekomjerna upotreba cesta (vage) Prevoz vozilima koja prazna ili zajedno sa teretom prelaze dozvoljenu težinu, osovinski pritisak ili dimenzije, odnosno granice dopuštenog opterećenja na magistralnim cestama smatra se vanrednim prevozom. Naknadu za vanredni prevoz uplaćuje podnosilac zahtjeva u skladu sa izdatim odobrenjem od strane upravitelja ceste. Planirani prihod u iznosu od 0,25 mil.KM od vanrednog prevoza realizovan je u iznosu od 0,27 mil.KM, dok prihod od prekomjerne upotrebe ceste (vage) ostvaren je u iznosu od 0,11 mil.KM,

2. 2. Druga sredstva - učešće u strukturi javnih prihoda su slijedeća: **0,73 %**

2.1 naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu - je propisana Zakonom o cestama F BiH, Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH" br:58/2015). Od planiranih 0,35 mil.KM, realizovan je

iznos od 0,34 mil.KM, što je 96%.

2.2,3,4. naknada za kamate, saglasnosti i raspisane tendere – realizovane su u iznosu od 0,18 mil.KM, što je 97 % od planiranih 0,19 mil.KM.

3. Naknadno utvrđen prihod - učešće u strukturi javnih prihoda 0,71 %

Obuhvata prihod od naplate šteta od osiguravajućih kuća, naplaćenih regresnih tužni i drugi neplanirani prihod. U strukturi prihoda najveću stavku čine obračunate pozitivne kursne razlike na osnovu obaveza po kreditu Svjetske banke IDA broj:43710 za Program „Rehabilitacija cesta u F BiH", u iznosu od 0,36 mil.KM.

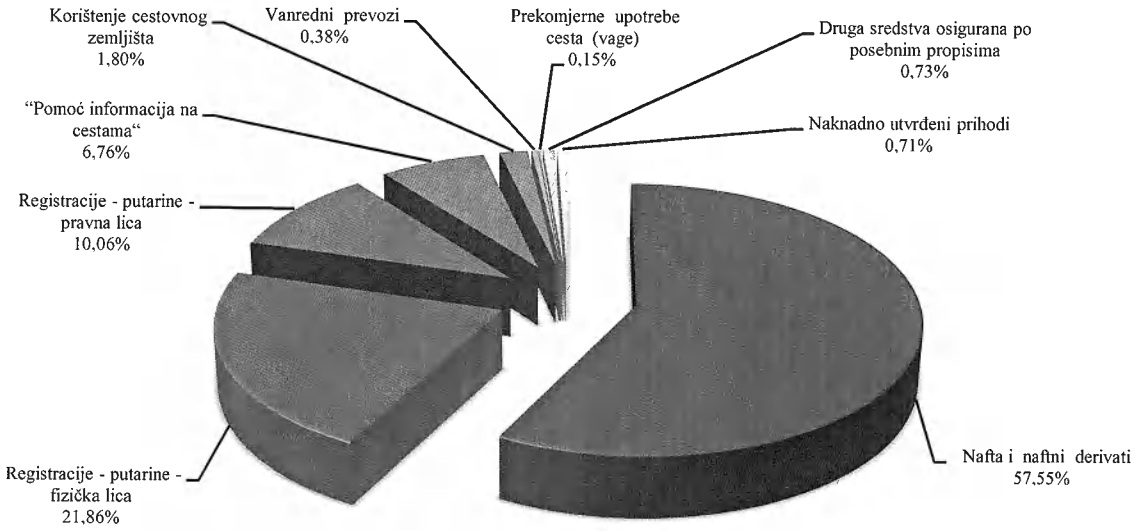

Grafikon prikazuje strukturu realizovanih javnih prihoda u 2016.godini.

A.II AMORTIZACIJA

Red. Br.	OPIS	Realizovano 01.01-31.12.2015.	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01-31.12.2016.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortizacija stalnih sredstava	892.374	850.000	813.704	96	91
	UKUPNO	**892.374**	**850.000**	**813.704**	**96**	**91**

Napomena: Objašnjenje amortizacije dato na strani 26.

B.I JAVNI RASHODI

Red Br.	OPIS	Realizovano 01.01.-31.12.2015.	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.-31.12.2016	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Troškovi poslovanja**	**4.754.033**	**5.196.500**	**4.989.842**	**96**	**105**
2.	**Služba pomoći i informacija**	**4.264.392**	**4.464.000**	**4.437.799**	**99**	**104**
3.	**Redovno održavanje**	**32.767.808**	**32.865.000**	**32.142.818**	**98**	**98**
4.	**Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode**	**4.152.929**	**500.000**	**6.802.142**	**1.360**	**164**
5.	**Rezervirana sredstva za sudske presude**	**1.610.617**	**2.300.000**	**2.353.775**	**102**	**146**
6.	**Troškovi konsultanstskih usluga**	**143.804**	**412.500**	**295.105**	**72**	**205**
7.	**Kamate, servisni troškovi i kursne razlike**	**2.933.336**	**1.400.000**	**1.525.356**	**109**	**52**
	U K U P N O	**50.626.919**	**47.138.000**	**52.546.837**	**111**	**104**

Od planiranih 47,14 mil.KM rashoda, realizovano je 52,55 mil.KM ili 11 % više od planiranih sredstava. Redovno održavanje čini najveću stavku sa 32,14 mil.KM, gdje su obuhvaćeni troškovi: zimske službe, glavni pregledi objekata i redovno održavanje mostova, troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa, održavanje elektropreme, održavanje brojača prometa kao i troškovi posipne soli. Nakon završetka zimske službe i obračuna radova na zimskom održavanju, zbog povoljnih vremenskih prilika, odnosno ispodprosječnih sniježnih padavina na pojedinim područima troškovi redovnog održavanja su smanjeni, iako je tokom godine Odlukama Vlade F BiH o razvrstavanju tri regionalna pravca u magistralna, povećan obim održavanja.Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode realizovana su 6,80 mil.KM, a najveću stavku čini situirani iznos 6,65 mil.KM za radove na projektu Podpaklenik-Kladanj, tunel Karaula, gdje nisu za cjelokupni iznos ugovora obezbjeđena sredstva. Troškovi poslovanja, troškovi službe pomoći i informacija, rezervirana sredstva za sudske presude, konsultantske usluge realizovani su po planiranoj dinamici i omjeru, dok su kamate servisni troškovi i kursne razlike realizovani sa 1,53 mil.KM, što je 9 % ili 0,13 mil.KM više u odnosu na planirana sredstva, zbog obračunatih negativnih kursnih razlika.

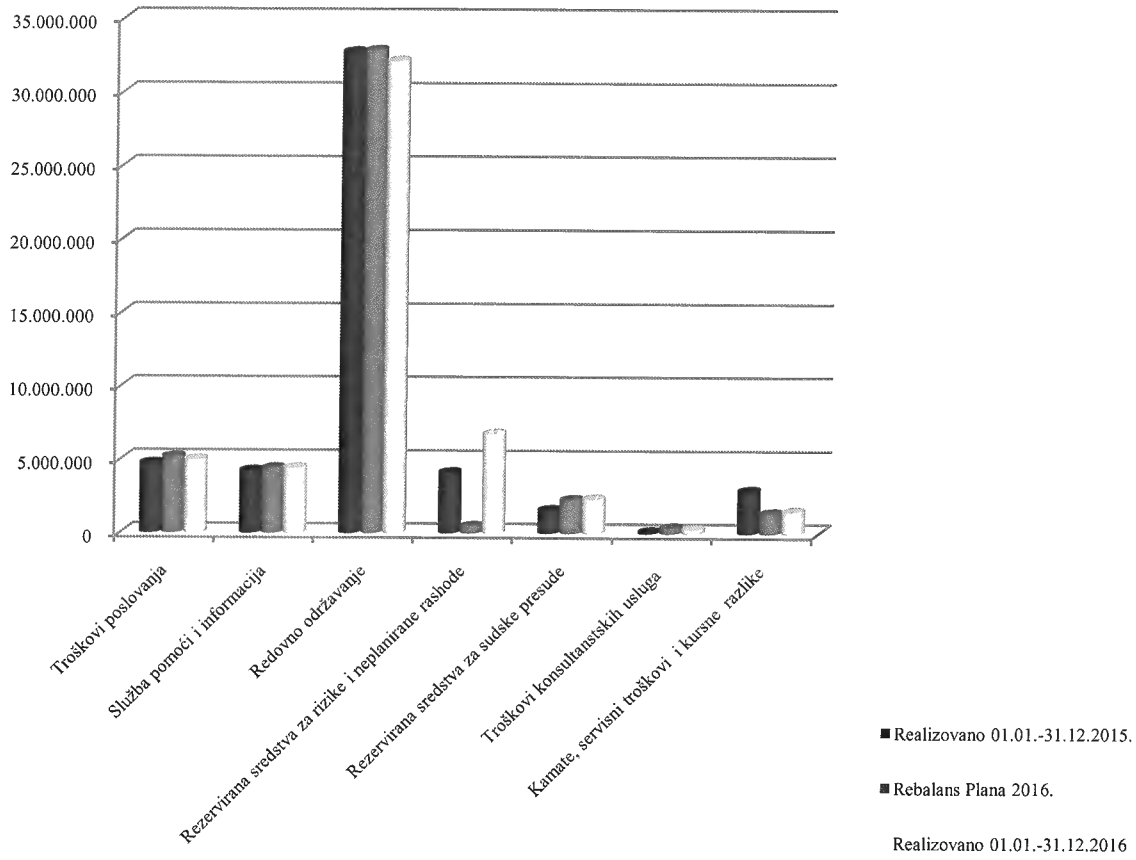

Grafički prikaz visine ostavrenih rashoda 2015. godine, planiranih Rebalansom 2016. i ostvarenih 2016.godine

1.Troškovi poslovanja

Red. br.	OPIS	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.-31.12.2016	Index 4/3
1	2	3	4	5
I	**Troškovi zaposlenih**	**3.991.000**	**3.943.990**	**99**
II	**Materijalni troškovi i usluge**	**1.205.500**	**1.045.852**	**87**
	UKUPNO I+II	**5.196.500**	**4.989.842**	**96**

Troškovi zaposlenih i materijalni troškovi i usluge su obuhvaćeni troškovima poslovanja. U izvještajnom periodu od planiranih 5,20 mil.KM realizovano je 4,94 mil.KM.

I Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih iznose 3,91 mil.KM, a obuhvćeni su troškovi bruto plaća zaposlenih, naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast (naknada troškova prevoza s posla i na posao, naknada za ishranu u toku rada – topli obrok, regres za godišnji odmor).

II Materijalni troškovi i usluge

Red. br.	OPIS	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.- 31.12.2016	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	kancelarijski i potrošni materijal	45.000	38.930	87
2.	električna energija	45.000	44.337	99
3.	gorivo i mazivo za automobile	85.000	62.899	74
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	15.000	11.855	79
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	200.000	154.031	77
6.	učešće na sajmovima i seminarima	20.000	16.200	81
7.	stručna literatura i časopisi	10.000	10.574	106
8.	grijanje	50.000	28.254	57
9.	zakupnina	40.000	37.670	94
10.	reklama i propaganda	30.000	7.274	24
11.	osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi	60.000	66.647	111
12.	bankarske usluge	15.000	6.960	46
13.	reprezentacija	30.000	29.419	98
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	35.000	40.814	117
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	32.000	32.951	103
16.	privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu	35.000	33.370	95
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	75.000	68.672	92
18.	održavanje čistoće	56.000	51.595	92
19.	obezbjedjenje zgrade	8.000	7.288	91
20.	PTT usluge	90.000	100.394	112
21.	komunalne usluge	15.000	13.128	88
22.	stručno osposobljavanje	5.000	1.256	25
23.	tenderi, konkursi i oglasi	30.000	31.989	107
24.	takse	30.000	28.452	95
25.	advokatske usluge i trošk.vještačenja	10.000	14.594	146
26.	troškovi eksterne revizije	17.500	17.527	100
27.	troškovi Odbora za reviziju	16.000	14.674	92
28.	ostali troškovi poslovanja	30.000	26.685	89
29.	kamate i kursne razlike	1.000	475	48
30.	naknadno utvrdjeni rashodi	40.000	24.292	61
31.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	25.000	21.202	85
32.	troškovi ulaganja u tuđe građevinske objekte	10.000	1.444	14
	U K U P N O II	**1.205.500**	**1.045.852**	**87**

Od ukupno planiranih 1,21 mil.KM sredstava za materijalne troškova i usluge, realizovano je 1,05 mil.KM ili 87 % od planiranih. Iako u ukupnom iznosu planirana sredstva nisu prekoračena, jer je većina troškova realizovana u okviru planiranih sredstava, ipak je kod nekih planiranih stavki došlo do odstupanja, gdje bi izdvojili:

- troškove stručne literature i časopisa gdje obuhvaćena pretplata za službene listove, stručne časopise, priručnike i savjetnike iz raznih oblasti, a najviše iz pravne i ekonomske, gdje došlo do izmjena zakonske regulative;
- do prekoračenja planiranog budžeta je došlo zbog troškova sistematskog pregleda, jer je ugovor zaključen u 2015.godini, a većina radnika je obavila preglede u izvještajnoj godini. Inače, za

osiguranja imovine i lica utrošeno je 0,05 mil.KM, od čega na osiguranje vozila 0,04 mil.KM, dok su zdravstvene usluge (sistematski pregledi) realizovane sa 0,02 mil.KM;

- naknade za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, gdje se zbog Programa „Modernizacija cesta u FBiH", koji je u fazi pripreme, odvijaju mnoge aktivnosti, od pregovaranja sa kreditorima u inostranstvu do poslova eksproprijacije za projekte planirane Programom;
- troškovima PTT usluga obuhvaćeni su troškovi interneta, fiksne i mobilne telefonije (TOP tim) i troškovi poštanskih usluga, koji u strukturi ovih troškova čine najveću stavku (0,04 mil.KM)
- troškovi oglašavanja u javnim sredstvima odnose se na troškove javnog oglašavnja u printanim medijima, što je zakonska obaveza JP Ceste F BiH i
- advokatske usluge i troškovi vještačenja su veći za 46% od planiranih veličina, zbog troškova vještačenja procijene vrijednosti slijedećih dionica: M17.4 Mostar - Čitluk - Tromeđa - Teskera - Crveni Grm dužine 43km, M14.2 Orašje - Odžak dužine 34km i Ormanica - Gradačac - Slatina dužine 20 km, vezanih za prekategorizaciju cesta.

2. Služba "Pomoć - informacije na cestama"

Služba «Pomoć-informacije" na cestama Federacije BiH (u nastavku „SPI") povjerena je kao javno ovlaštenje JP Ceste F BiH po odredbama člana 100. stav 2. Zakona o cestama Federacije BiH, a posebna naknada za SPI regulisana je na osnovu člana 88. tačke 5. i člana 100. stav 3 Zakona o cestama F BiH i Odluke o službi „Pomoć-informacije" (Vlada Federacije BiH, od 20. januara 2011. godine).

Po osnovu člana 100. stav 2 Zakona o cestama F BiH, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl. glasnik BiH» br. 39/14), a u skladu sa uslovima definsanim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe «Pomoć-informacije» na cestama F BiH i na osnovu provedenog otvorenog postupka, za period: 01.01.2016. - 31.12.2016. godine, te na osnovu Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga SPI na javnim cestama u F BiH su sklopljeni ugovori za 2016. godinu sa:

- **Auto moto savez u Bosni i Hercegovini (**skraćeni naziv **AMS u BiH)** Mostar za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Posavskog kantona (1 vozilo), Kanton Središnja Bosna (3 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kanton (3 vozila), Zapadnohercegovačkog kantona (2 vozila) i Kanton 10 (2 vozila) i

- **BIHAMK** (Bosanskohercegovački auto-moto klub) Sarajevo za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Unsko-sanskog kantona (4 vozila), Tuzlanskog kantona (5 vozila), Zeničko-Dobojskog kantona (4 vozila), Bosansko-podrinjskog kantona (1 vozilo), Srednjo-bosanskog kantona (2 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kantona (4 vozila) i Kantona Sarajevo (5 vozila + 1 vozilo-spec.vozilo «rescue car»).

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste FBiH. Nadzor nad radom Službe «Pomoć-informacije» obavlja ovlašteno lice JP Ceste FBiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI. Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu mjesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstatuje nađeno stanje.

Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti uključeno. Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije, kontroliše se izvještaj koji sadrži navedene elemente i finacijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene usluge i nabavke).

Prema dostavljenim mjesečnim obračunskim situacijama tokom 2016. godine ostvaren je slijedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI:

Red br.	Izvršitelj usluga SPI	Prispjela sredstva	% umanjenje po osnovu člana 5. Ugovora **	Obaveza Razlika (2-3)	Vrijednost situiranih radova	Razlika (4-5) *
	1	2	3	4	5	6
1	BIHAMK Sarajevo	3.801.744	256.865	3.544.879	3.527.939	*16.940*
2	AMS U BIH Mostar	957.622	64.702	892.920	888.673	*4.247*
UKUPNO		**4.759.366**	**321.567**	**4.437.799**	**4.416.612**	***21.187***

Pregled obima poslova i prihoda po osnovi naknade za poslove SPI za 2016. godinu

Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2016. godini za SPI je bio manji za :

- 16.940 KM kod BIHAMK-a i
- 4.247 KM kod AMS u BIH

pa će taj dio razlike novčanih sredstava biti uvećan AMK-a u situaciji za februar 2017. godine.

** Procentualno umanjenje iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2016. godinu, u iznosu od 6,7565 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po konačnom obračunu JP Ceste FBiH).

Za navedene i izvršene poslove SPI u Federaciji BiH, tokom 2016. godine, utrošena su ukupna sredstva kako slijedi:

Pomoć na cesti	3.588.332 KM
Informiranje	658.449 KM
Prometno-preventivne aktivnosti	191.018 KM
U K U P N O :	4.437.799 KM

Zaključno, BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub, Sarajevo) i AMS u BIH (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini, Mostar) su poslove pomoći na cesti, informisanja i prometno-preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti s obzirom na priliv financijskih sredstava.

3.Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

Procedura postupka javne nabavke za potpisivanje novih sporazuma za naredni četverogodišnji period je pokrenuta u ljeto 2012. godine i za 11 od 12 LOT-ova, potpisani su okvirni sporazumi sa izvođačima radova za period 01.09.2014. - 31.08.2018. te jednogodišnji ugovori za period 01.09.2015 - 31.08.2016 godina.

Za LOT 11 (magistralne ceste na području Herceg-Bosanskog kantona-regija Livna), zaključen je Okvirni sporazum po principu «Dobro izvršenje radova održavanja» (pilot projekat) u skladu sa preporukama Evropske investicijske banke. Sporazum je sklopljen za period 01.09.2014. - 31.08.2018. godine.

Za LOT 7 (dio magistralnih cesta u HNK) procedura nabavke nije okončana zbog žalbenog postupka ponuđača, pa je u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH produžen stari okvirni sporazum, i potpisan ugovor za izvođenje radova (stari LOT 12) koji vrijedi do okončanja postupka nabavke,

Nakon završetka zimske službe i obračuna radova na zimskom održavanju, zbog povoljnih vremenskih prilika, odnosno ispodprosječnih sniježnih padavina na pojedinim područima FBiH, pokazalo se da su planirana ukupna sredstva za zimsku službu ostala neutrošena u visini od cca 2,60 mil. KM (oko 24,8 % planirane vrijednosti). Uz saglasnost Uprave JP Ceste FBiH neutrošena sredstva zimske službe su iskorištena za neophodne radove redovnog održavanja cesta.

Do izmjene planiranih sredstava na LOT-u 3, LOT-u 9 i LOT-u 12 je došlo zbog prekategorizacije 3 dionice iz regionalnih u magistralne ceste. Radi se o dionici M-17.4 Mostar-Ljubuški-Crveni grm za koju je završen postupak primopredaje, i od 01.06.2016. je pridodata ugovoru na LOT-u 12 redovnog održavanja, dok je primopredaja cesta M-1.9 Gradačac - Ormanica i M-14.2 Odžak – Šamac - Orašje i preuzimanje njihovog održavanja započelo od 15.11.2016.

Pregled ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta za period 01.09.2016. - 31.08.2017.

Red.br	LOT	Ivođač	Broj ugovora	Ugovoreno
			01.09.2016-31.08.2017	
1.	LOT1	Rad-putevi Bihać	01-02.2-7452/16	2.607.367
2.	LOT2	Kov-grad Bužim	01-02.2-7453/16	2.049.978
3.	LOT3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	01-02.2-7454/16	3.829.588
	LOT3**	Anex Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice	01-02.2-11438/16	76.649
4.	LOT4	Dobojputevi Doboj jug	01-02.2-7455/16	2159.977
5.	LOT5	Rudnici gipsa Donji Vakuf	01-02.2-7456/16	1.899.987
6.	LOT6	Goraždeputevi Goražde	01-02.2-7457/16	1.399.989
7.	LOT7*	PZP Mostar	01-02.2-7458/16	1.659.735
8.	LOT8	Sarajevoputevi Sarajevo	01-02.2-7459/16	2.209.966
9.	LOT 9	Ceste Mostar	01-02.2-7460/16	539.635
	LOT 9***	Anex Ceste Mostar	01-02.2-11355/16	367.273
10.	LOT10	Ceste Mostar	01-02.2-7461/16	2.559.917
11.	LOT11	Ceste Mostar	01-02.2-7462/16	5.237.964
12.	LOT12****	Ceste Mostar	01-02.2-7463/16	3.779.976
		UKUPNO		**30.378.001**

Napomena:

*Na LOT-u 7 ugovor sa PZP Mostar potpisan je za period 01.09.2016.-31.08.2017, odnosno do završetka postupka nabavke.

**Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj:1020/2016. Regionalna cesta R-402 Ormanica-Gradačac-Slatina(gr.ent), razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M 1.9. Potpisan je Anex ugovora za radove redovnog održavanja navedenog pravca za period 15.11.2016. do 31.08.2017. g. vrijednosti 76.649 KM, po osnovu Ugovora redovnog održavanja LOT-a 3. Navedena dionica je duga 19,68 km. Pored navedenog, Anexom ugovora je obuhvaćeno i redovno održavanje novoizgrađenog tunela Karaula i pripadajuće trase na magistralnoj cesti M-18 za period 15.11.2016. do 31.08.2017.

***Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj: 1020/2016. Regionalna cesta R-464 Orašje-Šamac-Odžak razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M14.2. Potpisan je Anex ugovora za radove redovnog održavanja navedenog pravca za period 15.11.2016. do 31.08.2017. g. vrijednosti 367.273 KM, po osnovu Ugovora redovnog održavanja LOT-a 9. Navedena dionica je duga 31,47 km.

****Na osnovu Odluke Vlade F BiH Vbroj:1737/15. Reginalna cesta R-424 Mostar-Čitluk-Tromeđa - Ljubuški-Teskera-Crveni grm, razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M17.4. Potpisanim Ugovorom za Lot 12, obuhvaćeno je redovno održavanje i ove ceste.

Nabavka i transport soli do punktova za zimsko održavanje cesta na teritoriji F BiH za zimu 2016/2017.

LOT 1- Macot Sol d.o.o.Mostar – 01-02.2-8490/16, 22.09.2016. na iznos 859.687 KM, za količinu 4.750 tona soli NaCl granulacije 0/4.

LOT 2 Solana d.d. Tuzla, ugovor broj:01-02.2-8489/16, 22.09.2016. na iznos 1.132.940 KM. Količina 4.825 tona soli NaCl granulacije 0/1.

LOT 3- Macot Sol d.o.o.Mostar – 01-02.2-8490/16, 22.09.2016. na iznos 203.346 KM, 220 tona soli CaCl2.

Dio isporuke po navedenim ugovorima je izvršen tokom novembra i decembra 2016 godine, a ostala isporuka će se vršiti sukcesivno tokom januara i februara 2017 godine.

Pregled realizacije radova redovnog održavanja za period 01.01-31.12.2016. g.

LOT	Mag. Cesta	Dužina u km	Dionice magistralnih cesta	Rebalans Plana 2016.			Realizovano 01.01.-31.12.2016.		
				Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno
1. L=207,73km	M5	111,894	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent)	1.430.000	1.050.000	2.480.000	1.428.875	1.076.088	2.504.963
	M11	8,526	Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske)						
	M14	11,666	Bihać-Srbljani						
	M14.2	26,337	Bosanski Petrovac-Drvar						
	M15	49,303	(gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ						
2. L=141,52 km	M4.2	51,343	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani	1.125.000	815.000	1.940.000	1.124.288	820.142	1.944.430
	M14	37,538	Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta)						
	M14.2	52,642	Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac						
3. L=226,5km	M1.8	40,849	(gr.ent)-Arizona(gr.distr) (Gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod	2.410.000	1.500.000	3.910.000	2.427.778	1.472.663	3.900.441
	M4	64,404	Donja Orahovica-Tuzla-Kalesija-Memići(gr.ent)						
	M14.1	13,021	(gr.ent)-Gradačac-(gr.ent)						
	M18	82,003	(gr.ent.)Banj Brdo_Simin Han Šićki Brod-Kladanj-Olovo						
	M19.2	11,867	Vitalj-(gr.ent)						
	M1.9	14,357	Gradačac-Ormanica						

Nastavak tabele:

4. L=139,44 km	M4	38,462	(gra.ent)Jelah-Karuše (gran.ent.) Stanić Rijeka-Gračanica-Donja Orahovica	1.420.000	660.000	2.080.000	1.498.173	630.400	2.128.573
	M17	100,982	(gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješevo Lašva-Kaonik						
5. L=131,68 km	M5	80,817	(gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje	1.150.000	750.000	1.900.000	1.120.427	694.313	1.814.740
	M16	50,859	(gr.ent) crne Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica						
6. L=93,335km	M5	13,998	(gran.ent.)Prača-Hrenovica(gr.ent.)	860.000	450.000	1.310.000	858.761	463.093	1.321.854
	M18	6,016	(gr.ent.)Bogatići-Trnovo(gr.ent.)						
	M18.1	46,281	Ustikolina-Grebak-Trnovo						
	M20	27,040	(gr.ent.)Ustikolina-Goražde(gr.ent.)						
7. L=126,54km	M6.1	24,087	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent)	1.000.000	480.000	1.480.000	993.941	483.066	1.477.007
	M14.2	30,075	Prozor-Jablanica						
	M17	72,376	Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice						
8. L=127,86km	M5	26,581	Zelena meraja-Most.raskršće Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica Jošanica-Stup	1.360.000	850.000	2.210.000	1.356.997	812.208	2.169.205
	M17	47,002	Stup-Tarčin-Konjic						
	M18	54,273	Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup-Dobrinja (gran.ent)						
9. L=65,13km	M1.8	7,992	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent)	500.000	230.000	730.000	359.178	211.274	570.452
	M14.1	24,664	(gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent)						
	M14.2	31,47	Odžak- gr.entiteta i gr. Ent.Orašje						
10. L=136,12km	M5	57,991	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena Meraja	1.675.000	910.000	2.585.000	1.674.783	848.504	2.523.287
	M16.2	39,509	Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor						
	M16.4	38,618	Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje						
11. L=346,55km	M6.1	158,025	(gr.Hrvatske) Kaldrma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrila	2.960.000	2.280.000	5.240.000	2.958.923	2.264.611	5.223.534
	M14.2	33,355	Drvar-Resanovci Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske)						
	M15	95,643	(gr.ent)-Glamoč-Priluka Livno-Kolo						
	M16	56,587	Tunel K.Vrata-Kupres- Šujica Livno-Kamensko-(gr.Hrvatske)						
	M16.3	2,935	Renjići-Prisika (gr.Hrvatske)						
12. L=318,86km	M2	9,258	Gr.Hrvatske-Neum-gr.Hrvatske	3.000.000	800.000	3.800.000	3.017.837	778.298	3.796.135
	M6	85,004	Gr.Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr.ent.						
	M6.1	61,347	Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar						
	M15	3,111	Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske						
	M17	38,582	Gnijnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske)						
	M17.3	71,721	Buna-Masline Stolac-Hutovo -Neum						
	M20	8,49	Gr.Hrvatske-Duži-gr.entit.						
	M17.4	41,35	Mostar-Ljubuški-Crveni Grm						
		2.060,25	**U K U P N O**	**18.890.000**	**10.775.000**	**29.665.000**	**18.819.961**	**10.554.660**	**29.374.621**

Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata

Red. br.	Mag. cesta	Dionica	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016.	Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2016
1.	M 6.1	011	Izrada noveliranog prometnog projekta na dionici: Mostar – Gnojnice - gr. entiteta, L=21,7 km;	Projektovanje	14.000	Ipsa Institut d.o.o. Divel d.o.o. Saraj. 01-02.2-6917/16, 08.08.2016.	13.642	14.709
				Revizija	1.200	Institut za saob.i Kom. Sarajevo. 01-02.2-10082/16, 11.11.2016	1.067	

Nastavak tabele:

2.	M 18	005	Izrada noveliranog prometnog projekta na dionici: Simin Han – Banj Brdo - gr. entiteta, L=16 km	Projektovanje	10.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6917/16, 08.08.2016.	9.922	10.764
				Revizija	1.300	Institut za saob. i komunikacije Sarajevo, 01-02.2-10082/16, 11.11.2016	842	
3.	M 18	005	Izrada noveliranog prometnog projekta na dionici: gr. entiteta-Bogatići – Trnovo - gr. Entiteta, L=6 km	Projektovanje	4.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6917/16, 08.08.2016.	3.717	4.103
				Revizija	500	Institut za saob. i komunikacije Sarajevo, 01-02.2-10082/16, 11.11.2016	386	
4.	M 14.2	003 005	Izrada noveliranog prometnog projekta na dionici: Bos. Petrovac – Drvar – Bos. Grahovo- gr. Hrvatske (Strmica), L=78 km	Projektovanje	48.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6917/16, 08.08.2016.	47.482	51.132
				Revizija	3.000	Institut za saob. i komunikacije Sarajevo, 01-02.2-10082/16, 11.11.2016	3.650	
			UKUPNO		**82.000**			**80.708**

-Redovno održavanje mostova na magistralnim cestama

Naziv	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2016.
Redovno održavanje mostova	AIK Inžinjeringd.o.o. Banovići01-02.1-8693/15 12.10.2015.	124.817 (preneseno 23.791)	23.791
	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-8443/16, 20.09.2016	254.459	203.282
Glavni pregledi mostova M5 – 016 - 433 petlja Korija u Sarajevu na M5 016 dionica: Azize Šećerbegović – Korija - Ljubogošća km 6+394,	Trasa d.o.o. Sarajevo01-10301/15, 08.12.2015	6.786 (preneseno 3.393)	3.393
UKUPNO			**230.466**

Sa AIK Inžinjeringom d.o.o. Banovići potpisan je ugovor broj:01-02.1-8693/15 dana 12.10.2015. godine na iznos od 124.817 KM za održavanje mostova. Ugovor je dijelom realizovan u 2015 godini, dok je u izvještajnom perodu okončan. (23.791KM). Ugovor za održavanje mostova u 2016. godini je, na osnovu otvorenog postupka javne nabavke, zaključen sa HP Investing d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1-8443/16. od 20.09.2016. godine, na iznos 254.459 KM.

Usluge **glavnog pregleda mosta** (M5 – 016 - 433) petlja Korija u Sarajevu na M5 016 dionica: Azize Šećerbegović – Korija - Ljubogošća km 6+394, uradila je Trasa d.o.o. Sarajevo, na osnovu ugovora broj:01-10301/15, 08.12.2015, na iznos 6.786 KM. Drugi dio ugovora okončan je u izvještajnom periodu u iznosu od 3.393KM.

-Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje) Ugovor broj: 01-02.2-8838-1/15 potpisan dana 19.11.2016. sa JP Željeznice F BiH d.o.o. Sarajevo, na iznos 26.732 KM (bez PDV-a), od čega 50% snosi JP Ceste F BiH. Predmet ugovora je održavanje slijedećih pružnih prelaza: Čuvarnica br: od 13 do16,16a,

17 i PPr „Blok III-Bihać, što podrazumjeva održavanje kolovoza, uređaja za davanje svjetlosno zvučnih znakova kojim se učesnicima u prometu, na cestama, najavljuje približavanje voza putnom prijelazu, uređaja za zatvaranje saobraćaja na putnom prijelazu osiguranje urednog i nesmetanog saobraćaja na putnim prijelazima, troškove osvjetljenja i druge neophodne troškove.
Tokom 2016. godine izvršena je sanacija samo jednog pružnog prelaza – Blok III-Bihać, za što je JP Željeznice F BiH ispostavilo račun od 7.868 KM što je 50% ukupnih troškova.

-Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)

Potpisani su okvirni sporazumi kojima se regulišu okvirna pitanja vezana za nabavku radova redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F BiH:

- LOT 1- ELKO - Marić Mostar, broj: 01-02.4-6376/13, 23.07.2013. - 232.345KM, (period: 01.08.2013.-31.07.2017.)
- LOT 2-A Eling d.o.o. Zenica, broj: 01-02.4-6958/13,20.08.2013. - 156.422KM, (period: 22.08.2013.-21.08.2017.)
- LOT 3- Step d.d. Sarajevo, broj: 01-02.2-6378/13, 23.07.2013. - 152.104KM, (period: 01.08.2013.- 31.07.2017.)

Za održavanje semaforskih uređaja i opreme na magistralnim cestama potpisan je okvirni sporazuma za period 2013 - 2017.godina za sva tri LOT-a sa firmom STEP d.d. Sarajevo na ukupan iznos 641.284 KM.

Troškovi redovnog održavanja elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa, su realiziovani prema stvarnom utrošku odnosno prema fakturama Elektrodistribucije.

Naziv i opis projekta	Rebalans Plana 2016.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2016.
Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrižja, semafori i trafo stanice)	350.000	-Step d.d. Sarajevo, (LOT1,2,3) 01-02.2-6034/15.02.07.2015.	167.326 (preneseno 49.985	49.814
		-Step d.d. Sarajevo 01-02.2-6964/15, 06.08.2015.	43.894 (preneseno 35.388)	27.289
		LOT 2 A Eling Zenica, 01-02.2-7812/1, 08.09.2015	39.105 (preneseno 3.485)	3.475
		LOT 1Elko Marić d.o.o. Mostar, 01-02.2-7049/15, 10.08.2015.	58.086	55.821
		LOT 1 Elko Marić d.o.o. Mostar, 01-02.2-7832/16, 01.09.2016.	58.086	0
		-Step d.d. Sarajevo, (LOT1,2,3) 01-02.2-6187/16, 15.07.2016.	136.533	37.383
		A Eling d.o.o. Zenica, 01-02.2-8324/16, 16.09.2016	18.555	15.278
Izvođenje radova redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na mag.cestama u F BiH za period 01.05.-31.05.2016.		-A Eling d.o.o. Zenica, 01-02.2-3485/16, 22.04.2016.	8.380	8.380
Izvođenje radova redovnog održavanja semaforskih uređaja i oprema na magist.cestama u F BiH za period 01.05.-31.05.2016.		-Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-3465/16, 22.04.2016.	16.758	16.758
UKUPNO	**350.000**			**214.198**

-Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola

Ugovor broj: 01-02.2-11434/16 potpisan sa Sacom d.o.o. Sarajevo 23.12.2016. na iznos 20.297 KM, što je i realizovano.

Izrada glavnog projekta koodinacije 5 semaforskih raskrsnica na cesti M5 u Travniku „zeleni val" - TZI Inžinjering d.o.o Sarajevo, ugovor broj 01-02.2-9574/16, 26.10.2016. vrijednosti 6.575 KM.

REKAPITULACIJA ULAGANJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE

O P I S	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.
REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA	**29.665.000**	**29.374.621**
Redovno održavanje mostova	300.000	227.073
Glavni pregledi objekata (složenih)	20.000	3.393
Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	450.000	460.485 6.951
Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	25.000	7.868
Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata	82.000	80.708
Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)	350.000	214.198
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola	100.000	0
Redovno održavanje brojača prometa	13.000	0
Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om	75.000	0
Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola	25.000	20.297
Utrošak soli NaCl i $CaCl_2$	1.760.000	1.740.649
Izrada glavnog projekta koodinacije 5 semaforskih raskrsnica na cesti M5 u Travniku „zeleni val"		6.575
UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE	**32.865.000**	**32.142.818**

4.Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode

Naziv	Rebalans Plana 2016.	Konsultant/Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode				
Projekat sanacija klizišta na M17, Kosova		Eksproprijacija, vještačenje		9.126
Radovi hitne sanacije oštećenja mosta M18_010_555 preko rijeke Bosne, željezničke pruge i M5 u Jošanici na cesti M18, dionica:Semozivac-Sarajevo-Malta, km 2+213	500.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10348/16, 21.11.2016.	29.940	29.546
Otpis nenaplaćenih kretkoročnih potraživanja (PDV vezan za projekte Rehabilitacije cesta)				112.337

Nastavak tabele:

		Strabag AG Austrija, 01-02.3-4109/14, 14.04.2014.	24.257.083	6.282.725
Izgradnja tunela Karaula, dionica:Potpaklenik-Kladanj		JV: Rougthon internacional Ltd& Ipsa institut Sarajevo i Geotehnički studio, 01-02.3-4110/14, 14.04.2014.anex 01-02.3-9392/16.	914.718 453.090	368.408
UKUPNO	**500.000**			**6.802.142**

-Projekat sanacije klizišta na M17 Maglaj-Doboj, lokacija Kosova je okončan u 2015. godini, kao i klizište Banj brdo, gdje ugovori o vještačenju, zapisnici o eksproprijaciji terete rashode perioda.

- Zbog oštećenja na mostu M18_010_555 preko rijeke Bosne, željezničke pruge i M5 u Jošanici na cesti M18, dionica: Semozivac-Sarajevo-Malta, km 2+21, Sikra d.o.o. Sarajevo je okončalo hitnu sanaciju mosta, na osnovu ugovora broj: 01-02.1-10348/16.

- Po osnovu Programa „Rehabilitacija cesta u F BiH", okončanog 2013.godine, otpisana su potraživanja za PDV u iznosu od 0,11 mil.KM.

- Na osnovu provedene procedure po EIB-ovim pravilima aprila 2014. godine je zaključen ugovor za izvođenje sa Strabagom AG, na iznos od 24,26 mil.KM i nadzor: konzorcij Roughton&Pil i Ipsa Sarajevo od 0,91 mil.KM i Anex ugovora broj 01-02.3-9392/16, 20.10.2016. na iznos 453.030 KM.

(svi ugovori sa PDV-om). Za projekat su iz GSM licence obezbjeđena sredstva u iznosu 10,00 mil.KM, koja su utrošena za radove i nadzor. U razgovorima sa predstavnicima EIB banke je zaključeno da se sredstva GSM licence iskoriste kao naše učešće u budućem kreditnom sporazumu, kroz Program „Modernizacija cesta u F BiH". Obzirom da tokom 2016.godine nije potpisan kreditni sporazum, a sredstva obezbjeđena za radove iz GSM licence tokom 2014. i 2015. godine su realizovana, a da ne bi došlo do zastoja na projektu, JP Ceste F BiH su finansirale dio radova i nadzor iz svojih sredstava. Situirano je u 2016 godini, za radove i nadzor 6,65 mil.KM, od čega je plaćeno 0,99 mil.KM. Zaključno sa 31.12.2016. radovi su realizovani u iznosu od 18,75 mil.KM, a nadzor 1,27 mil.KM.

5. Rezervirana sredstva za sudske presude

NAZIV	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.-31.12.2016.
Rezervirana sredstva za sudske presude	2.300.000	Rezervirana sredstva 951.603 Troškovi po sudskim presudama 85.302 Realizovana sredstva za tužbu 1.103.753 Zatezne kamate 213.117
UKUPNO	**2.300.000**	**2.353.775**

Poštujući preporuku Ureda za reviziju institucija u F BiH i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, JP Ceste F BiH su na osnovu zaprimljenih tužbi rezervirale sredstva za utužene predmete, nastale zbog saobraćajnih i drugih nezgoda na magistralnim cestama iznos od 0,95 mil.KM. Tokom godine realizovana je tužba za koju nisu rezervirana sredstva u iznosu od 1,10 mil.KM, na zatezne kamate po sudskim sporovima utrošeno je 0,21 mil.KM, dok upravni i sudski troškovi po sudskim presudama iznose 0,09 mil.KM.

6. Troškovi konsultantskih usluga

Red br.	NAZIV	Rebalans Plana 2016.	Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.
1.	Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu	12.000	UNSA Građevinski fakultet, Sarajevo 01-02.1-5633/16, 28.06.2016.	11.349	11.349
2.	Troškovi izrade projekta izvedenog stanja slijedećih dionica: -M5,Most preko rijeke Bosne Rajlovac 3+000 do Petlje Stup 8+628, dionica Sarajevske obilaznice, Lot 2A -M16.4, Bugojno-Novi Travnik, od 16+100 (Rostovo) do 24+100 (Sinokos) za potrebe uknjižbe katastra magistralnih cesta	55.000	Sarajinžinjering d.o.o. Sarajevo i Zedis d.o.o. Zenica 01-02.5-11590/16, 30.12.2016.	44.792	4.040
3.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova	52.000	OD Putna laboratorija 1957 Sarajevo, 01-02.2-10741/15 22.12.2015.	7.020	7.020
4.	Troškovi održavanja baze inftrastrukture podataka - SUGOC-a i ROC-a	106.000	TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB informatika d.o.o.Sarajevo 01-02.2-5407/16, 20.06.2016.	105.791	81.748
	Izrada studije sa analizom postojećeg stanja i prijedlog mjera za efikasnu i racionalnu potrošnju električne energije, sa izradom tehničkog dijela tenderske dokumentacije za nabavku električne energije		UNSA Elektrotehnički fakultet Sarajevo 01-02.2-9031/15, 27.10.2015	46.393	34.794
5.	Izrada elaborata izmjene i dopune glavnog projekta rasvjete tunela Jelašje –	35.000	UNSA Elektrotehnički fakultet Sarajevo, 01-02.2-7370/16, 22.08.2016.	6.435	6.435
	Izrada elaborata izmjene i dopune glavnog projekta rasvjete petlja Lašva-		UNSA Elektrotehnički fakultet Sarajevo, 01-02.2-7371/16, 22.08.2016.	6.435	6.435
6.	Konsultantske usluge procjene socijalnih uticaja za Program „Modernizacija cesta u F BiH“	7.500	Ugovor o djelu Ecoplan d.o.o.Mostar, 01-02.3-9072/15, 28.10.2015.	5.513 14.929 (preneseno 7.465)	12.978
7.	Studija lokacija brojanja prometa na magistralnim cestama u F BiH	20.000	UNSA GF Institut za saobraćajnice Sarajevo.01-02.1-8037/16,08.09.2016.	9.506	9.506
8.	Studija crnih tačaka na magistralnim cestama u F BiH	50.000	UNSA Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, 01-02.2-8274/16, 14.09.2016.	48.555	48.555
9.	Prikupljanje, obrada podataka i izrada georeferenciranog panoramskog video zapisa na magistralnim cestama (M17.4; M1.9; M14.2) po Odlukama o razvrstavanju regionalnih cesta u magistralne	75.000	TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB informatika d.o.o.Sarajevo 01-02.2-3952/16, 13.05.2016,.	38.065	72.245
			TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB informatika d.o.o.Sarajevo 01-02.2-5408/16, 20.06.2016.	35.392	
	UKUPNO	**412.500**			**295.105**

Rb.1- Za obradu podataka i izradu publikacije o prometu za 2015.godinu potpisan je ugovor sa Građevinskim fakultetom u Sarajevu koji je uradio analizu prikupljenih podataka svih instaliranih automatskih brojača prometa, zatim publikaciju obrađenih podataka, te plan postavljanja povremenih brojača prometa za narednu godinu.

Rb.2- Za potrebe uknjižbe katastra magistralnih cesta potpisan je ugovor sa Sarajinžinjering d.o.o. Sarajevo i Zedis d.o.o. Zenica da urade projekt izvedenog stanja dionica - M5, most preko rijeke

Bosne Rajlovac 3+000 do Petlje Stup 8+628, dionica Sarajevske obilaznice, Lot 2A -M16.4, Bugojno-Novi Travnik, od 16+100 (Rostovo) do 24+100 (Sinokos). Aktivnost je u toku, dok se realizovani troškovi odnose na pribavljanje podataka iz katastra općina.

Rb.3- Neovisnu vanjsku kontrolu kvalitete na redovnom održavanju i kvalitetu izvedenih radova uradila je na osnovu ugovora OD Putna laboratorija 1957 Sarajevo.

Rb.4 - Održavanje, stručna podrška i unapređenje programskih rješenja SUGOC i ROC (e-mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema za održavanje i upravljanje magistralnim cestama u Federaciji BiH radi firma TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB informatika d.o.o.Sarajevo

Rb.5- Izradu Studije postojećeg stanja i prijedloga mjera za efikasnu i racionalnu potrošnju električne energije, sa izradom tehničkog dijela tenderske dokumentacije za nabavku električne energije okončao je UNSA Elektrotehnički fakultet Sarajevo. Također, na osnovu dodatnih ugovora urađeni su elaborati i dopune glavnih projekata rasvjete tunela Jelašje i petlje Lašva.

Rb.6- U toku pripremnih aktivnosti za kredit Programa „Modernizacija cesta u F BiH" na zahtjev Svjetske banke, angažiran je individualni konsultant za procjenu socijalnih aspekata, na kraći period (do 4 mjeseca) U skladu sa socijalnim politikama WB individualni konsultant vršio je monitoring rada i pregled izvještaja konsultanata za procjenu okolišnih i socijalnih uticaja za Stolac - Neum (ESIA), okvira za okolišna i socijalna pitanja (ESMF) i okvira preseljenja (RPF) za druge komponente programa i pregleda plana preseljenja (RRA) i akcionog plana preseljenja (RAP). Pružena je podrška Timu za implementaciju programa JP Ceste FBIH u pogledu utjecaja na socijalne aspekte, u javnim raspravama i ostalim povezanim projektnim aktivnostima koji se ostvaruju u komunikaciji sa WB u navedenom aspektu. Konsultant je vršio i obuku imenovanog uposlenika za socijalna pitanja u cilju osposobljavanja JP Cesta FBIH da u fazi implementacije Programa samostalno vrše praćenje uticaja i izvještavanje vezano za socijalne aspekte.

Rb.7- Studiju lokacija brojanja prometa na magistralnim cestama u F BiH, uz inoviranje postojećeg stanje i planove novih lokacija automatskih brojača prometa u skladu sa budućom kategorizacijom cesta je uradio UNSA GF Institut za saobraćajnice Sarajevo.

Rb.8- Studiju crnih tačaka na magistralnim cestama u F BiH uradio je UNSA Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo.

Rb.9- Na osnovu odluka Vlade F BiH o razvrstavanju regionalnih cesta (R424, R462 i R464) u magistralne ceste (M17.4, M1.9 i M14.2) uradjeno je prikupljanje, obrada podataka i izrada georeferenciranog panoramskog video zapisa na novim magistralnim cestama.

7. Kamate

Naziv	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.-31.12.2016.
Kamate, servisni troškovi i kursne razlike za kredit EBRD i kredit EIB za program „Rehabilitacija cesta u F BiH „	1.400.000	EIB - 533.052 EBRD - 444.368 WB -152.466 Negativne kursne razlike - 395.470
UKUPNO	**1.400.000**	**1.525.356**

Okončani projekti iz programa „Rehabilitacija cesta u F BiH" su finansirani međunarodnim kreditnim sredstvima i to:

- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD),- po ugovoru br. 37543 u iznosu 45 mil.EUR. Kamatna stopa

je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR +1% marža), a plaća se polugodišnje. Otplata kredita je u 24 jednake polugodišnje rate, počev od 5.12.2010 godine. U 2016 godini realizovane su dvije dospjele rate u iznosu od 8,04 mil.KM.

- Evropska investicijska banka (EIB) broj: 23924 po finansijskom ugovoru br. 2005-0455 u iznosu 50 mil. EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR+fiksni raspon). Povlačenje kredita je bilo po tranšama (šest tranši). Period otplate kredita je do 18 godina, uključujući 6 godina period odgode otplate, a otplata se vrši u jednakim polugodišnjim ratama. Prvi datum otplate svake tranše je ne kasnije od 6 godina od datuma povlačenja tranše, a krajnji rok otplate posljednje rate je ne ranije od 4 godine i ne kasnije od 18 godina od datuma povlačenja. Otplata prve tranše počela je 2014 godine.

U 2016 godini za dospjelu I trašu realizovano je 0,94 mil.KM; II tranšu – 0,78 mil.KM, III – 0,94 mil.KM, IV – 0,70 mil.KM i V tranšu 0,63 mil.KM, što je ukupno 3,99 mil.KM.

-kredit Svjetska banka (WB)-IDA 43710. u iznosu 8,20 mil.SDR. Trošak servisiranja kredita je 0,75% na povučeni iznos kredita, a naknada za održavanje kredita iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita. Otplata kredita je u jednakim polugodišnjim ratama, u periodu od 20 godina, uključujući period odgode 10 godina. Period otplate kredita počinje od 15.12.2017 do 15.06.2027 godine. Kreditna sredstva su povučena do 30.06.2012 godine.
Kamate i negativne kursne razlike, po navedenim kreditima, koje terete rashode u 2016 godini, realizovane su u iznosu od 1,53 mil.KM, od planiranih 1,40 mil.KM, dok se dospjele rate kredita izmiruju iz finansijskog rezultata JP Ceste F BiH.

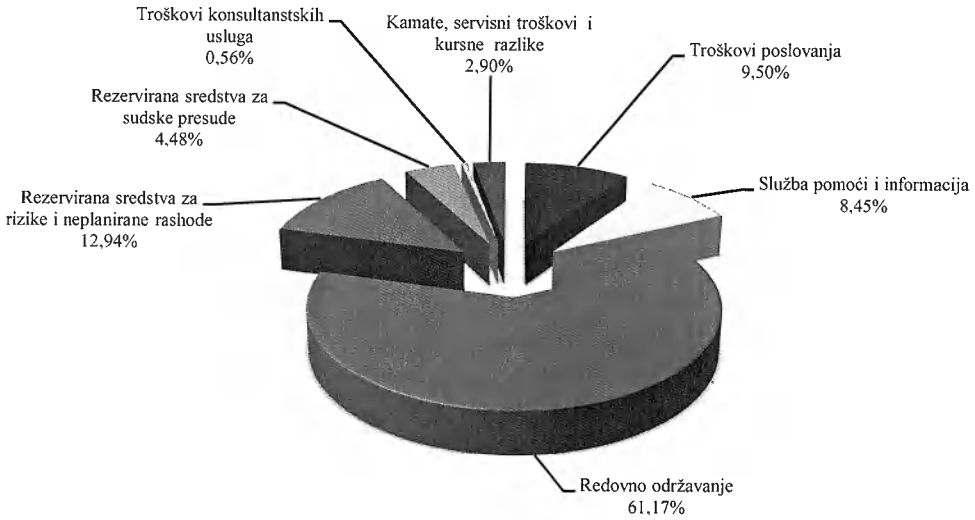

Grafički prikaz strukture realizovanih rashoda

B.II TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Naziv	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.-31.12.2016.
Amortizacija stalnih sredstava	850.000	813.704
UKUPNO	**850.000**	**813.704**

U skladu MRS 20 vrijednost nematerijalne i materijalne imovine, neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti, se sistematski otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja i sučeljava sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa. Na nematerijalna sredstva je obračunata amortizacije u iznosu od 0,57 mil.KM, zgrade 0,05 mil.KM, opreme 0,11 mil.KM i transportnih sredstava 0,08 mil.KM, što ukupno iznosi 0,81 mil.KM.

C. INVESTICIJE

Red Br.	OPIS	Realizovano 01.01.-31.12.2015.	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.-31.12.2016.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Nabavka stalnih sredstava**	**173.958**	**452.000**	**387.917**	**86**	**223**
2.	**Program "Modernizacija cesta u F BiH"**	**4.645**	*	*		
	2.1 Program "Modernizacija cesta u F BiH"- vlastita sredstva	4.645	-	-	-	-
	2.2 Program "Modernizacija cesta u F BiH"- kreditna sredstva	-	-	-		--
3.	**Projekti JP Ceste F BiH**	**9.591.729**	**19.245.300**	**10.920.522**	**57**	**114**
	3.1. Projekti iz prethodnog perioda	**2.894.261**	**4.930.300**	**4.100.489**	**83**	**142**
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	478.054	1.992.400	1.602.390	80	335
	3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	0	47.500	47.284	100	-
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	1.262.675	1.193.000	885.767	74	70
	3.1.4.Vanredno održavanje	**1.153.532**	**1.744.900**	**1.565.048**	**90**	**136**
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	447.759	1.196.900	1.056.238	88	236
	3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	705.773	541.000	501.849	93	71
	3.1.4.3.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	0	7.000	6.961	99	-
	3.2. Planirani projekti u 2016.godini	**6.697.468**	**14.315.000**	**6.820.033**	**48**	**102**
	3.2.1.Projekti rekonstrukcije i izgradnje	619.212	2.202.000	809.663	37	131
	3.2.2.Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica	20.927	105.500	3.510	3	17
	3.2.3.Poboljašanje sigurnosti prometa	1.877.217	7.197.300	2.530.706	35	135
	3.2.4.Vanredno održavanje	**4.180.480**	**4.810.200**	**3.476.154**	**72**	**83**
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	1.804.379	1.106.000	609.861	55	34
	3.2.4.2.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	1.682.264	2.294.700	2.283.504	100	136
	3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	693.469	1.409.500	582.789	41	84
4.	**Projekti iz Progr. Utroška invest. Sred. Budžeta F BiH**	**5.814.598**	**290.000**	**158.007**	**54**	**3**
5.	**Sredstva po Odluci Vlade F BiH – iz GSM licence**	**7.078.076**	**1.125.200**	**1.000.477**	**89**	**14**
6.	**Donacije i sufinansiranje**	**137.705**	-		-	**0**
	U K U P N O	**22.800.711**	**21.112.500**	**12.466.923**	**59**	**55**

JP Ceste F BiH su planirale za investicije 21,11 mil.KM, od čega je realizovano 12,47 mil.KM. Iz vlastitih sredstava realizovano je 11,31 mil.KM, dok se preostali iznos odnosi na sredstva Budžeta F BiH 0,16 mil.KM koja su realizovana na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj: 1738/15. od 16.12.2015. Iz sredstava GSM licence nakon potpisanog protokola o izmirenju obaveza između investitora i izvođača radova na projektu „Izgradnja tunela Karaula" i realizacije preostalih obezbjeđenih sredstava za projekt Neum-Stolac je realizovano 1,00 mil.KM. Napominjemo da je dio realizovanih sredstva za izgradnju tunela Karaula u iznosu 6,65 mil.KM, obzirom da nisu planirana u investicijama, realizovana iz sredstava „Rizika i neplaniranih rashoda".

*Napomena- * Obzirom da JP Ceste F BiH nisu predvidjele u Investicije projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH" nije ni bilo realizacije, jer nisu ispunjeni uslovi za efektivnost kredita za Program „Modernizacija cesta u F BiH" i nisu donesene odluke o povećanju javnih prihoda,*

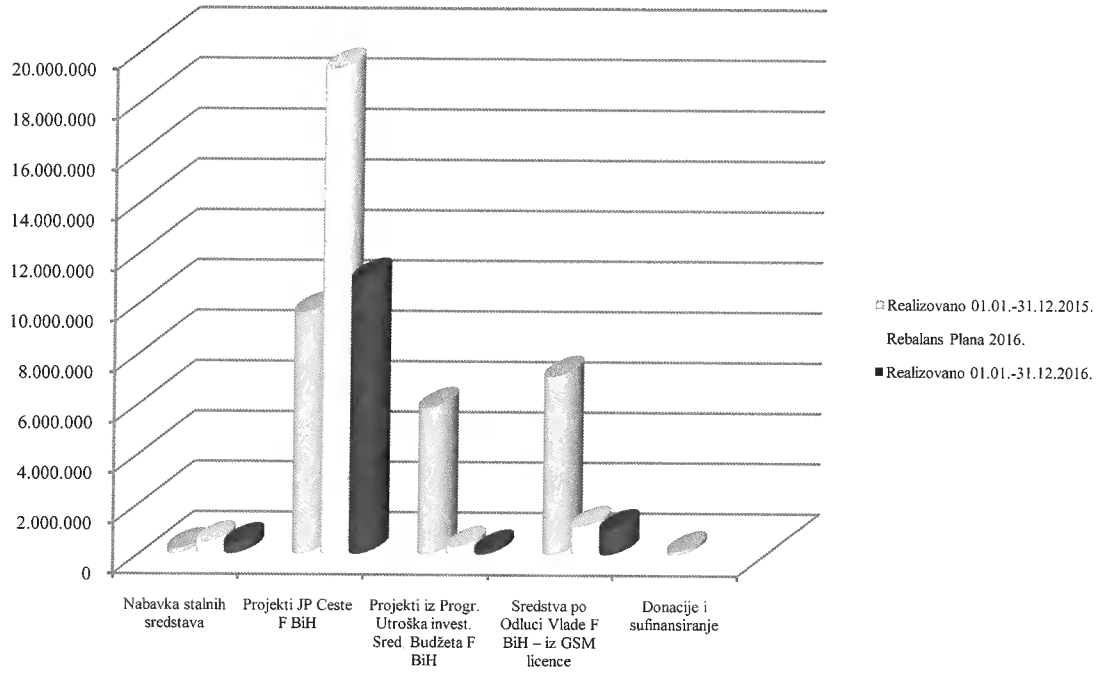

Grafički prikaz visine investicija planiranih Rebalansom 2016, realizovanih 2015. i 2016.godine

1.Nabavka stalnih sredstava

Red. Br.	OPIS	Rebalana Plana 2016.	Realizovano 01.01.-31.12.2016.
1.	Automatski brojači prometa	80.000	79.174
2.	Automobili	235.000	237.009
3.	Računarska oprema	55.000	14.211
4.	Nastavak informatizacije poslovnog procesa - GIS-a	64.000	51.422
5.	Mrežni multifunkcijski uređaj A4/A3	8.000	5.202
6.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	10.000	899
	U K U P N O	**452.000**	**387.917**

Rb.1 Ugradnju deset automatskih brojača prometa na magistralnim cestama, na osnovu ugovora: 01-02.1-7247/16. je uradila firma MHM – projekt d.o.o. Distrikt Brčko. Radovi su okončani na slijedećim lokacijama: 531-Previle, 601-Ormanica, 554-Travnik, 612-Bosanska Krupa, 621-Rimski most, 521-Tarčin, 562-Tuzla zapad, 565-Lukavac, 556-Živinice i Donja Vraca. Sa Delingom d.o.o Tuzla, potpisan je 30.12.2016. ugovor 01-02.1-11587/16. za nabavku 10 kompleta metalnih ormarića sa postoljem vrijednosti 0,006 mil.KM. Realizacija ugovora se očekuje u narednoj godini.

Rb.2 Krajem 2015.godine pokrenut je postupak nabavke automobila u skladu sa Planom poslovanja za 2015.godinu. Međutim do kraja godine postupak nije okončan, nego je realizovan tokom 2016.godine. U izvještajnom periodu nabavljeni su automobili za potrebe nadzora, člana Uprave i

mjerenje prekoosovinskog opterećenja.

Rb.3 Nabavljeni su računari, računarske oprema vrijednosti 0,01mil.KM.

Rb.4 Zeljko d.o.o. Jablanica na osnovu ugovora broj: 01-02.2-6912/16. uradio nadogradnju WEB-GIS sistema ANDRIOD aplikacije i na osnovu ugovora 01-02.5-7434/16. urađena je ARH COORDINATOR - 2016 nadogrdnja ARH COORDINATOR-a - 2011.

Rb.5 Racional d.o.o. Sarajevo je dobavljač mrežnog multifunkcijalnog uređaja A4/A3 na spratu poslovne zgrade JP Ceste F BiH.

Rb. 6 Od drugih neophodnih nabavki nabavljen je sigurnosni ormar (kasa).

2. Program „Modernizacije magistralnih cesta u BIH“

Dosadašnja ulaganja u cestovnu infrastrukturu uglavnom su se odnosila na radove rehabilitacije/poboljšanja postojećih magistralnih cesta i cestovnih objekata, koji su obuhvatali presvlačenja, odnosno sanaciju asfaltnih kolovoza, radove na poboljšanju odvodnje i komponenti sigurnosti, te sanaciju cestovnih objekata. Veoma malo poboljšanja cestovne mreže bilo je vezano za rast prometa. Određeni broj projekata izgradnje magistralnih cesta je započet (Stolac-Neum, južna obilaznica Mostar, Bihać-Bos.Krupa, izgradnja tunela Karaula i dr.), ali se nije mogao kompletirati zbog nedostatka sredstava. Uz to u maju i augustu 2014 desile su se obilne poplave u BIH/FBIH što je za posljedicu imalo pojavu velikog broja klizišta i značajna oštećenja na magistralnim cestama i cestovnim objektima.

Imajući u vidu stanje magistralne infrastrukture, s jedne strane i zahtjeve savremenog prometa, s druge strane, modernizacija magistralne infrastrukture predstavlja visoki prioritet sa aspekta podizanja nivoa usluga, usklađivanja sa potrebama društveno-ekonomskog razvoja i poboljšanja sigurnosti prometa. JP Ceste FBiH pripremilo je Program "Modernizacija magistralnih cesta u FBIH" (Program modernizacije u FBIH) koji obuhvata više projekata koji se mogu svrstati u dvije grupe i to:

- **I grupa** projekti izgradnje najznačajnijih dionica magistralnih cesta-poboljšanje elemenata u postojećem koridoru i obilaznice oko gradova; i
- **II grupa** projekti sanacije/rekonstrukcije objekata (mostova i tunela), rekonstrukcije postojećih cesta i kolovozne konstrukcije - korekcija osovine, izgradnja trećih traka za spora vozila.

Za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ osigurana su kreditna sredstva i Parlament Federacije BiH donio je odluke o prihvatanju zaduženja po ugovorima o finansiranju kako slijedi:

Opis/banka	EIB	EBRD	IBRD
Odluka Parlamenta F BiH broj:	01-02-02-1541/16, 18.10.2016.	01-02-02-2099/16, 29.12.2016.	01-02-02-2100/16, 29.12.2016.
Službene novine F BiH broj:	83/2016.	104/2016.	104/2016.
Iznos kredita	**50,00 mil. €**	**65,00 mil. €**	**58,00 mil. €**
Ukupni period otplate uključujući period odgode otplate	20 godina Otplata svake tranše u godišnjim ili polugodišnjim ratama	15 godina polugodišnje otplate	22 godine polugodišnje otplate
Grace period	do 5 godina	3 godine	12 godina

Nastavak tabele:

Kamatna stopa	fiksna ili varijabilna s fiksnim intervalom (dogovora se prije isplate tranše)	EURIBOR + 1% marža	šestomjesecni EURIBOR + varijabilna marža
Jednokratna provizija	-	1% na iznos kredita (finansiranje iz sredstava kredita)	0,25% na iznos kredita (finansiranje iz sredstava kredita)
Provizija na nepovučena sredstva kredita	-	0,5% godišnje Obračun provizije na Tranšu 1 šezdeset (60) dana od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu, a za Tranšu 2 sto dvadeset (120) dana od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu	0,25% godišnje
Datum plaćanja kamata i glavnice	Biće specificirani u svakoj obavijesti o isplati tranše	15. februar i 15. avgust svake godine	15. februar i 15. avgust svake godine
Povlačenje sredstava kredita	U tranšama, svaka tranša minimalno 3,00 mil.€	Tranša 1 32,00 mil.€ Tranša 2 33,00 mil.€ min.iznos povlačenja 0,10 mil.€	
Krajnji rok raspoloživosti kredita	23 februar 2021 ili neki drugi datum koji može biti dogovoren u pisanoj formi između Banke i Zajmoprimca	13 juli 2020. ili neki drugi kasniji datum koji Banka može odrediti po svom nahođenju i o tome obavijestiti Zajmoprimca	31. decembar 2021.

Očekuje se da će radovi iz Programa modernizacije u FBiH biti izvršeni tokom četverogodišnjeg razdoblja (2017-2020). Prosječno razdoblje trajanja ulaganja po pod-projektima kraće je od ukupno planiranog razdoblja; dakle, ova ulaganja će započeti u različitim periodima tokom implementacije Programa.

3.Projekti JP Ceste F BiH

3.1. Projekti iz prethodnog perioda

3.1. 1.Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.		Izrada studije kategorizacije cesta Federacije BiH	Konsult.usluge	150.000	JV Ipsa, Sarajevo, Ecoplan i Integra Mostar 01-02.1-4213/13, 08.05.2013 01-02.1-10689/16, 02.12.2016.	497.250 (preneseno 99.450) 48.116	147.566	Okončano
			Recenzija	3.500	Ugovor 01-02.1-1161/16, 26.01.2016.	2.609	2.609	
			Ukupno				**150.175**	
2.		Revizija glavnog projekta - Neum-Stolac	Revizija	10.000	Grad.fakul. Sveučilišta Mostar, 01-02.1-5562/15, 11.06.2015.	6.000	**6.000**	Okončano
3.		Glavni projekat nastavka izgradnje Obilaznice Velika Kladuša, L= 2,0 km	Projektovanje	7.500	Institut za građevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-869/15, 02.02.2015.	18.357 (preneseno 7.325)		Okončano nije situirano
			Revizija	7.000	Ipsa institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2834/15, 10.03.2015.	6.962	6.962	
			Ukupno				**6.962**	
4.	M18	Izradnja traka za spora vozila: dionica: Olovo –Semizovac, podionica: Čevljanovići-Nišići	Projektovanje	9.500	Aber Desing d.o.o. Sarajevo 01-02.1-6902/15, 04.08.2015	9.337	9.337	Okončano
			Revizija	3.500	Desing&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.1-9594/15, 13.11.2015.	3.510	0	
			Ukupno				**9.337**	

Nastavak tabele:

5.	M6	Južna obilaznica Gruda Izmjena Glavnog projekta -izlaz Prispa-kružni tok	Projektovanje	7.600	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7851/15, 10.09.2015	7.605	7.605	Okončano
			Revizija	2.300	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-9552/15, 12.11.2015.	2.281	2.281	
			Ukupno				**9.886**	
6.	M14.1	Obilaznica Odžak Izrada glavnog projekta tzv. "sjeverne veze"	Projektovanje	18.600	INK Consttructor d.o.o.Banja Luka, 01-02.1-9886/15, 24.11.2015.	18.559	0	U toku (bio zastoj zbog neblagovremenog izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti, od strane nadležne institucije)
			Revizija (Nadzor G23)	6.300	Trafficon d.o.o. Odžak, 01-02.1-10937/15-GK, 30.12.2015.	6.318	2.200	
			Ukupno				**2.200**	
7.	M17.3	Izgradnja ceste Neum – Stolac: Glavni projekat tunela „Žaba", dionica Bročanac-Drenovac Dodatne usluge izrade glavnog projekta trase sa geotehničkim elaboratom misije G21 na M17.3 Stolac-Neum, dionica:Broćanac-Drenovac, poddionica:Cerovica-Drenovac, L=14 km	Projektovanje	205.000	IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-2089/16, 25.02.2016.	204.750	204.750	Okončano
			Revizija	20.000	Konzorcij: Divel d.o.o.Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-548/16, 22.06.2016.	19.539	19.539	
			Knsult.usluge	45.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2415/16, 10.03.2016.	44.413	44.413	
			Ukupno				**268.702**	
8.	M18	Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dionica Ustikolina – Trnovo, km 37+257	Projektovanje	10.000	Geoput d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9888/15, 24.11.2015.	9.945	9.945	Okončano
			Revizija	2.000	Ipsa Institut d.o.o Sarajevo, 01-02.1-2257/16, 04.03.2016.	1.989	1.989	
			Ukupno				**11.934**	
9.	M16.2	Rekonstrukcija ceste na ulazu u Prozor L=1,00km	Izvođenje	775.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-9070/15, 28.10.2015.	657.594 (preneseno 650.892)	650.892	Okončano
					Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-3857/16, 11.05.2016	104.060	103.793	
			Dodatni radovi	4.700	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4507/16, 27.05.2016.	4.680	4.680	
			Nadzor	5.300	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8963/15, 23.10.2015.	7.020 (preneseno 5.265)	5.265	
			ostalo		saglasnost		1.017	
			Ukupno				**765.647**	
10.	M17.3	Izgradnja ceste Neum-Stolac:	Revizija	-	GF Sveučilišta u Mostaru, 01-02.1-9567/16, 05.12.2013.	19.900 (preneseno 3.980)	3.980	Okončano
		Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za dionicu Neum-Stolac (u ime naručioca) sa taksama	Konsult.usl.	7.200	Ecoplan d.o.o. Mostar, 01-02.3-4986/16, 08.06.2016.	6.903	6.903	Okončano
		Lokacijski specifičan plan upravljanja okolišem I društvenim aspektima, uključujući monitoring za dionicu Neum-Stolac	Konsult.usl.	34.000				U toku nabavka
		Ažuriranje studije uticaja na okoliš i procjene utjecaja na socijalne aspekte za podprojekt Neum-Stolac	Konsult.usluge	4.700	Ecoplan d.o.o.Mostar, 01-02.3-9071/15, 28.10.2015.	9.290 (preneseno 4.645)	4.645	Okončano
			Ukupno				**15.528**	

Nastavak tabele:

11.	M5	Ažuriranje glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf	Projektovanje	80.000	JV Geoput d.o.o. Banja luka i INK Constructor d.o.o. Banja luka.01-02.1-5797/16,01.07.2016.	79.525		U toku planirane aktivnosti Zastoj na projektu zbog različite kote visoke vode Vrbasa, dobivene od strane Agencije za vodno područje rijeke Save U toku izrada dodatnih hidroloških analiza
			Revizija	8.000	IG d.o.o. Banja luka,01-02.1-8903/16,05.10.2016.	2.106		
			Konsult usluge	6.500	IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-10938/15, 30.12.2015.	6.435	6.435	
			Ukupno				**6.435**	
12.	M6.1	Obilaznica Mostara: -Gl.projekat tunela na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M17 (tunel „Novi“ cca 900 m i tunel „Privorac“ cca 170 m)	Projektovanje	297.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-2091/16, 26.02.2016.	296.831	253.284	U toku projektovanje i revizija (po fazama)
			Revizija	25.000	Grupa ponudjača: IGH d.o.o. Mostar, Divel d.o.o.Sarajevo, GF Sveučilišta u Mostaru, Građ.istraživački centar d.o.o.Mostar, 01-02.1-5514/16, 23.06.2016.	24.804	12.402	
			Konsult usluge	4.700	Cerberus d.o.o. Tuzla, 01-02.1-2814/16, 25.03.2016.	4.680	4.680	
			Ostalo			109	109	
			Ukupno				**270.475**	
13.	M5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste na potezu Skela (tunel i cesta), L=cca 1km	Projektovanje	60.000				U toku nabavka
			Revizija	6.000				
			Konsult usluge	5.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-4741/16, 02.06.2016.	4.973	4.973	
			Ukupno				**4.973**	
14.	M14	Obilaznica Bihaća: Glavni projekat za dionicu: Jablanska ulica- čvor Mali Lug- veza na M14	Projektovanje	62.000	Institut za građevinsrstvo IG Banja luka, 01-02.1-4677/16. 01.06.2016.	61.686	5.653	U toku projektovanje i revizija (po fazama)
			Revizija	8.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7451/16, 24.08.2016.	4.446		
			Konsult.usluge	5.000				
			Konsult.usluge	2.400	Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 01-02.1-10951/15, 31.12.2015.	2.400	2.051	
			Ukupno				**7.704**	
15.		Izgradnja ceste Bihać-Bosanska Krupa: Idejni projekat za dionice Grmuša – Mali Radić, L=cca 5,00 km	Projektovanje	31.000	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo i Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3279/16, 13.04.2016.	30.261	30.261	Okončano
			Konsult.usluge	2.400	Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 01-02.1-10951/15, 31.12.2015.	2.400	2.051	
			Ukupno				**32.312**	
16.	M18	Izgradnja trake za spora vozila, dionica Priboj 2 - Simin Han1, L=cca 2 km	Projektovanje	13.500	Institut za gradjevinarstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-3906/16, 12.05.2016.	13.239	10.591	Okončano nije situirano
			Revizija	3.000	Građevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6003/16, 11.07.2016.	2.900	0	
			Ukupno				**10.591**	

Nastavak tabele:

17.	M5	Rekonstrukcija ceste M5 Dionica: Kaonik - Gromiljak						Nabavka u toku
		Potez „Delfine krivine“, L=cca 1km	Elab.eksprop.	5.000				
		Potez Jehovac-Brestovsko	Projektovanje	5.000				
			Revizija	1.000				
			Ukupno			-	-	
18.	M17 006	Izgradnja pothodnika ispod magistralne ceste M17 na lokalitetu „Zenički put“, općina Žepče, km 6+700	Projektovanje	7.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1619/16, 09.02.2016.	6.960	6.960	Okončano
			Revizija	1.800	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-3956/16, 13.05.2016.	1.755	1.755	
			Ukupno				**8.715**	
19.		Nastavak „Južne saobraćajnice“, dionica B.Malta- Slavinovići, Izrada glavnog projekta za potez Ši Selo – Slavinovići, L=cca 1,km	Revizija	7.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-2235/15, 25.02.2015.	6.962	**6.962**	Okončano
20.		Izgradnja ceste Tuzla-Doboj petlja Šićki	Konsult.usluge	7.400	Sarajinžinjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9066/16, 28.10.2015	6.962	6.961	Projekat je u toku, za nastavak radova nedostaju sredstva
					Ugovor o djelu	358	356	
			Ostalo		Ostalo	535	535	
			Ukupno				**7.852**	
		UKUPNO		**1.992.400**			**1.602.390**	

3.1.2.Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M14.1	Rasvjeta raskrsnice (kružnog toka) „Varoš“ u Gradačcu, dionica: Gradačac 0-Pelagićevo, km 0+200	Izvođenje	44.000	Elko-Marić d.o.o.Mostar, 01-02.1-9461/15, 09.11.2015.	43.984	43.984	Okončano
			Nadzor	3.500	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9595/15, 13.11.2015.	3.300	3.300	
				47.500			**47.284**	

3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M6 002	Rekonstrukcija raskrsnice za Kravice, km 12+400	Eksproprijacija	-			-	
2.	M 6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar-Široki brijeg, kroz naseljeno mjesto Međine	Eksproprijacija	-			-	
3.	M5	Rješavanje odvodnje u naselju Hrenovica, u dužini 800m, km12+550	Izvođenje	94.000	Okac d.o.o Goražde, 01-02.2-9109/15, 29.10.2015.	164.845 (preneseno 94.057)	93.976	Okončano

Nastavak tabele:

			Nadzor	1.200	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-561/15, 20.01.2015.	2.323 (preneseno 1.161)	1.162	
			Ukupno				**95.138**	
4.	M4.2 002	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M4.2 i ulice Žrtava domovinskog rata i 25. Novembra, u Cazinu dionica (002), km 11+230	Eksproprijacija	-			-	
5.		Saglasnosti i takse na projekte koji su u toku, a čije izvođenje nije planirano u tekućoj godini.	Saglasnosti, takse	50.000				
		Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dionica Ustikolina – Trnovo, km 37+257					750	
		Obilaznica Goražda					300	
		Rekonstrukcija ceste devijacija puta V korpusa AVNOJ-a					580	
	M1.8	Rekonstr.raskrsnice na M1.8, (003) Ćehaje					200	
	M17	Izgradnja oborinske odvodnje Topčić Polje 1+600-3+880					80	
	M18	Rekonstrukcija raskrsnice Husino 2+500 M18					240	
		Rekonstrukcija raskrsn. Skokovi R400/23+00					950	
	M5	Rekonstrukcija raskrsn. Kamenica /M5-R403a					780	
		Rekonstrukcija raskrsnice Vitkovići					96	
		Rekonstrukcija raskrsnice Skokovi-Srbljani					252	
		Rekonstrukcija raskrsn. Olovske luke 20+600					175	
	M5	Rekonstrukcija raskrsnice Dolac na lašvi M5					111	
		Rekonstrukcija ceste devijacija kod Robota					470	
	M5	Izgrad. mosta na rij. Banjica u Ključu, M5					58	
	M15	Izrada elaborata o inžinjersko-geotehn. karakteristikama na M15 004:Kamičak-Ključ	Konsult.usluge		Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7304/16, 18.08.2016.	6.903	6.903	Okončano
	M15	Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na M15_004 dionica:Kamičak-Ključ, km 15+700			Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10385/16, 22.11.2016.	6.903	6.903	Okončano
	M4.2	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije kolovzne konstrukcije ceste M4.2 zajedno sa pješačim stazama na cesti M4.2_002, km 2+450- km 2+900, Velika Kladuša			Geo feld D.o.o. Bihać, 01-02.2-9162/16, 12.10.2016.	6.786	6.786	Okončano
	M4.2	Revizija projektne dokumentacije rekonstrukcije kolovozne konstrukcije M4.2 sa pješačkim stazama, dionica:gr.prelaz R H-Velika Kladuša, km2+250-km 2+900			Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10723/16, 05.12.2016.	2.282	2.282	Okončano
	M20	Izrada glavnog projekta sanacije kolozne konstrukcije i pješačkih staza sa rješenjem odvodnje cesta M20: Goražde7-Goražde8-Ustiprača,L=500 m			Desing&QC D.o.o.Sarajevo 01-02.2-9045/16, 07.10.2016.	7.020	7.020	Okončano
	M18	Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ispod nivelete M18_007, dionica: Živinice1-Vitalj (Stanovi) km 26+000			Desing&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-10900/16, 08.12.2016.	12.870	12.870	Okončano
	M20	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok cesta M20_010: Goražde 8 – Ustiprača, km 0+550			Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10085/16, 11.11.2016.	7.020	7.020	Okončano
	M18	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M18_010 Kobilja glava, Semizovac-Sarajevo-Malta, km 8+340			Pronasa d.o.o. Sarajevo,01-02.2-3708/16,05.05.2016.	6.903	6.903	Okončano
			Ukupno				**61.729**	
6.	M6 002	Rekonstrukcija raskrsnice za Kravice, km 12+400	Izvođenje	181.000	HP Investing d.o.o.o Mostar 01-02.2-8958/15, 23.10.2015.	180.667	180.620	Okončano
			Nadzor	3.500	Integra Mostar 01-02.2-6996/15, 06.08.2015	3.370	3.370	
			Ukupno				**183.990**	

Nastavak tabele:

7.	M14 001	Bihać 4 – Srbljani, rješenje plavljenja objekata u Pokoju	Izvođenje	104.000	BC Gradnja d.o.o.Bos.Krupa 01-02.2-10505/15 15.12.2015.	103.979	103.960	Okončano
			Nadzor	3.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10815/15. 24.12.2015.	3.000	3.000	
			Ukupno				**106.960**	
8.	M15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok	Eksproprijacija	-				Eksproprijacija nije rješena
			Izvođenje	287.000	Livnoputovi d.o.o. Livno 01-02.1-10585/15. 16.12.2015	286.407	-	
			Nadzor	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02-1-11589/16, 30.12.2016	6.903	-	
			Ukupno				-	
9.	M16	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M16 sa Ulicom Splitska u Livnu	Izvođenje	353.000	Livnoputovi, d.o.o. Livno, 01-02.2-8504/15. 08.10.2015.	311.694	311.694	Okončano
					Livnoputovi, d.o.o. Livno, 01-02.2-11508/16 28.12.2016.	36.663	36.634	
			Nadzor	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-8882/15-GK, 20.10.2015.	6.845	6.844	
			Ukupno				**355.172**	
10.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na M4 u mjestu Tojšići, općina Kalesija	Projektovanje	7.000	Institut GIT d.o.o. Tuzla, 01-02.2-8665/15, 13.10.2015.	7.020	7.020	Okončano
			Revizija	1.500	NNM Inžinjering d.o.o. Tuzla, 01-02.1-9572/16, 26.10.2016.	702	702	
			Ukupno				**7.722**	
11.	M15 003	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i R405	Projektovanje	5.800	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-3951/16, 13.05.2016.	5.792	**5.792**	Okončano
			Revizija	2.000	-	-	-	
12.	M14 002	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor)	Projektovanje	5.700	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-3951/16, 13.05.2016.	5.651	5.651	Okončano
			Revizija	2.000	Geo Feld d.o.o. Bihać, 01-02.2-9517/16, 25.10.2016.	1.989	1.989	
			Ukupno				**7.640**	
13.	M14 003	Bosanska Krupa 1 – Otoka, izgradnja pješačke staze L=1,0 km	Projektovanje	7.000	Aber Desing d.o.o.Sarajevo, 01-01.1-3636/16, 29.04.2016.	7.020	**7.020**	Okončano
14.	M5 012	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M5 i M16.4 u kružni tok, M5, 012, km 0+000 (Nević Polje)	Projektovanje	4.800	Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-2741/16, 22.03.2016.	4.797	4.797	Okončano
			Revizija	2.500	Arting, d.o.o Sarajevo, 01-02.2-11022/16, 12.12.2016.	2.457	2.457	
			Ukupno				**7.254**	
15.	M6 004	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, M6, 004, km 3+950 – km 4+600	Projektovanje	7.000	Integra d.o.o.Mostar 01-1558/16, 08.02.2016.	6.962	**6.962**	Okončano
			Revizija	2.000			-	
16.	M18 007	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M18_007, km 0+000	Projektovanje	6.900	AIK-Inžinjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-2109/16, 26.02.2016.	6.900	**6.900**	Okončano
			Revizija	2.500			-	

Nastavak tabele:

17.	M4 009	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M4 u Gračanici, M4_009, km 17+900	Projektovanje	7.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1620/16, 09.02.2016.	6.903	**6.903**	Okončano
			Revizija	2.500				
18.	M1.8 004	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, ulaz u Srebrenik, M41.8_004, km 1+450	Projektovanje	14.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-3254/16, 12.04.2016	4.633	4.633	Okončano
			Revizija	2.500	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.2-11071/16, 12.12.2016.	2.457	2.457	
			Ukupno				**7.090**	
19.	M5 001	Izgradnja pješačke staze u naselju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000	Eksproprijacija	-			-	
20.	M4.2 002	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M4.2 i R400 na M4.2, dionice: Skokovi – Srbljani (Todorovo)	Eksproprijacija	-			-	
21.	M5	Izgradnja pješačkih staza uz magistralnu cestu M5, Han Ploča	Projektovanje	6.800	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-2069/16, 25.02.2016.	6.763	**6.763**	Okončano
22.	M17 013	Rekonstrukcija crne tačke „Bulajića krivina" na M17_013 km 35+800 – km 36+000	Projektovanje	6.900	Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6020/15, 01.07.2015	6.903	**6.903**	Okončano
23.	M6.1 008	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice u naselju Bobara-Tomislavgrad,	Projektovanje	2.700	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-563/15, 20.01.2015.	9.009 (preneseno 2.703)	2.703	Okončano
			Revizija	1.700	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-7133/15-GK,11.08.2015.	1.626	1.626	
			Ukupno				**4.329**	
24.	M4	Revizija projektne dokumentacije rekonstrukcija raskrsnice na M4 i R469, općina Kelesija	Revizija	1.500	Geo-Feld d.o.o.Bihać, 01-02.2-258/16, 07.01.2016.	1.500	**1.500**	Okončano
				1.193.000			**885.767**	

3.1.4. Vanredno održavanje

3.1.4.1.Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M1.8	Sanacija nadvožnjaka iznad željezničke pruge Brčko –Banovići (M1.8-004-119), dionica: Srebrenik- Šićki Brod 3, km 23+661	Projektovanje	5.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8462/15, 07.10.2015.	9.196 (preneseno 4.598)	4.598	Okončano
			Revizija	2.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10692/15, 21.12.2015.	1.983	1.983	
			Ukupno				**6.581**	
2.	M4	Sanacija mosta preko potoka Radušica (M4_008_200) dionica Teslić (Barići)-Karuše, km 13+917	Projektovanje	7.000	INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-8583/15, 12.10.2015.	6.834	6.833	Okončano
			Revizija	2.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-1264/16, 29.01.2016.	1.989	1.989	
			Ukupno				**8.822**	
3.	M5	Sanacija mosta preko potoka Mrižnica, (M5_001_8) lokacija Kamenica, dionica Granica RH (Izačić)-Bihać 4, km 7+765	Projektovanje	5.300	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8461/15, 07.10.2015.	10.530 (preneseno 5.265)	5.265	Okončano

Nastavak tabele:

			Revizija	2.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-354/16, 11.01.2016	1.989	1.989	
			Ukupno				**7.254**	
4.	M5	Sanacija mosta preko Sandžačke rijeke (M5-009_218), dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 26+245	Projektovanje	8.100	INK Constructor d.o.o.Banja Luka, 01-02.1-8584/15, 12.10.2015.	8.073	8.073	Okončano
			Revizija	2.400	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10468/15, 14.12.2015.	2.340	2.340	
			Ukupno				**10.413**	
5.	M6.1	Sanacija mosta preko potoka Korana,(M6.1_002_462) lokacija Brkića vrelo, dionica Resanovci Bos. Grahovo 1, km 12+921	Projektovanje	8.200	Desing&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.1-8883/15, 20.10.2015.	8.190	8.190	Okončano
			Revizija	2.300	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-483/16, 12.01.2016.	2.317	2.317	
			Ukupno				**10.507**	
6.	M17	Sanacija mosta preko rijeke Bosne (Bosna II) (M17-006-196), dionica:Ozimica-Topčić polje, km 13+681;	Izvođenje	126.000	HP Investing, d.o.o. Mostar, 01-02.1-6607/15, 27.07.2015	1.057.796 (preneseno 126.013)	125.484	Okončano
			Nadzor	1.000	Trasa,d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6571/15, 23.07.2015.	6.903 (preneseno 822)	822	
			Ukupno				**126.306**	
7.	M17	Rekonstrukcija mosta (M17.0-2-26), petlja Zenica, dionica Doboj-Zenica-Lašva, km 76+570;	Izvođenje	360.000	JV Hering-Jata Group, 01-02.1-7333/15, 20.08.2015	1.081.293 (preneseno 469.387)	360.064	Okončano
			Nadzor	2.500	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6915/15, 05.08.2015	5.800 (preneseno 2.494)	2.494	
			Monitoring	6.500	Geo Konzalting d.o.o Sarajevo, 01-02.1-3621/16, 29.04.2016.	6.460	6.460	
			Projektovanje		Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8405/16, 20.09.2016.	7.008	7.008	
			Ostalo		saglasnosti		152	
			Ukupno				**376.178**	
8.	M17	Sanacija mosta preko rijeke Krupe u Višićima (M17-018-328), dionica:Tasovčići- gr.Hrvatske, km 6+073;	Izvođenje	204.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-1898/16, 18.02.2016.	203.633	202.773	Okončano
			Nadzor	6.500	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-876/16	6.552	6.552	
			Ukupno				**209.325**	
9.	M18	Sanacija mosta preko rijeke Drinjače Kladnju (M18-008-69) dionica: Vitalj-Olovo, km 2+107;	Projektovanje	13.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.1-9887/15, 24.11.2015.	12.870	12.870	Okončano
			Revizija	2.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-1257/16, 29.01.2016.	1.989	1.989	
			Ukupno				**14.859**	
10.	M17	Investiciono održavanje mostova-zamjena dilatacija -Most preko rijeke Bosne (M17-007-175), Bosna V, dionica Topčić polje – Lašva 0	Izvođenje	-				Rebalansom nije planirano
			Nadzor	-				

Nastavak tabele:

11.	M20	Investiciono održavanje mostova- zamjena dilatacija -Vijadukt Osanica (M20-009-208), dionica: Ustikolina – Goražde 8	Izvođenje	88.000	HP Investing, d.o.o. Mostar, 01-02.1-6218/15 08.07.201	87.516	85.688	Okončano
			Nadzor	700	IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-6350/15, 14.07.2015.	736	736	
	M1.8	Most preko r. Tinje (M1.8_004_113), Orlova Klisura, dionica: Srebrenik-Šički Brod 3	Izvođenje		HP Investing, d.o.o. Mostar, 01-02.1-6218/15 08.07.2015	100.019 (preneseno 5.574)	4.285	
			Nadzor		IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-6350/15, 14.07.2015.	842 (preneseno 47)	47	
	M16.2	Vijadukt Novogodišnja ruč (M16.2_003_336), dionica: Prozor – Jablanica 1	Izvođenje		HP Investing, d.o.o. Mostar, 01-02.1-6218/15 08.07.2015	54.659 (preneseno 4.890)	4.724	
			Nadzor		IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-6350/15, 14.07.2015.	(preneseno 185)	185	
	M17	Vijadukt Ostrožac (M17_012_302), dionica: Konjic-Jablanica 1	Izvođenje		HP Investing, d.o.o. Mostar, 01-02.1-6218/15 08.07.2015		161	
			Nadzor		IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-6350/15, 14.07.2015.			
			Ukupno				**95.504**	
12.	M1.8	Sanacija mosta preko potoka Urvenica (M1.8-004_107), lokacija Srebrenik, dionica: Srebrenik-Šički Brod 3, km 2+528	Projektiranje	15.600	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-4123/16, 19.05.2016.	15.538	15.538	Okončano
			Revizija	2.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5503/16, 23.06.2016.	1.900	1.900	
			Ukupno				**17.438**	
13.	M1.8	Sanacija mosta preko r. Tinje (M1.8-004_108), lokacija Drenik, dionica: Srebrenik-Šički Brod 3, km 2+593	Projektiranje	17.200	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-4123/16, 19.05.2016.	17.152	17.152	Okončano
			Revizija	2.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5503/16, 23.06.2016.	1.900	1.900	
			Ukupno				**19.052**	
14.	M4	Sanacija tunela Čaklovići (T4-012-1) , dionica: Simin Han1 -Donje Caparde, km 2+775	Projektiranje	92.500	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2648/16, 18.03.2016.	92.494	73.189	Okončano
			Revizija	6.600	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-3850/16, 10.05.2016.	6.552	6.552	
			Ukupno				**79.741**	
15.	M4	Sanacija korita u zoni mosta preko Rašljevske rijeke (M4-010-113 u Donjoj_Orahovici	Projektiranje	7.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10423/15, 11.12.2015.	6.903	**6.903**	Okončano
			Revizija	-				
16.	M5	Sanacija mosta preko potoka Rika (M5_009_214), i rekonstrukcija raskrsnice na lokaciji Skela, dionica: Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 0+894	Projektiranje	20.000	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3459/16, 21.04.2016.	19.773	-	Projektovanje i revizija u toku (po fazama)
			Revizija	3.000	GFU Sarajevo, 01-8150/16, 09.09.2016.	3.500	-	
			Ukupno				-	
17.	M17	Sanacija tunela Crnaja (T17-012-2) dionica: Konjic-Jablanica 1, km 15+082	Projektiranje	123.000	Divel d.o.o i Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4122/16, 19.05.2016.	122.611	43.941	U toku projektovanje U pripremi ugovor za usluge revizije
			Konsult.usluge	7.000	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6864/16, 05.08.2016.	6.435	6.435	
			Revizija	12.000				
			Ukupno				**50.376**	

Nastavak tabele:

18.	M18	Sanacija mosta preko r. Ljubine (M18-009_386), lokacija Stupe, dionica Olovo-Semizovac, km 27+523	Projektiranje	15.200	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-4121/16, 19.05.2016.	15.210	-	Popravke po reviziji u toku
			Revizija	2.300	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5537/16, 24.06.2016.	2.317	-	
			Ukupno				-	
19.	M1.8	Sanacija mosta preko Špioničkog potoka, (M01.8_003_95) lokacija Špionica Donja, dionica Pelagićevo-Srebrenik, km 22+062	Projektiranje	2.400	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1556/16, 08.02.2016.	2.378	2.378	Okončano
			Revizija	1.500	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7850/15, 10.09.2015.	1.498	1.498	
			Ukupno				**3.876**	
20.	M1.8	Sanacija mosta preko rijeke Velika Tinja (M1.8-003-93), Špionica Gornja, dionica: Pelagićevo-Srebrenik, km 18+242;	Projektovanje	5.500	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7728/15, 07.09.2015	10.996 (preneseno 5.498)	5.498	Okončano
			Revizija	2.300	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9661/15, 16.11.2015.	2.340	2.340	
			Ukupno				**7.838**	
21.	M5	Revizija projektne dokumentacije glavnog projekta za rekonstrukciju mosta(ulaz u Ključ) na M 5 dionica 002:Bosanski Petrovac-Jajce, km 40+099	Revizija	5.300	Trasa d.o.o Sarajevo, 01-02.1-2601/16, 17.03.2016.	5.265	**5.265**	Okončano
		U K U P N O		**1.196.900**			**1.056.238**	

3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red. br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	
1.	M 4.2 002	Sanacija klizišta, cesta M4.2_002, dionica: Skokovi-Srbljani, km 13+350	Eksproprijacija	-				Okončano
			Izvođenje	62.000	Kov-grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-8753/15, 15.10.2015.	161.877 (preneseno 43.277)	43.186	
			Nadzor	3.500	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02-8868/15, 19.10.2015.	6.084 (preneseno 1.623)	1.623	
			Ukupno				**44.809**	
2.	M16 006	Sanacija klizišta, cesta M16_006 dionica: Crna Rijeka – Jajce, km 21+800	Projektovanje	7.000	Instiut za gologiju GF Sarajevo, 01-02.2-4029/16, 17.05.2016.	6.961	6.961	Okončano
			Izvođenje	Izrada šipova	Hering d.d. Široki brijeg.01-02.2-6829/16.04.08.2016	129.569	128.831	
			Nadzor		Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7488/16, 25.08.2016.	4.666	4.666	
			Izvođenje	260.000	Komotin d.o.o Jajce, 01-02.2-6382/15, 15.07.2015.	128.590	128.339	
			Nadzor	6.000	Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6467/15, 20.07.2015.	3.054	3.054	
			Ukupno				**271.851**	

Nastavak tabele:

3.	M16.2 003	Sanacija škarpe iznad izlaznog portala tunela brane Jablanica, te sanacija škarpe i proširenje ceste dužine cca 800 m, (24+150 – 24+950) (saniranje škarpi)	Izvođenje	200.000	JV:Sarajevoputevi d.d. Babić d.o.o. Jablanica, Menadžer d.o.o. Lukavac 01-02.2-6187/15, 08.07.2015. Anex 01-02.2-10886/15, 29.12.2016.	553.807 110.758 (preneseno 191.743)	184.239	Okončano
			Nadzor	2.500	Aber Desing d.o.o.Sarajevo 01-02.2-6381/15, 15.07.2015.Anex 01-02.2-10893/15, 29.12.2015.	4.803 (preneseno 950)	950	
			Ukupno				**185.189**	
		UKUPNO		**541.000**			**501.849**	

3.1.4.3.Sanacija asfaltnih kolovoza

Red. br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016.	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M4 010	Donja Orahovica – Šićki Brod, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza na dionici, L = 2,0 km	Projektovanje	7.000	Pro-ing d.o.o. Orašje, 01-02.2-2188/16, 02.03.2016.	6.961	6.961	Okončano
		UKUPNO		**7.000**			**6.961**	

3.2.Planirani projekti

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
	Kompletiranje dokumentacije za Program Modernizacije cesta:							
	I	IZGRADNJA CESTE						
1.		Neum-Stolac: Deminiranje na dionici Cerovica-Drenovac	Deminiranje	-			-	
2.	M6.1	Obilaznica Mostara: -Gl.projekat mostova na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M17 - potputnjak „Varda“, prolaz 5x8m i vijadukt „Marjanovića Draga“	Projektiranje	140.000	GP: Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i INK Constructor d.o.o Banja luka, 01-02.1-5963/16, 11.07.2016.	139.955	111.965	U toku projektovanje
			Nadzor nad istražnim radovima	5.000	Cerberus d.o.o.Tuzla 01-02.1-5505/16, 23.06.2016	4.095	4.095	
			Revizija	6.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.16766/16, 02.08.2016.	5.616	4.492	
			Ukupno				**120.552**	
	II	IZGRADNJA TRAKA ZA SPORA VOZILA						
3.	M 5	Dionica Ripač - Vrtoče 2, poddionica Ripač - Dubovsko	Elaborat eksproprijacije	20.000				Poništen tender
			Deminiranje	50.000				

Nastavak tabele:

4.	M 5	Dionica Gornje Bravsko - Ključ, poddionica Bos. Petrovac - Ključ - Prevoj Lanište	Elaborat eksproprijacije	20.000				Poništen tender
5.	M 5	Dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, prevoj Komar	Elaborat eksproprijacije	10.000				Poništen tender
6.	M 6.1	Dionica Posušje-Široki Brijeg, Posušje - Grude - Široki Brijeg	Elaborat eksproprijacije	24.000				Poništen tender
7.	M 14.2	Dionica Bosanski Petrovac-Pasjak, Poddionica Bosanski Petrovac - Drvar	Elaborat eksproprijacije	24.000				Poništen tender
8.	M 14.2	Dionica Pasjak- Resanovci, Poddionica Drvar - Resanovci	Elaborat eksproprijacije	16.000				Poništen tender
9.	M 18	Izradnja traka za spora vozila: dionica: Olovo-Semizovac, podionica: Čevljanovići-Nišići	Elaborat eksproprijacije	20.000				Poništen tender
10.	M15	Dionica: Livno-Šujica-Kupres: - Borova Glava traka	Elaborat eksproprijacije	25.000				Poništen tender
		Dionica: Livno-Šujica-Kupres: - Trivunove krivine		10.000				Poništen tender
11.	M5	Dionica Gromiljak-Blažuj, Poddionica Han Ploča-Šamin Gaj (Kobiljača)	Projektiranje	56.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8753/16, 30.09.2016.	49.082	19.937	U toku
			Revizija	5.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11588/16 30.12.2016	4.914	-	
			Ukupno				**19.937**	
	III	REKONSTRUKCIJA CESTE						
12.	M5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1	Projektiranje	200.000				Ugovor u pripremi
			Revizija	20.000				
	VII	IZGRADNJA OBILAZNICA						
13.	M15	Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1) Glavni projekat, L=cca 3km	Projektiranje	50.000				Ugovor u pripremi
			Revizija	5.000				
14.	M6	Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R 420) Glavni projekat trase, L=cca 2,7 km	Projektiranje	50.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8753/16, 30.09.2016.	44.870	15.034	U toku
			Revizija	5.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-10201/16, 15.11.2016.	4.973	-	
			Ukupno				**15.034**	
15.	M4.2	Obilaznica Cazina Glavni projekat objekata (mostovi 2) Misija G21 Ažuriranje –Izmjena glavnog projekta trase Studija uticaja na okoliš	Elaborat eksproprijacije	35.000				Poništen tender Postupak javne nabavke usluga projektiranja u toku
			Konsult.usluge	6.000	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.1-6002/16, 11.07.2016.	6.189	6.189	
			Projektiranje	250.000				
			Revizija	20.000				
			Ostalo				3.330	
			Ukupno				**9.519**	
16.	N	Obilaznica Kiseljaka, L=cca 2km Idejni projekt, studija izvodljivosti i studija uticaja na okoliš	Projektiranje	45.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8753/16, 30.09.2016.	31.239	14.292	U toku projektovanje
			Revizija	-				
			Ukupno				**14.292**	
17.	N	Glavni projekt Zapadne obilaznice Ljubuškog, L=1,7km	Projektovanje	35.000			-	Postupak javne nabavke u toku
18.	N	Obilaznica Goražda (Glavni projekti sanacije klizišta na trasi obilaznice) -glavni projekti -Studija utjecaja na okoliš	Projektovanje	60.000			-	Postupak javne nabavke u toku
			Revizija	3.000			-	
19.	N	Obilaznica Bihaća-Studija utjecaja na okoliš	Konsult.usluge	30.000			-	Postupak javne nabavke u toku

20.	N	Obilaznica Donji Vakuf-Studija utjecaja na okoliš	Konsult.usluge	20.000			-	Postupak javne nabavke u toku
	VIII	SANACIJA ŠTETA NAKON POPLAVA						
21.	M18	Dionica Priboj 2-Simin Han 1, Poddionica Banj Brdo - Simin Han	Elaborat eksproprijacije	10.000			-	
22.		EKSPROPRIJACIJA*		800.000			**602.018**	
23.		Pribavljanje suglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz programa modernizacije; Prevod dokumentacije na engleski jezik	Ostalo Konsult.usluge	50.000				
		-Prevod Most IV Bosna 1.053KM, most Bregava (1053KM), tunel Vranduk (1053KM) tunel Ormanica (1053KM)most Vrbas(1053KM)			Divel d.o.o.Sarajevo 01-02.1-4371/16, 25.05.2016.	5.265	5.265	Okončano
		-Priprema predmjera za nastavak radova na Izgradnji Južne obilaznice Mostara, dionica Međine-Miljkovići, prevodjenje dokumentacije			Integra d.o.o.Mostar 01-02.1-5538/16, 24.06.2016.	5.733	5.733	Okončano
	M5	Glavni projekat sanacije mosta preko Duboke doline na M5, dionica: Donji Vakuf 1-Turbe.lokacija Komar			Trasa d.o.o. Sarajevo,01-02.1-3650-5/16,GK	468	468	Okončano
	M18	Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Ljubine na M18 dionica:Olovo-Semizovac			Trasa d.o.o. Sarajevo,01-02.1-3650-5/16,GK	468	468	Okončano
	M20	Uskladivanja premjera radova sa Smjernicama i prevođenje na engleski –Glavni projekt sanacije mosta M20 _009_568 preko rijeke Drine u Goraždu na M20, obilaznica Goražde			Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10432/16, 23.11.2016.	1.053	-	U toku
		Projekt Potpaklenik-Kladanj			Vještač.saglasnost		7.852 1.680	
			Ukupno				**21.466**	
24.		Izrada Studija izvodljivsti i Studija uticaja na okoliš za nove projekte iz Programa „Modernizacija cesta u FBiH“, po Zaključku Vlade F BiH	Konsult.usluge	70.000				Nije donesen zaključak
25.	M5	Devijacija puta Avnoja-ažuriranje (izmjene glavnog projekta) rekonstrukcije ceste M5, dionica:Bihać-Ripač	Projektovanje	7.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-7040/16, 11.08.2016.	6.845	**6.845**	Okončano
		U K U P N O		**2.202.000**			**809.663**	

Rb.22 Obuhvaćena je eksproprijacija na slijedećim projektima:

Red. br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Realizovano 01.01.-31.12.2016.	Napomena
1.	M17.3	Neum –Stolac, dionica: Broćanac –Drenovac	543.818	U toku
2.	N	Južna Obilaznica Mostara, servisna saobraćajn. na dionici: Međine-Miljkovići i dionica Miljkovići-Rodoč-veza na M17	4.391	
3.	N	Obilaznica Bihaća, dionica:Izačić-Kamenica		
4.	N	Obilaznica Bugojna		
5.	N	Obilaznica Cazina		
6.	N	Južna obilaznica Gruda (Ifaza)		
7.	M14.1	Izgradnja magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa, Srbljansko – Grmuški plato, L= 25 km	45.809	
8.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M5 i R403 u Kamenici		
9.		Bihać Devijacija pored Robota i Doma Zdravlja Bihać		
10.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200		
11.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 “Husino” dionica (006), km 2+500		
12.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica-Šićki Brod, km 23+500		
13.	M6.1	Rekonstrukcija ceste M6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič		
14.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950		

Nastavak tabele:

15.	M17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700		
16.	M5	Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000		
17.	M4.2	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M4.2 i R400 na M4.2, dionice Skokovi – Srbljani (Todorovo)		
18.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M18 "Olovske Luke" dionica (008), km 20+600		
19.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Čehaje		
20.	M20	Rekonstrukcija raskrsnice Vitkovići u krožni tok		
21.	M17	Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600 i km 3+880		
22.	M18	Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200		
23.	M18	Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050 do km 21+300		
24.	M5	Rekonstrukcija ceste dionica: Kaonik-Gromljak, potez „Delfine krivine"		
25.	M15	Kamičak – Ključ, km 17+000		
26.	M4	Petlja Šićki		
27.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice za Kravice, dionica: 002; km 12+400		U toku
28.	M 6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar-Široki brijeg, kroz naseljeno mjesto Međine		U toku
29.	M4.2	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M4.2, Ul. Žrtava domovinskog rata i 25. Novembra, u Cazinu dionica (002), km 11+230		
30.	M15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok		Pokrenut upravni postupak
31.	M6	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, M6, dionica:004, km 3+950 – km 4+600		
32.	M4.2	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M4.2 i R400 na M4.2, dionica 002: Skokovi – Srbljani (Todorovo)		
33.	M 4.2	Sanacija klizišta, cesta M4.2_002, dionica002: Skokovi-Srbljani, km 13+350		
34.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo		
35.	M14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002		
36.	M15	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i R405 dionica 003		
37.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M5 i M16.4 u kružni tok, M5, dionica 012, km 0+000 (Nević Polje)		
38.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M17, dionica:008, km 7+350		
39.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M18_007, km 0+000		
40.	M5	Rekonstrukcija raskrsnica u kružne tokove na obilaznici Viteza – Krčevine		
41.	M18	Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dionica Ustikolina – Trnovo, km 37+257		
42.		Obilaznica Velika Kladuša	3.000	
43.		Izgradnja podhodnika Zenički put Žepče km 6+700	5.000	
		UKUPNO	**602.018**	

3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M 16 006	Pješački semafor u Jajcu na M16 – "Zastinje"	Projektovanje	3.500	TZI Inžinjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-3196/16, 11.04.2016.	3.510	3.510	Okončano projektovanje
			Izvođenje	24.000			-	
			Ukupno				**3.510**	
2.	M 1.8 001	Sanacija semafora u Orašju na M1.8	Izvođenje	6.000				
3.	M 5 011	Projekat koordinacije 5 semaforiziranih raskrsnica na M 5 u Travniku (zeleni val)	Projektovanje	6.000			-	U rashodima
			Izvođenje	60.000			-	

Nastavak tabele:

4.	M 4.2	Sanacija semafora u Cazinu	Izvođenje	6.000				Nije ugovoreno
		UKUPNO		**105.500**			**3.510**	

3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M14	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica: Bihać-Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovica sa rekonstrukcijom/ dogradnjom mosta preko rijeke Une, km7+830	Izvođenje	784.000			-	Obustavljeno izdavanje građevinske dozvole. Tender proveden. Potrebno poništenje postupka tendera za izvođenje.
			Nadzor	31.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	30.946	-	
		-Izrada studije na uticaj izgradnje mosta i raskrsnice na režim tečenja rijeke Une	Konsult. usluge	3.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2323/16, 07.03.2016.	2.925	2.925	Okončano
		-Dopuna projektne dokumentacije odvodnje rekonstruisanog i novog mosta preko rijeke Une, lokalitet Brekovica	Projektovanje	3.000			-	
			Ostalo				549	
			Ukupno				**3.474**	
2.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo	Projektovanje	40.000*			-	Sufinansiranje sa Općinom Centar
3.	M17 006	Ozimica – Nemila 0, izgradnja podhodnika Zenički put	Izvođenje	250.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-10178/16, 15.11.2016.	235.968	123.051	U toku
			Nadzor	15.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.625	7.313	
			Ostalo				247	
			Ukupno				**130.611**	
4.	M17	Izgradnja pješačke staze u naselju Donja Jablanica	Izvođenje	128.000	JV: Babić d.o.o.Jablanica i Bosman d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5305/16, 15.06.2016.	128.008	128.005	Okončano
			Nadzor	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.2-4205/16, 23.05.2016.	6.903	6.903	
			Ukupno				**134.908**	
5.	M14 002	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor)	Izvođenje	334.000	BC-Gradnja d.o.o. Bosanska Krupa, 01-02.2-8351/16, 19.09.2016.	333.218	333.218	Okončano
					BC-Gradnja d.o.o. Bosanska Krupa, 01-02.2-11559/16, 29.12.2016.	46.942	46.712	
			Nadzor	16.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Instit. d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.029	16.029	

Nastavak tabele:

			Ostalo			602	602	
			Ukupno				**396.561**	
6.	M1.8 004	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok M1.8 i ulice Tuzlanskog odreda u Srebreniku, M1.8_004, km 1+450	Projektovanje	4.600				
			Revizija					
			Ukupno				-	
7.	M15 003	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i R405	Izvođenje	300.000			-	Nabavka za izvođenje okončana, ugovor u pripremi, nadzor ugovoren
			Nadzor	14.300	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.274	-	
			Ukupno				-	
8.	M18 008	Vitalj – Olovo, izgradnja raskrsnice na spoju magistralne ceste M18 sa regionalnom cestom R487	Izvođenje	138.500	Izgradnja d.o.o. Teočak, 01-02.2-6108/16, 13.07.2016.	138.497	138.488	Okončano
			Nadzor	6.800	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4983/16, 08.06.2016.	6.774	6.774	
			Kontrola kval		DTQ d.o.o. Sarajevo,	786	786	
			Ukupno				**146.048**	
9.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice M6 i R425a u naselju Trebižat (spoj na AC) općina Čapljina	Projektovanje	7.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5534/16, 24.06.2016.	6.991	6.991	U toku
			Revizija		Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.2-9573/16, 26.10.2016.	2.457	2.457	
			Izvođenje	375.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-9966/16, 08.11.2016.	401.429	71.211	
			Nadzor	10.000	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-9989/16, 08.11.2016.	5.031	892	
			ostalo		Vještačenje, taksa	1.334	1.334	
			Ukupno				**82.885**	
10.	M5 012	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M5 i M16.4 u kružni tok, M5, 012, km 0+000 (Nević Polje)	Eksproprijacija	-			-	
11.	M18 010	Rekonstrukcija raskrsnica na cesti M18 u kružne tokove, (prolaz kroz Vogošću)	Projektovanje	37.500	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	37.206	**37.206**	Okončano
12.	M17 008	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M17, 008, km 7+350	Projektovanje	13.000	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	12.724	**7.634**	Okončano
13.	M6 004	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, M6, 004, km 3+950 – km 4+600 I faza	Izvođenje	150.000	GPI d.o.o. Konjic, 01-02.2-11364/16, 21.12.2016.	148.913	-	U toku
			Nadzor	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar 01-02.2-10482/16, 24.11.2016	6.921	-	
			Ukupno				-	
14.	M18 007	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M18_007, km 0+000	Izvođenje	260.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-8894/16, 04.10.2016.	212.889	-	U toku
			Nadzor	15.500	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	15.327	-	

Nastavak tabele:

			Ukupno				-	
15.	M4 009	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M4 u Gračanici, M4_009, km 17+900	Izvođenje	194.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-5065/16, 10.06.2016	193.559	193.474	Okončano
			Nadzor	7.000	Aik-Inžinjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-5064/16, 10.06.2016	6.903	6.903	
			Ukupno				**200.377**	
16.	M14.1	Izgradnja pješačke staze u Gradačcu (II faza)	Izvođenje	41.600	Balegem d.o.o. Gradačac,01-02.2-6236/16,18.07.2016	41.554	41.260	Okončano
			Nadzor	7.000	AIK Inžinjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-4984/16, 08.06.2016.	6.786	6.786	
			Ukupno				**48.046**	
17.	M17	Izgradnja pješačke staze ulaz u Mostar (Vrapčići – Zalik)	Projektovanje	10.300	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	10.267	10.267	Projektovanje okončano, U toku priprema ugovora za potpis
			Izvođenje	240.000			-	
			Nadzor	15.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.625	-	
			Ukupno				**10.267**	
18.	M5	Rekonstrukcija raskrsnica u kružne tokove na obilaznici Viteza – Krčevine	Projektovanje	7.600	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-4906/16, 07.06.2016.	7.598	7.598	Projektovanje okončano. Nabavka radova u toku
			Revizija	-	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9544/16, 26.09.2016.	2.574	2.574	
			Izvođenje	160.000			-	
			Nadzor	10.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.625	-	
			Ukupno				**10.172**	
19.	M5	Izgradnja pješačke staze u mjestu Han Ploča L = 600 m (Ifaza)	Izvođenje	100.000	Ceste-Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-10330/16, 18.11.2016.	91.679	41.820	U toku
			Nadzor	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9756/16, 02.11.2016.	5.909	2.908	
			Ukupno				**44.728**	
20.	M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6.1 i R852 u naselju Trn, općina Široki Brijeg	Projektovanje	14.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.2-5937/16, 08.07.2016.	13.806	**13.806**	Okončano
21.	M17.4	Izgradnja pješačke staze u gradu Ljubuški	Izvođenje	179.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-5188/16, 14.06.2016.	178.737	178.474	Okončano
			Nadzor	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.2-4675/16, 01.06.2016.	6.985	6.985	
			Ukupno				**185.459**	
22.	M14.1	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak	Projektovanje	12.500	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	12.285	12.285	U toku

Nastavak tabele:

			Izvođenje	240.000	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-10404/16, 22.11.2016.	239.547	-	
			Nadzor	17.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.731	-	
			Ostalo		takse		105	
			Ukupno				**12.390**	
23.	M5	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Polje, općina Busovača	Projektovanje	6.900	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.2-5224/16, 14.06.2016.	6.845	6.845	Okončano
			Izvođenje	150.000	Ceste-Company d.o.o.Kiseljak, 01-02.2-7473/16, 25.08.2016. i	112.231	133.144	
					01-02.2-10331/16, 18.11.2016.	21.100		
			Nadzor	7.000	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6863/16, 05.08.2016.	6.903	6.903	
			Ukupno				**146.892**	
24.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok u Jelahu	Projektovanje	13.000	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	12.724	**8.270**	U toku
25.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Ružići, općina Grude	Projektovanje	8.000	Ipsa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4929/16, 07.06.2016.	8.073	8.073	U toku
			Izvođenje	240.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-8441/16, 20.09.2016.	258.569	64.535	
			Nadzor	12.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.2-8967/16, 06.10.2016.	5.792	1.446	
			Ukupno				**74.054**	
26.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica	Projektovanje	18.300	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	18.318	10.991	U toku prikupljanje odobrenja za građenje, eksproprijacija u toku
			Izvođenje	240.000			-	
			Nadzor	16.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.029	-	
			Ukupno				**10.991**	
27.	M4 012	Izgradnja pješačke staze, dionica 012 Simin Han 1 – Donje Caparde od km 9+495 do km 10+635 u mjestu Rainci u dužini 1.1km	Izvođenje	200.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.1-11437/16, 23.12.2016.	198.777	-	U toku
			Nadzor	7.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.-11319/16, 20.12.2016.	6.500	-	
			Ukupno				-	
28.	M4	Završetak izgradnje pješačke staze od Halisijska ulica- raskrsnica za Sapnu, I faza, dionica 012 Simin Han 1 – Donje Caparde od km 19+465 do km 19+715 u mjestu Rainci u dužini 0.25km	Izvođenje	40.000	Izgradnja d.o.o.Teočak, 01-02.1-5219/16, 14.06.2016.	38.436	**38.434**	Okončano
29.	M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica: Kolo-Posušje,	Izvođenje	360.000	KTM-Brina d.o.o. Posušje, 01-02.1-8189/16, 13.09.2016.	372.073	219.910	U toku

Nastavak tabele:

			Nadzor	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-8020/16, 07.09.2016.	6.786	4.010	
			Ostalo		Takse, saglasnosti		5.038	
			Ukupno				**228.958**	
30.	M14.1	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M14.1 i saobraćajnice za Industrijsku zonu u općini Gradačac	Izvođenje	380.000**	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-8906/16, 05.10.2016	283.560	183.601	U toku
			Nadzor	20.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka,01-02.2-5967/16,11.07.2016	16.029	13.543	
			Ukupno				**197.144**	
31.	M5	Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000	Izvođenje	153.000	Behić Sanny Boy d.o.o. Bihać, 01-02.2-6559/16, 27.07.2016. i	153.091	170.926	Okončano
					01-02.2-10286/16, 18.11.2016.	17.850		
			Nadzor	7.000	Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 01-6488/16, 25.07.2016.	6.997	6.997	
			Ukupno				**177.923**	
32.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice na M17 i saobraćajnice za Industrijsku zonu u općini Maglaj	Izvođenje	600.000	Dobojputevi d.d. Doboj Jug, 01-02.2-7470/16, 24.08.2016.	171.615	171.614	Radovi I faze okončani, nadzor nije situirao Ugovor za II faza u pripremi
			Nadzor	16.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.029	8.014	
			Ukupno				**179.628**	
33.	M18	Izgradnja pješačke staze uz M18 dionica010:Vogošća Kobilja Glava-Sarajevo, Donji Hotonj_Gornji Hotonj, L=1km	Izvođenje	280.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	
34.	M6.1	Izgradnja pješačke staze u naselju Klobuk, općina Široki Brijeg	Izvođenje	179.000			-	Nabavka za izvođenje u toku
			Nadzor	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.4-11189/16, 6.12.2016.	6.903	-	
			Ukupno				-	
35.	M1.8	Revizija glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na cesti M1.8, (003) u naselju Ćehaje	Revizija	1.500	Desing&QC d.o.o. Sarajevo.01-02.2-259/16,07.01.2016.	1.500	**1.500**	Okončano
36.	M1.8	Revizija projektne dokumentacije rekonstrukcije raskrsnica cesta M1.8 i lokalnih cesta sa lijeve i desne strane km 21+150, (004), Srebrenik-Šićki brod, lokacija Špionica	Revizija	2.400	Pronasa d.o.o. Sarajevo. 01-02.2-2740/16,22.03.2016	2.340	**2.340**	Okončano
		U K U P N O		**7.197.300**			**2.530.706**	

Napomena*- Na osnovu „Sporazuma o zajedničkoj implementaciji izrade projektne dokumentacije“ broj:01-02.2-6343/16, od 19.07.2016. Općina Centar Sarajevo, učestvovala u finansiranju sa 40.000 KM, izradu glavnog projekta spomenute raskrsnice.

** - Sufinansiranje sa Općinom Gradačac 100.000 KM za izvođenje

3.2.4. Vanredno održavanje

3.2.4.1.Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016.	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M4	Sanacija mosta (M04-012) preko rijeke Dubnice, dionica Simin Han- Donje Caparde, km 15+091	Izvođenje	160.000	AIK Inžinjering, d.o.o. Banovići, 01-02.1-5536/16, 24.06.2016.	159.425	156.657	Okončano
			Nadzor	7.000	Trasa d.o.o Sarajevo, 01-02.1-5187/16, 14.06.2016.	6.903	6.903	
			Ukupno				**163.560**	
2.	M4	Sanacija korita u zoni mosta preko Rašljevske rijeke (M4-010-113 u Donjoj_Orahovici	Izvođenje	80.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.1-6371/16, 20.07.2016	76.999	76.843	Okončano
			Nadzor	5.000	Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6043/16, 12.07.2016.	4.891	4.891	
			Ukupno				**81.734**	
3.	M16.2	Sanacija mosta (M16.2-001-280) preko rijeke Bunte, lokacija Gračanica, Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152	Projektiranje	20.200	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	20.241	8.843	U toku
			Revizija	2.500	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11317/16, 20.12.2016.	2.300	-	
			Ukupno				**8.843**	
4.	M18	Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dionica Ustikolina – Trnovo, km 37+257	Izvođenje	350.000	HP Investing, d.o.o. Mostar, 01-02.1-11541/16, 29.12.2016.	361.373	-	Obnovljeni postupak javne nabave usluga nadzora u toku
			Nadzor	15.000			-	
			Ukupno				-	
5.	M5	Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746	Projektovanje	18.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	17.433	7.556	U toku
			Revizija	2.000				
			Ukupno				**7.556**	
6.	M19.2	Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko potok Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj – Vlasenica, km 9+809	Projektovanje	22.800	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	22.815	9.779	U toku
			Revizija	3.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11320/16, 20.12.2016.	2.937	-	
			Ukupno				**9.779**	
7.	M18	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko suhe prepreke u Stanovima (M18-007-86), dionica Živinice 1 – Vitalj, km 25+886	Projektovanje	24.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	23.634	12.120	U toku
			Revizija	3.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11320/16, 20.12.2016.	2.936	-	
			Ukupno				**12.120**	
8.	M18.1	Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M18.1-001-446), dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 42+720	Projektovanje	23.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	23.049	9.779	U toku
			Revizija	3.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11317/16, 20.12.2016.	2.900	-	
			Ukupno				**9.779**	

Nastavak tabele:

9.	M18	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo-Malta, km 0+048	Projektovanje	24.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	23.751	11.281	U toku
			Revizija	3.000	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-11318/16, 20.12.2016.	2.925	-	
			Ukupno				**11.281**	
10.	M18	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165), dionica Vitalj – Olovo, km 20+443	Projektovanje	28.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16, 14.09.2016.	27.729	11.819	U toku
			Revizija	3.500	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-11318/16, 20.12.2016.	3.393	-	
			Ukupno				**11.819**	
11.	ZAMJENA DILATACIJA							
	M1.8	Most preko rijeke Mala Tinja (M1.8-003-89), lokacija Ormanica, dionica Pelagićevo – Srebrenik, km 16+114	Izvođenje	92.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7074/16, 11.08.2016.	91.693	97.120	Okončano
			Nadzor	2.500	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7075/16, 11.08.2016.	819	737	
			Ukupno				**97.857**	
	M17	Most preko rijeke Save u Bosanskom Šamcu (M17-001-574), km 0+000	Izvođenje	48.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7074/16, 11.08.2016.	47.135	51.602	Okončano
			Nadzor	2.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7075/16, 11.08.2016.	1.404	1.264	
			Ukupno				**52.866**	
	M18	Nadvožnjak preko željezničke pruge (M18-006-123), dionica Šički Brod 3-Živinice 1	Izvođenje	91.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7074/16, 11.08.2016.	90.872	68.969	Okončano
			Nadzor	1.500	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7075/16, 11.08.2016.	1.404	1.714	
			Ukupno				**70.683**	
	M20	Most preko rijeke Drine (M20.0-3-08-a) na obilaznici Goražde	Izvođenje	70.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7074/16, 11.08.2016.	69.888	67.922	Okončano
			Nadzor	2.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7075/16, 11.08.2016.	873	786	
			Ukupno				**68.708**	
12.	M5	Revizija glavnog projekta za sanaciju mosta preko rijeke Plive u Jajcu dionica 002: Bos.Petrovac-Jajce, km 93+772	Revizija		Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6787/16, 03.08.2016.	3.276	**3.276**	Okončano
		UKUPNO		**1.106.000**			**609.861**	

3.2.4.2.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red. br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M17 017	Buna – Tasovčići, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza ukupne dužine cca 3,0 km	Izvođenje	392.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-5712/16, 30.06.2016.	391.890	366.723	Okončano

Nastavak tabele:

			Nadzor	8.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo. Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	7.868	7.868	
			Ukupno				**374.591**	
2.	M4.2 002	Skokovi – Srbljani, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza ukupne dužine cca 3,0 km	Izvođenje	330.000	Kov-grad d.o.o.Bužim, 01-02.2-5541/16, 24.06.2016.	328.267	328.251	Okončano
			Nadzor	9.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	8.921	8.921	
			Ukupno				**337.172**	
3.	M17.3 001	Buna – Masline, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza ukupne dužine cca 3,0 km	Izvođenje.	597.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-6784/06, 03.08.2016.	596.390	596.388	Okončano
			Nadzor	8.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	7.868	7.868	
			Ukupno				**604.256**	
4.	M5 007	Ključ – Rogolji, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza ukupne dužine cca 1,5 km	Izvođenje	434.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-6785/16, 03.08.2016. 01-02.2-10285/16, 18.11.2016.	433.839 36.379	470.157	Okončano
			Nadzor	8.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka,01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	7.868	7.868	
			Ukupno				**478.025**	
5.	M18 008	Vitalj – Olovo, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza L=1,1 km i III faza izgradnje pješačke staze L=1.100m	Izvođenje	190.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-8893/16, 04.10.2016.	188.439	188.425	Okončano
			Nadzor	11.500	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka,01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	11.466	11.466	
			Ukupno				**199.891**	
6.	M16 006	Crna Rijeka - Jajce Jug, sanacija asfaltnog kolovoza L = 2,5 km	Projektovanje	16.000	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	15.971	15.970	Nastavak aktivnosti na projektu planiran za 2017. godinu
			Izvođenje	-			-	
			Nadzor	8.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	7.868	-	
			Ukupno				**15.970**	

Nastavak tabele:

7.	M16 011	Livno 3 – Renjići, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza ukupne dužine 2,0 km	Projektovanje	12.200	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	12.175	12.175	Okončano
			Izvođenje	230.000	Livnoputovi d.o.o. Livno, 01-02.2-9961/16, 08.11.2016	220.734	220.606	
			Nadzor	9.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka,01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	8.921	8.921	
			Ukupno				**241.702**	
8.	M19.2	Sanacija asfaltnog kolovoza dionica: Vitalj - Vlasenica cca L= 6,00km	Projektovanje	32.000	GP: Ipsa Institut d.o.o i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5479/16, 22.06.2016	31.897	**31.897**	Okončano
		UKUPNO		**2.294.700**			**2.283.504**	

3.2.4.3 Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2016.	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.	Napomena
1.	M16 006	Sanacija klizišta, cesta M16 - 006 dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 20+950	Izvođenje	90.000	Komotin d.o.o. Jajce, 01-02.2-5112/16, 13.06.2016.	87.251	87.248	Okončano
			Nadzor	9.000	Konzorcij:Trasa d.o.o. IGH d.o.o.Mostar Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5535/16, 24.06.2016.	8.822	8.822	
			Ukupno				**96.070**	
2.	M16 009	Sanacija trupa ceste(nasipa) i škarpe zasjeka, cesta M16-009, dionica: Poriče-Kupres, km 11+950 do km 12+350 km, l=400m	Izvođenje	340.000			-	Nabavka radova okončana
			Nadzor	11.000	Konzorcij:Trasa d.o.o. IGH d.o.o.Mostar Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5535/16, 24.06.2016.	10.989	-	
			Ukupno				-	
3.	M16.2 003	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M-16.2, dionica: Prozor - Jablanica, km 20+700	Izvođenje	225.000	TB Inženjering d.o.o. Breza, 01-02.2-6851/16, 04.08.2016.	225.351	221.661	Okončano
			Nadzor	11.000	Konzorcij:Trasa d.o.o. IGH d.o.o.Mostar Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5535/16, 24.06.2016.	10.913	10.913	
			Ukupno				**232.574**	
4.	M16.4 001	Sanacja slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno-Nević polje, km 21+800	Izvođenje	105.000	Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić Grad, 01-02.2-6021/16, 11.07.2016.	101.740	101.728	Okončano
			Nadzor	8.500	Konzorcij:Trasa d.o.o. IGH d.o.o.Mostar Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5535/16, 24.06.2016.	8.518	8.518	

Nastavak tabele:

			Ukupno				**110.246**	
5.	M17 013	Sanacija slijeganja trupa ceste i škarpe ispod nivelete cesta M17, dionica: Jablanica - Potoci, km 2+100 do km 2+400	Izvođenje	435.000	Geosonda d.o.o. Zenica, 01-02.2-11549/16, 29.12.2016.	433.024	-	U toku
			Nadzor	13.000	Konzorcij:Trasa d.o.o. IGH d.o.o.Mostar Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5535/16, 24.06.2016.	13.005	-	
			Ukupno				-	
6.	M17 013	Sanacija škarpe dionica: Jablanica - Potoci, km 7200-km7+750, Komadinovo Vrelo	Izvođenje	-			-	Rebalansom nije planirano izvođenje
			Nadzor	15.000	Konzorcij:Trasa d.o.o. IGH d.o.o.Mostar Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5535/16, 24.06.2016.	15.362	-	
			Ukupno				-	
7.	M5 016	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Azize Šaćirbegović Korija_Ljubogošta, km 2+700 (gradska obilaznica)	Projektovanje	7.000	Desing&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-4508/16, 27.05.2016.	7.020	7.020	Okončano
			Izvođenje	140.000*	Grakop d.o.o.Kiseljak, 01-02.2-4987/16, 08.06.2016.	136.997	136.879	
			Ukupno				**143.899**	
		UKUPNO		**1.409.500**			**582.789**	

Napomena* - JP Ceste F BiH su potpisale Sporazum o zajedničkoj implementaciji sanacije slijeganja trupa ceste sa „Ahmetspahić petrolom" d.o.o. Sarajevo, broj 01-02.2-2003/16, 09.06.2016. gdje su za navedeni projekat obezbjedili sredstva u iznosu od 30.000 KM.

4. Projekti iz Programa utroška investicijskih sredstava razvoja – Budžet Federacije BiH 2007.godina

Vlada F BiH je donijela Odluku o izmjeni odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom F BiH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija V broj:1738/15, kojom su sa projekta „Izgradnja magistralne ceste M4 Doboj - Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica Kreka) - petlja Šićki Brod, umanjena sredstva za 1,85 mil.KM i prebačena na projekt: „Rekonstrukcija regionalne ceste Posušje-Jablanica". Od odobrenih sredstava ukupno je realizovano 1,72 mil.KM i to u 2016.godini 0,16 mil.KM.

Red. Br.	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Odobreno Programom	Rebalans Plana 2016.	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.
1.	Rekonstrukcija ceste Posušje - Jablanica	Rekonstrukcija	1.850.000	290.000	158.007
	UKUPNO		**1.850.000**	**290.000**	**158.007**

5.Sredstva po Odluci Vlade F BiH – GSM licenca

Odlukama i Zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine usvojeni su Programi sa projektima koji se investiraju sredstvima izdavanjem GSM licence za F BiH.

- **Program GSM licence - 2011.godina**

Obezbjeđena sredstva iz Programa utroška sredstava GSM licence za 2011.godinu, za čiju implementaciju je zaduženo JP Ceste F BiH su realizovana u cijelosti.

Red. Br.	Naziv i opis projekta	Obezbjeđeno programom	Rebalans Plana 2016.	Aktivnosti na projektu	Izvođač/ Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2016.
1.	Izgradnja novoprojektovane dionice: Potpaklenik-Kladanj (tunel Karaula) 2mosta M11-M12, trase 1km i tunel (5,94mil.KM-2 mosta, 2,5mil.KM trasa 15 mil.KM tunel)	10.000.000	1.030.000	Izvođenje	Strabag AG Austrija, 01-02.3-4109/14, 14.04.2014.	24.257.083	880.603
				Nadzor	JV: Rougthon internacional Ltd & Ipsa institut Sarajevo i Geotehnički studio, 01-02.3-4110/14, 14.04.2014.	914.718	23.996
				Konsult usl	Institut GIT Tuzla, 01-02.1-9689/15, 07.11.2014.	39.546 (preneseno 749)	749
				Ukupno			**905.348**
2.	Rješavanje eksproprijacije i izrada projektne dokumentacije vezano za realizaciju projekta izgradnja magistralne ceste Neum –Stolac	1.700.000	95.200	Projektovanje	Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7315, 01.09.2014.	149.503 (preneseno 66.696)	66.695
					Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-4954, 03.06.2013.	170.270 (preneseno 28.434)	28.434
				Ukupno			**95.129**
	U K U P N O		**1.125.200**				**1.000.477**

Realizacija navedenih projekata je u toku, a nastavak izgradnje očekuje se kroz Program „Modernizacija cesta u F BiH“.

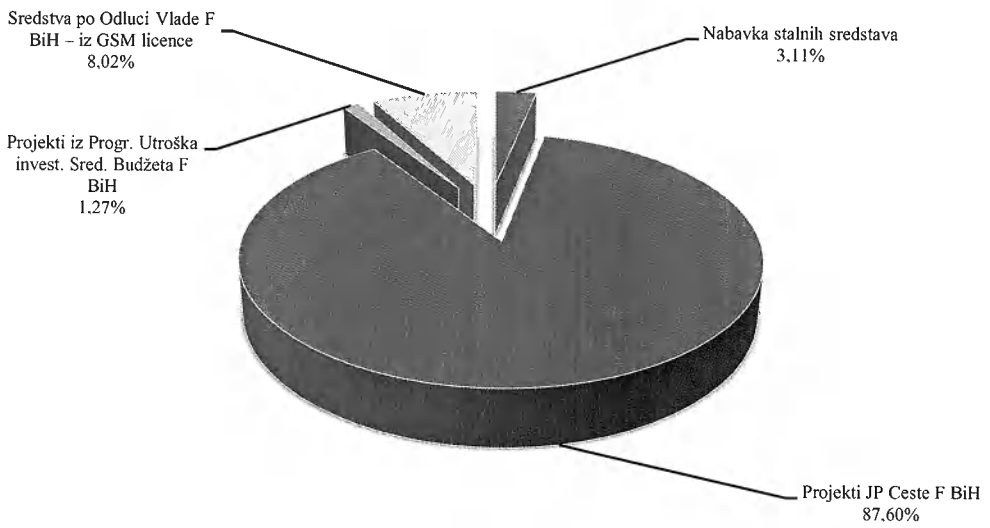

Grafički prikaz strukture realizovanih investicija u 2016. godini.

D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE

Izvještaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka i obuhvata :
Pregled provedenih postupaka javnih nabavki JP Ceste F BiH u promatranom periodu.
Za navedeni period na osnovu provedenih postupaka nabavki ugovorena su 253 ugovora u iznosu od 49,54 mil.KM.

- **Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti**

Vrsta postupka nabavke	Iznosi u KM (sa PDV-om)	Broj ugovora
Ukupno	**49.544.473**	**253**
Otvoreni	16.521.081	68
Ograničeni	30.727.843	15
Konkurentski	370.026	28
Pregovarački	1.366.269	20
Direktni sporazumi	549.984	121
Neprioritetne usluge	9.270	1

Za sedam (7) postupaka nabavki procjena ponuda je u toku.
Za šesnaest (16) postupaka nabavki, donesene odluke o dodjeli ugovora i čeka se ugovaranje.
Pet (5) postupaka nabavke je pokrenuto i čekaju se ponude.

- **Žalbe**

U navedenom periodu podneseno je 19 žalbi, od kojih je rješeno 18 žalbi i postupci nastavljeni/ponovljeni. Jedna žalba je na rješavanju u Uredu za žalbe.

E.PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Aktivnosti pravnog sektora u periodu 01.01.- 31.12.2016. godina mogu se podijeliti na slijedeće oblasti:
- pravne, normativni i
- kadrovske poslove

Pravni i normativno-pravni poslovi

Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u Federaciji BiH, odnosno u državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.

U periodu 01.01.-31.12.2016.godina obavljane su tekuće aktivnosti koje se odnose na pripremu i realizaciju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine JP Ceste F BiH, Nadzornog odbora i Uprave ovog preduzeća.
U izvještajnom periodu održano je pet sjednica Skupština.
Na sjednici Skupštine od 26.1.2016.god. je razriješen privremeni Nadzorni odbor Odlukom Skupštine broj: 01-SK 915-2 /16 (koji je ranije imenovan Odlukom Skupštine broj: 01-SK 8145-3/15 od 22.9.2015.) i imenovan privremeni Nadzorni odbor u istom sastavu Odlukom Skupštine broj: 01-SK 915-3 /16 na

period do 3 mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.
Za donošenje odluke o razriješenju privremenog Nadzornog odbora, Vlada F BiH je dana 23.12.2015.god. donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V.broj: 1783/2015.
Za donošenje odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH, Vlada F BiH je dana 23.12.2015.god. donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V.broj: 1784/2015.

U izvještajnom periodu održane su tri sjednice privremenog Nadzornog odbora.
Privremeni Nadzorni odbor je dana 4.3.2016.god. a na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave društva V.broj: 266/2016 koju je Vlada F BiH donijela 2.2.2016.god. imenovao članove Uprave ovog preduzeća i to: Pravdić Ljubu za direktora JP Ceste F BiH Odlukom broj: 01-03.2 NO 2066-2/16, Isaković Bekira direktora za ekonomske i pravne poslove Odlukom broj: 01-03.2 NO 2066-3/16 i Pjanić Dedu direktora za tehničke poslove Odlukom broj: 01-03.2 NO 2066-4/16.
Navedene promjene, registrovane su u Opštinskom sudu u Sarajevu Rješenjem broj: 065-0-Reg-16-002347 od 15.6.2016.god.

Privremeni Nadzorni odbor je Odlukom broj: 01-03.2NO 8785-8/15 od 29.10.2015. poništio i raspisao ponovni Konkurs za odabir i predlaganje kandidata Odbora za reviziju JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo, koji Konkurs je objavljen u Službenim novinama F BiH i dva dnevna lista: Oslobođenje i Večernji list kao i imenovao Komisiju za odabir i predlaganje kandidata Odbora za reviziju odlukom broj: 01-03.2 NO 10075-9/15. Nakon provedene konkursne procedure i sačinjavanja konačnog Izvještaja Komisije za odabir i predlaganje kandidata odbora za reviziju, privremeni Nadzorni odbor je donio Odluku o predlaganju kandidata Odbora za reviziju broj: 01-03.2 NO 2066-5/16 od 4.3.2016. koja odluka je upućena Vladi F BiH na dalje postupanje. Vlada F BiH dana 24.6.2016. donosi Odluku o imenovanju Odbora za reviziju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V.broj: 1412/16 kojom odlukom je imenovan Odbor za reviziju JP Ceste F BiH na mandatni period od 4 godine.
Skupština je na svojoj sjednici od 1.8.2016.god. donijela Odluku o potvrđivanju odluke Vlade F BiH o imenovanju Odbora za reviziju.
U izvještajnom periodu, Odbor za reviziju je održao šest sjednica.

Privremeni Nadzorni odbor razriješen je Odlukom Skupštine JP Ceste F BiH broj: 01-SK 5484-2/16 od 8.7.2016.god. a na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V.broj: 1229/16 od 8.6.2016.god. koju je Vlada Federacije BiH donijela 8.6.2016.godine.
Skupština je na svojoj sjednici od 8.7.2016.god. a na osnovu odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti Skupštini društva za imenovanje članova Nadzornog odbora V.broj: 1230/16 od 16.6.2016.godine, imenovala Nadzorni odbor na mandatni period od 4 godine svojom Odlukom broj: 01-SK 5484-3/16 .
U izvještajnom periodu, Nadzorni odbor je održao sedam sjednica i to pet redovnih i dvije vanredne.
U izvještajnom periodu bilo je 32 sjednice Uprave.

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd.., kao i oblast parničnih, vanparničnih, prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka, a dijelom i imovinsko-pravnih poslova.
Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu. Zbog velikog broja tužbi

protiv ovog pravnog lica izražene su velike aktivnosti na pripremi pojedinih predmeta i njihova odbrana u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast.

U toku su aktivnost na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Ceste F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju rješenja o korištenju cestovnog zemljišta protiv korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl.
Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi.

U sudskim postupcima JP Ceste F BiH se pojavljuje u ulozi tužitelja, ukupan broj aktivnih tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2016. iznosi 34 predmeta (naplata za cestovno zemljište, regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme).
U toku izvještajnog perioda podneseno je šest regresnih tužbi i to jedna protiv izvođača radova, jedna iz osnova solidarnog potraživanja i četiri tužbe zbog oštećenja cestovne opreme.
Tužbe JP Ceste Federacije BiH, gdje je ona tužitelj odnose se na ranije godine, izuzev nekoliko novih za cestovnu opremu i regresne tužbe.
Dugovanja za korištenje cestovnog zemljište od 2007 godine, naplaćuju se pokretanjem prijedloga za dozvolu izvršenja u izvšnom postupku pred općinskim sudovima.

U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana, u izvještajnom periodu završen je 61 predmet, pa stanje aktivnih predmeta na dan 31.12.2016. iznosi 307 predmeta, uzimajući u obzir da je u izvještajnom periodu podneseno 67 novih tužbi, s tim što svaki dan u narednom periodu stižu nove tužbe, koje će ući u novi izvještajni period.
Izražena je neophodnost praćenja svih zakonskih promjena u organizaciji JP Ceste F BiH, a po potrebi i priprema svih akata koji su potrebni za upis u sudske registre.

Što se tiče završenih predmeta koji su postali pravosnažni i u kojima se JP Ceste F BiH pojavljuje kao tužena strana, a u kojim predmetima je usvojen tužbeni zahtjev, vidljiva su nastojanja da se takav tužbeni zahtjev smanji pa se ne može generalno reći da su ti predmeti u potpunosti izgubljeni.

Kadrovski poslovi

Na dan 31.12.2016. struktura radnika JP Ceste F BiH je sljedeća:

Red.br.	Vrsta školske spreme	Stanje 31.12.2016.
1.	Magistri nauka (građ. saob, ecc, komunikologije.)	4
2.	Magistri struke (saob. građ.ecc. arh; geografije)	7
3.	VSS građevinske struke	25
4.	VSS saobraćajne struke	3
5.	VSS ekonomske struke	6
6.	VSS pravne struke	11
7.	VSS geodetske struke	1
8.	VSS infor.struke	2
9.	VS (ing.građ..)	4
10.	VS (becheler ecc.)	3
11.	SSS građevinski tehničari	6
12.	SSS mašinske struke	1
13	SSS saobraćajne struke	2
14.	SSS ekonomske struke	5
15.	SSS ostale struke (druš.i prir.)	5
UKUPNO		**85**

U periodu od 1.1.2016. do 31.12.2016. sa 6 zaposlenika je zasnovan radni odnos od kojih jedan pripravnik, jedan radnik je primljen po ugovoru na određeno vrijeme do 30.6.2016., a četiri radnika su primljena na neodređeno vrijeme. Jedan radnik je preminuo, a sa jednim radnikom je sporazumno prekinut radni odnos.

Direktor

Ljubo Pravdić,dipl.ing.gradj.
